

現在：5工区4業者施工中


— 開通済区間
— 未開通区間（工事完成）

川内沢ダム建設事業全体平面図



【現時点の見どころ】

- ② 川内沢ダム取水放流設備工事
取水設備 施工状況
- ③ 川内沢ダム管理設備新設工事
監査廊 排水設備 施工状況

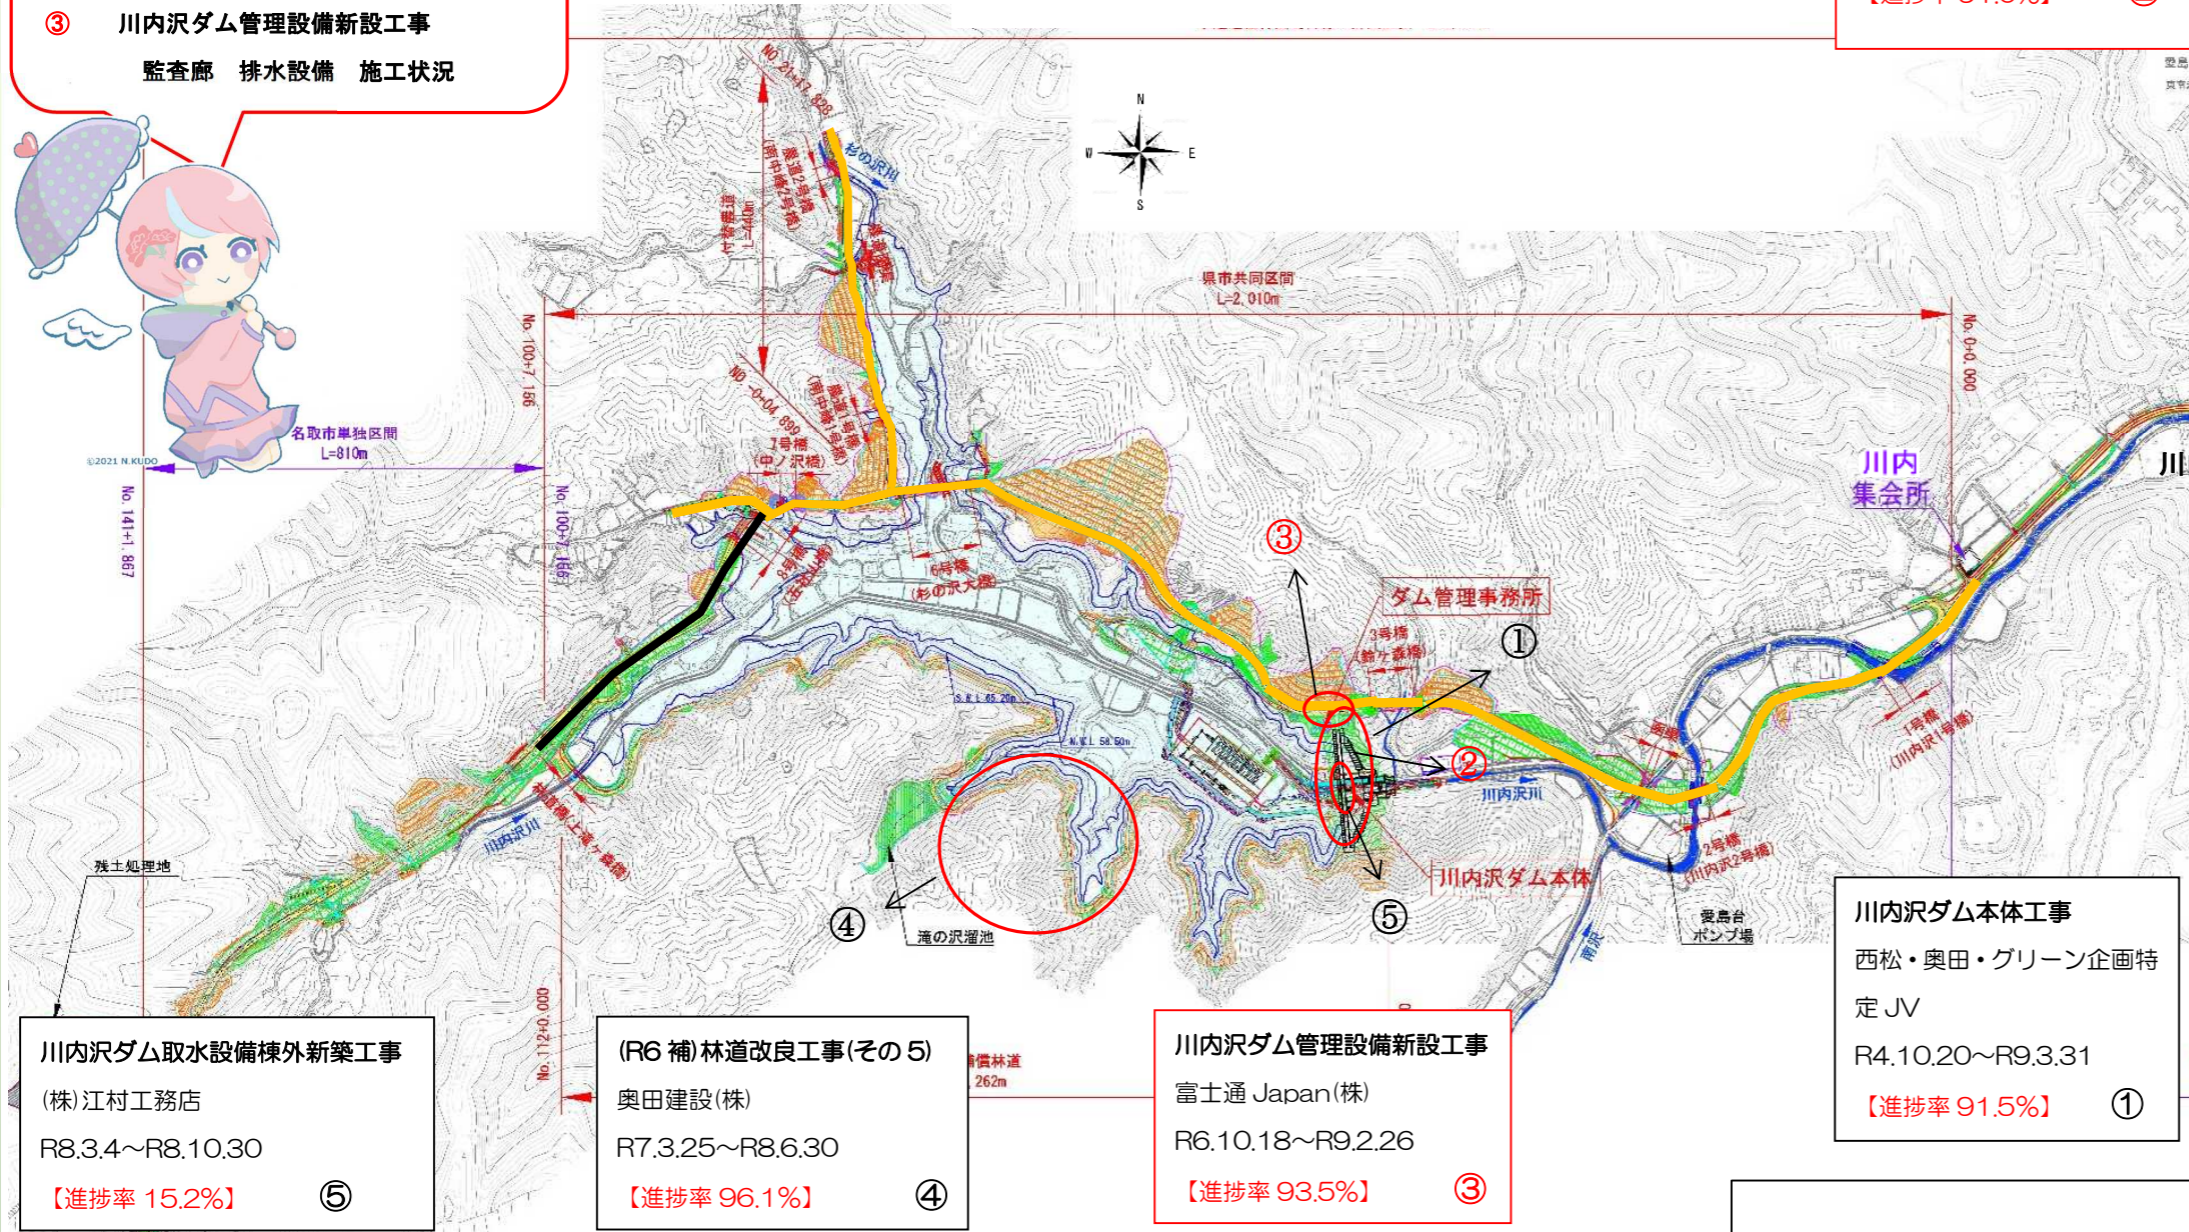

川内沢ダム取水放流設備工事
奥田建設(株)
R5.10.6~R8.10.30
【進捗率 91.0%】 ②



川内沢ダム本体工事
西松・奥田・グリーン企画特
定JV
R4.10.20~R9.3.31
【進捗率 91.5%】 ①

川内沢ダム取水設備棟外新築工事
(株)江村工務店
R8.3.4~R8.10.30
【進捗率 15.2%】 ⑤

(R6補)林道改良工事(その5)
奥田建設(株)
R7.3.25~R8.6.30
【進捗率 96.1%】 ④

川内沢ダム管理設備新設工事
富士通 Japan(株)
R6.10.18~R9.2.26
【進捗率 93.5%】 ③

