

現在：8工区施工中！
完成：1工区

川内沢ダムPR動画「見えるダム事業」公開中！



<アクセスはこちらから>

【①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工状況！】



上流より望む



左岸側より望む

【①川内沢ダム本体工事 左岸基礎掘削状況！】




川内沢川

川内沢ダム建設事業全体平面図

(R5 補)付替農道改良外工事 グリーン企画建設(株) R6.3.1~R7.3.31 【進捗率 20%】	(R5 補)付替農道1号橋上部工事 ライブティック(株) R6.2.9~R6.10.31 【進捗率 43%】	川内沢ダム取水放流設備工事 奥田建設(株) R5.10.6~R8.3.25 【進捗率 2%】	(R5)付替市道舗装工事 (株)和建設 R5.7.11~R6.6.28 【完成】
⑤	④	③	②

【現時点の見どころ】

- ①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工状況！
- ①川内沢ダム本体工事 左岸基礎掘削状況！
- ②付替市道舗装工事 完成！

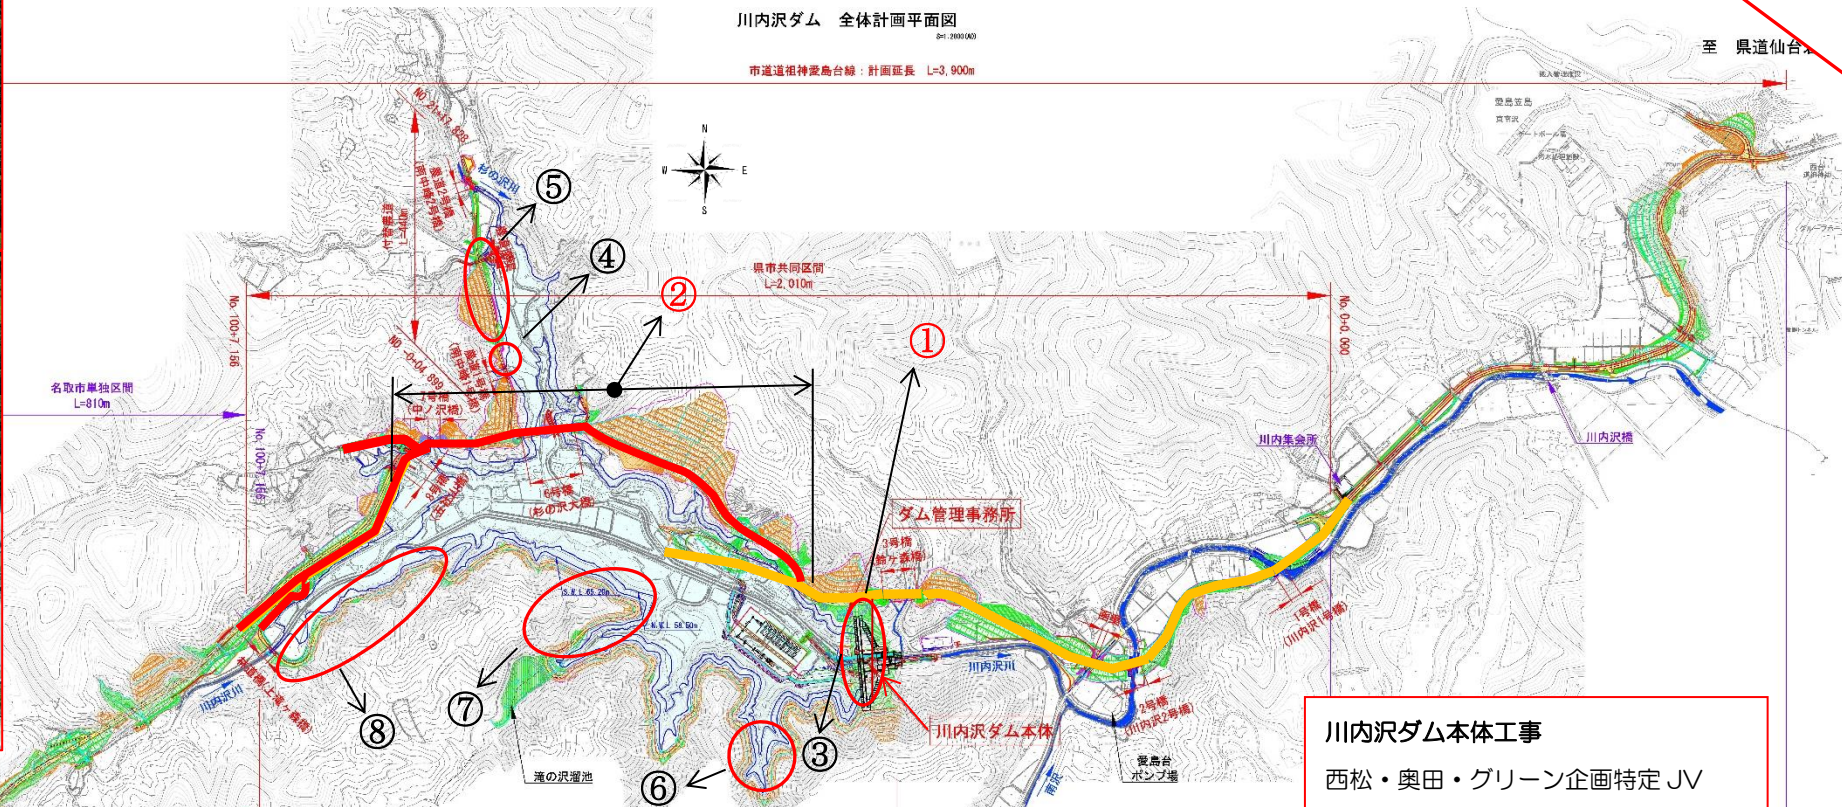

川内沢ダム本体工事
西松・奥田・グリーン企画特定JV
R4.10.20~R8.3.25
【進捗率 23%】



(R5 補)林道改良工事(その3) (株)センショウ・テック. R6.3.5~R7.3.31 【進捗率 9%】	(R5 補)林道改良工事(その2) 奥田建設(株) R6.3.1~R7.3.31 【進捗率 5%】	(R5 補)林道改良工事(その1) (株)橋本店 R6.3.1~R7.3.31 【進捗率 11%】
⑧	⑦	⑥

【②付替市道舗装工事 完成！】



ダム建設位置



付替道路全景(ダム建設位置~8号橋)

— 開通済区間
— 道路改良工事
