



# 出島架橋事業だより

日頃より、町道女川出島線の出島架橋事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。  
当事業のうち「出島架橋本体工事」は、女川町から依頼を受け、宮城県が施工を進めています。  
これまで橋体本体を支えていた「海上バント設備」の撤去が完了したため、その基礎部分である  
「海上バント杭」の撤去作業として、令和6年5月下旬から海上工事を開始しました。

## 工事場所

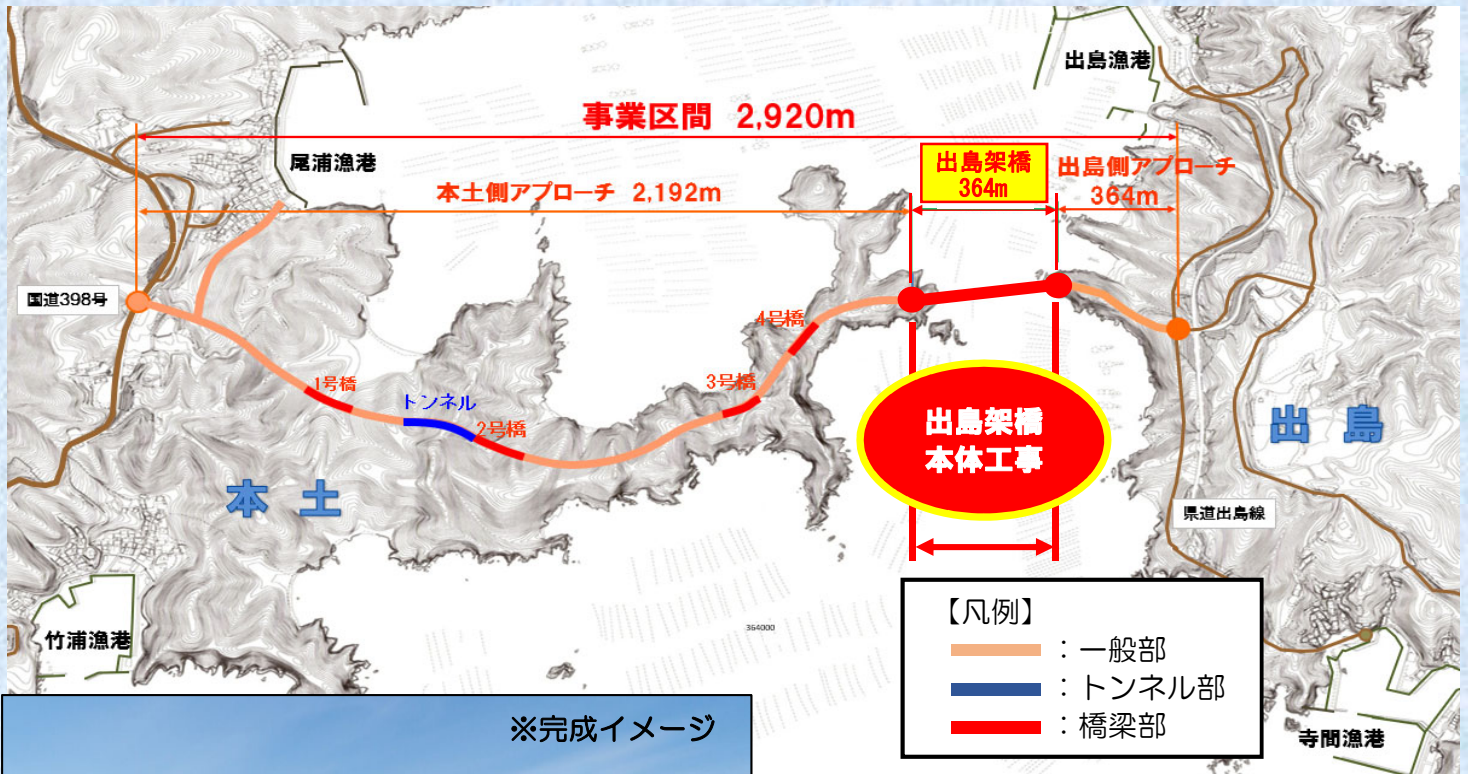

※完成イメージ

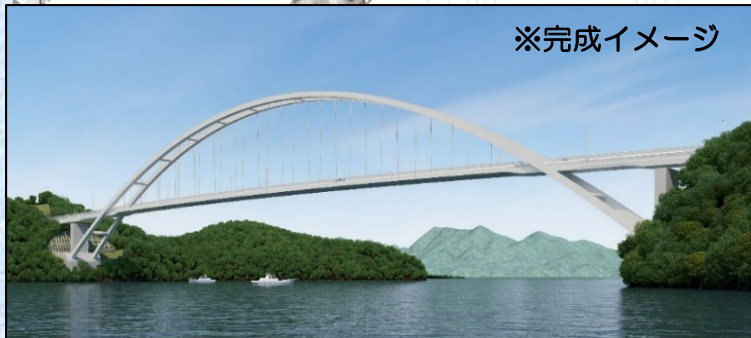

※完成イメージ



### 橋梁諸元

橋長	364.0m	鋼材重量	約4,100t
有効幅員	6.50m	橋梁形式	鋼中路式
アーチ支間	306.0m		アーチ橋

## お問い合わせはこちらまで

### ★出島架橋本体工事に関して★

宮城県 東部土木事務所  
〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地  
電話：0225-98-3145

### ★事業全体に関して★

女川町 建設課 土木係  
〒986-2265 牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1  
電話：0225-54-3131

女川町公式サイト  
(You Tube)


★架設ライブ配信




裏面には  
「進捗状況と今後の予定」  
の記載があります。

# 工事の進捗状況

撮影：R6.5.21

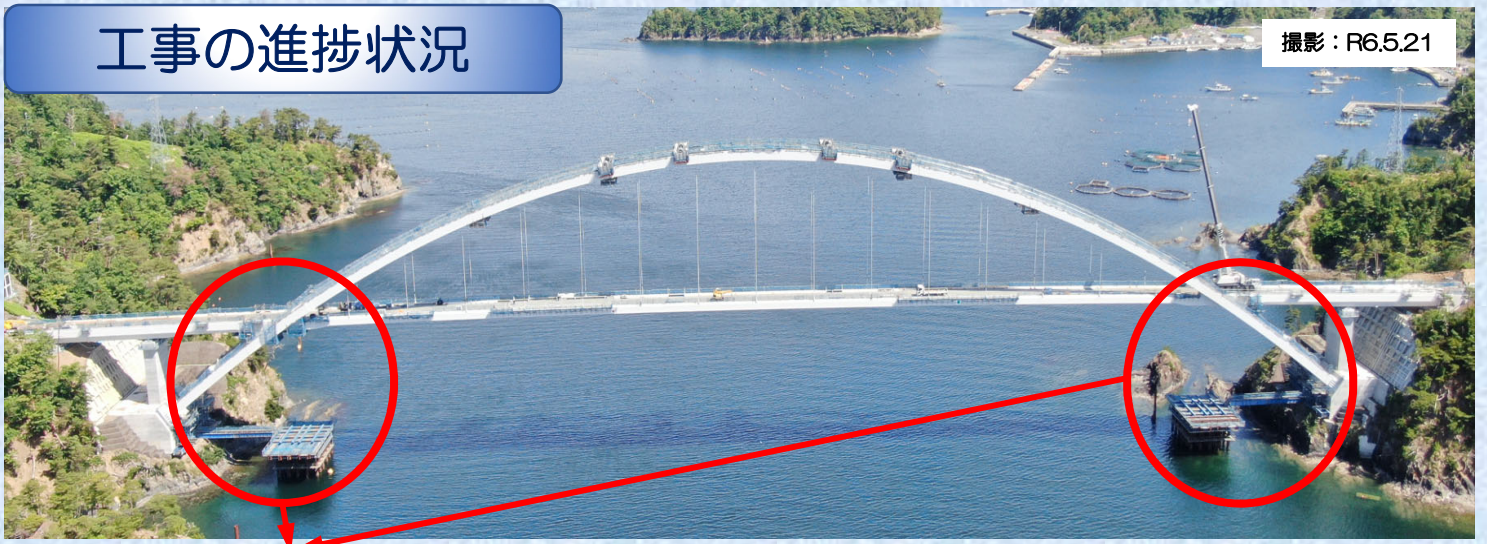

## 海上ベント設備

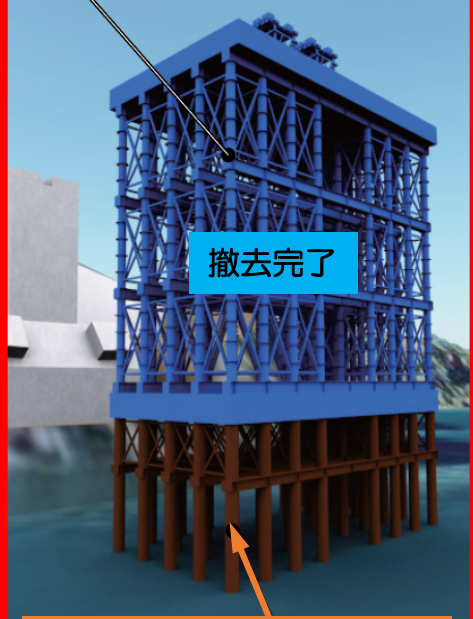

海上ベント杭 撤去開始



杭撤去は、低騒音・低振動の油圧式バイブロを使用します

## 使用する船舶

クレーン付き台船

ベント杭の引抜き作業に使用します。

●200t吊級  
全長：60m  
全幅：18m



作業船が随伴します

150t吊起重機船

ベント杭頭部の鋼材撤去作業に使用します。

全長：40m  
全幅：18m



作業船が随伴します

## 今後の予定

進捗率：全体 94%    上部工：工場製作 100%、現地工事 94%  
(R6.5月末現在)    下部工：現地工事 96%

クレーン付き台船や起重機船を使用して「海上ベント杭」の撤去を行い、撤去したベント杭は台船で女川港石浜岸壁に輸送します。また、橋梁の本体部では、防護柵や排水設備等の設置に加え、占用工事として水道・電気・通信用の配管・配線作業が開始します。
