

## 平成 28 年度公共事業評価部会の審議結果について

平成 29 年 3 月 23 日

公共事業評価部会

## 1 審議対象事業及び事業概要

事業種別	事業名	事業実施箇所	事業採択年度	完成予定年度	事業目的・事業概要	全体事業費(億円)	進捗率(%)
ダム	川内沢ダム建設事業	名取市	H9	H37	川内沢川沿川の洪水防御, 既得取水の安定化及び河川環境の保全を図るもの。 重力式コンクリートダム ダム高H=36.7m 堤体積V=40,900m <sup>3</sup>	95.0	15.2

## 2 審議結果(答申概要)

「事業継続」とした県の評価を「妥当」とした。  
なお, 事業の実施に関する意見は, 次のとおり。

## (1) 審議対象事業の実施に関する意見

川内沢ダム建設事業

事業の実施に当たっては, 関係機関等と十分な調整を図りながらコストの縮減に努めること。

## (2) 今後の事業の実施に関する意見

ダム事業

費用便益の算出に当たっては, 現行の算出方法に沿った分析を基本としつつ, より適切な手法の検討について関係機関との調整に努めるとともに, 算出方法の変更があった場合には, 速やかに対応すること。

## 3 部会審議の経過

平成 28 年 10 月 28 日 諮問



11 月 2 日 第 1 回部会開催(審議)

11 月 25 日 現地調査

12 月 21 日 第 2 回部会開催(審議及び答申取りまとめ)

平成 29 年 1 月 19 日 答申

位置図

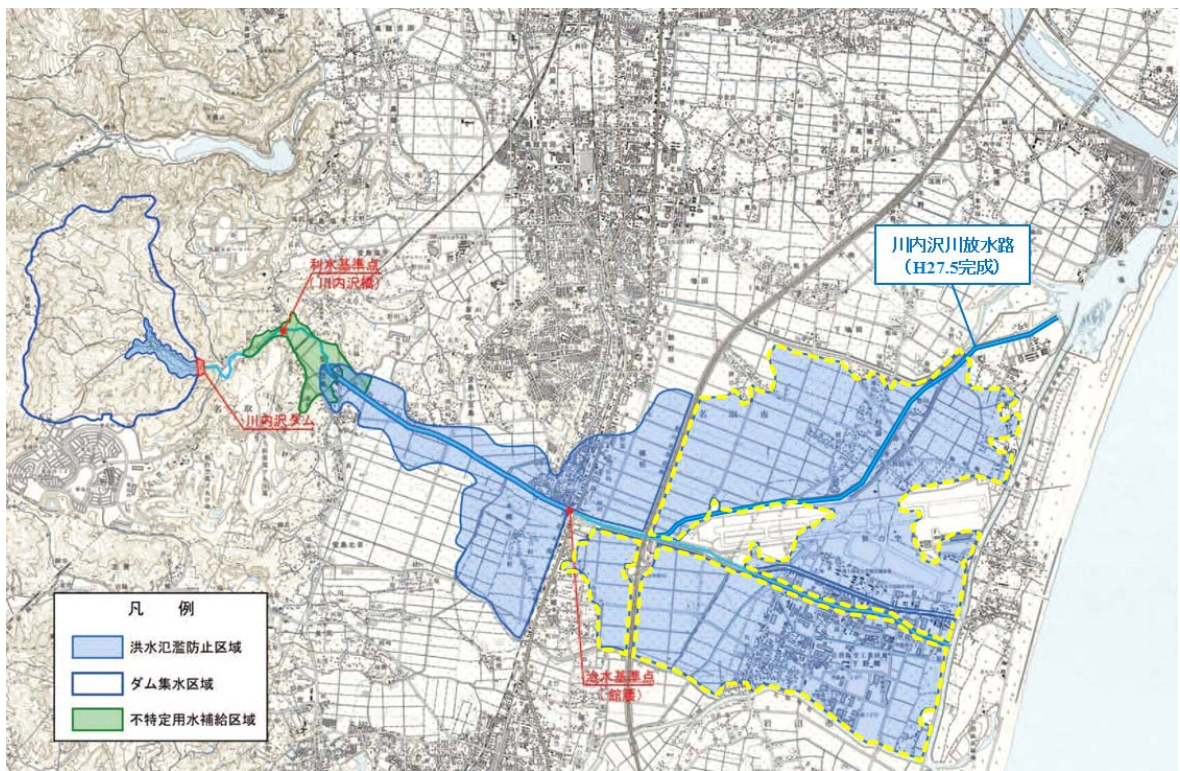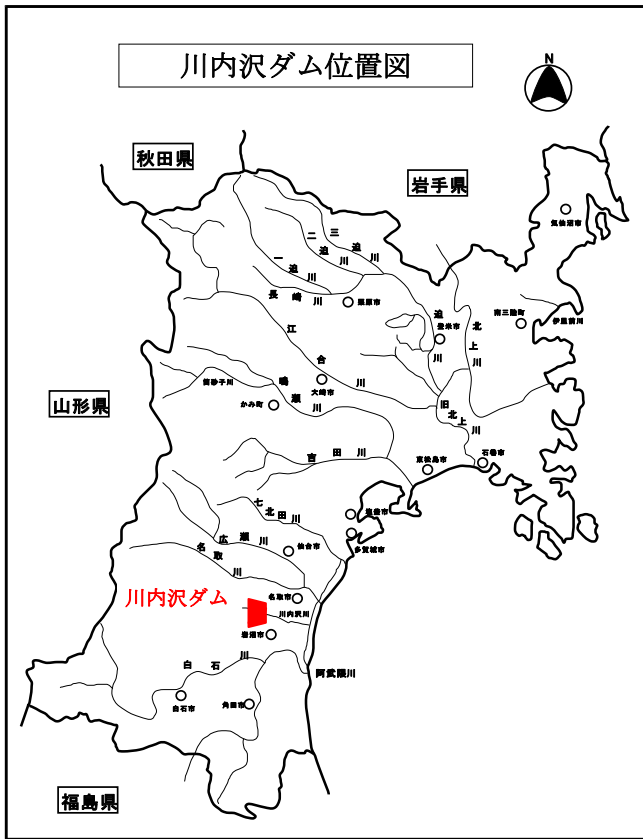

(      川内沢川放水路完成に伴う洪水氾濫防止区域除外箇所)

※この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図を使用したものである
