

# 検討体制

【平成29年度 第1回 石巻南浜津波復興祈念公園有識者委員会 資料】

平成29年12月15日

# 目 次

1. 検討体制	1
2. 検討スケジュール	5
3. 主な検討項目(案)	6
4. 整備スケジュール(案)	7
5. 周辺事業の進捗状況	8
・新門脇地区土地区画整理事業等	9
・防災マリーナ	10
・河川堤防・旧北上川かわまちづくり	11

## 石巻南浜津波復興祈念公園有識者委員会

■石巻南浜津波復興祈念公園(以下、公園)の計画・設計の検討  
(有識者打合せにおける調整内容の報告・オーソライズ)

【開催】:年2回程度

【事務局】:◎宮城県、国土交通省、石巻市

## 石巻南浜津波復興祈念公園 有識者打合せ

■公園における空間デザイン(実施設計)の検討・調整(国営施設、県整備区域等)

【開催】:年4回程度

【事務局】:◎国土交通省東北国営公園事務所、宮城県、石巻市

## 参加型 維持管理運営検討協議会

※昨年度立ち上げた組織を発展的に  
継続

■市民や各種団体、NPO等の参画による維持管理運営方法の検討を継続

【開催】:年3回程度

【事務局】:◎石巻市、国土交通省、宮城県

## 石巻南浜津波復興祈念公園 有識者委員会

目的: 石巻南浜津波復興祈念公園の計画・設計の検討を行う

(有識者打合せにおける調整内容の報告・オーソライズ)

### 委員名簿

(敬称略)

	氏名	役職
委員長	涌井 史郎	東京都市大学環境学部 教授
副委員長	森山 雅幸	宮城大学 特任教授
委員	牛尾 陽子	公益財団法人東北活性化研究センターフェロー
//	岸井 隆幸	日本大学理工学部教授
//	中 静 透	東北大学大学院生命科学研究科教授
//	舟引 敏明	宮城大学事業構想学群教授
//	亀山 紘	石巻市長
//	櫻井 雅之	宮城県土木部長

# 1. 検討体制 3/4 【有識者打合せ】

## 石巻南浜津波復興祈念公園 有識者打合せ

目的: **中核的施設と空間デザインの検討・調整**を行う

### 有識者名簿

(敬称略)

氏名	役職
涌井 史郎	東京都市大学環境学部 教授
佐々木 葉	早稲田大学 創造理工学部 社会環境工学科 教授
小野田 泰明	東北大学大学院 工学研究科 教授

## 石巻南浜津波復興祈念公園 参加型維持管理運営検討協議会

目的: 市民等の参加による、**新たな維持管理運営手法**および**維持管理運営課題**を検討する。

(参加者は募集要領に基づき登録された団体の代表をもって組織されている)

### 協議内容


開催回・時期	協議内容
第1回 平成29年6月30日開催	<ul style="list-style-type: none"><li>○「参加型維持管理運営検討協議会」登録申請について</li><li>○平成28年度協議会及び部会活動報告</li><li>○平成29年度検討協議会及び部会の開催スケジュールの確認</li><li>○植樹祭の開催検討</li></ul>
第2回 平成29年9月15日開催	<ul style="list-style-type: none"><li>○協議会への新規登録団体確認</li><li>○植樹祭の運営手順の検討</li></ul>
第3回 平成29年12月27日開催予定	<ul style="list-style-type: none"><li>○「参加型維持管理運営」検討協議会登録について</li><li>○植樹祭の検証報告について</li><li>○市民活動エリアの活用について</li><li>○伝承部会からの報告について</li></ul>

## 2. 検討スケジュール

有識者委員会【県】

有識者打合せ【国】

参加型維持管理  
運営検討協議会【市】

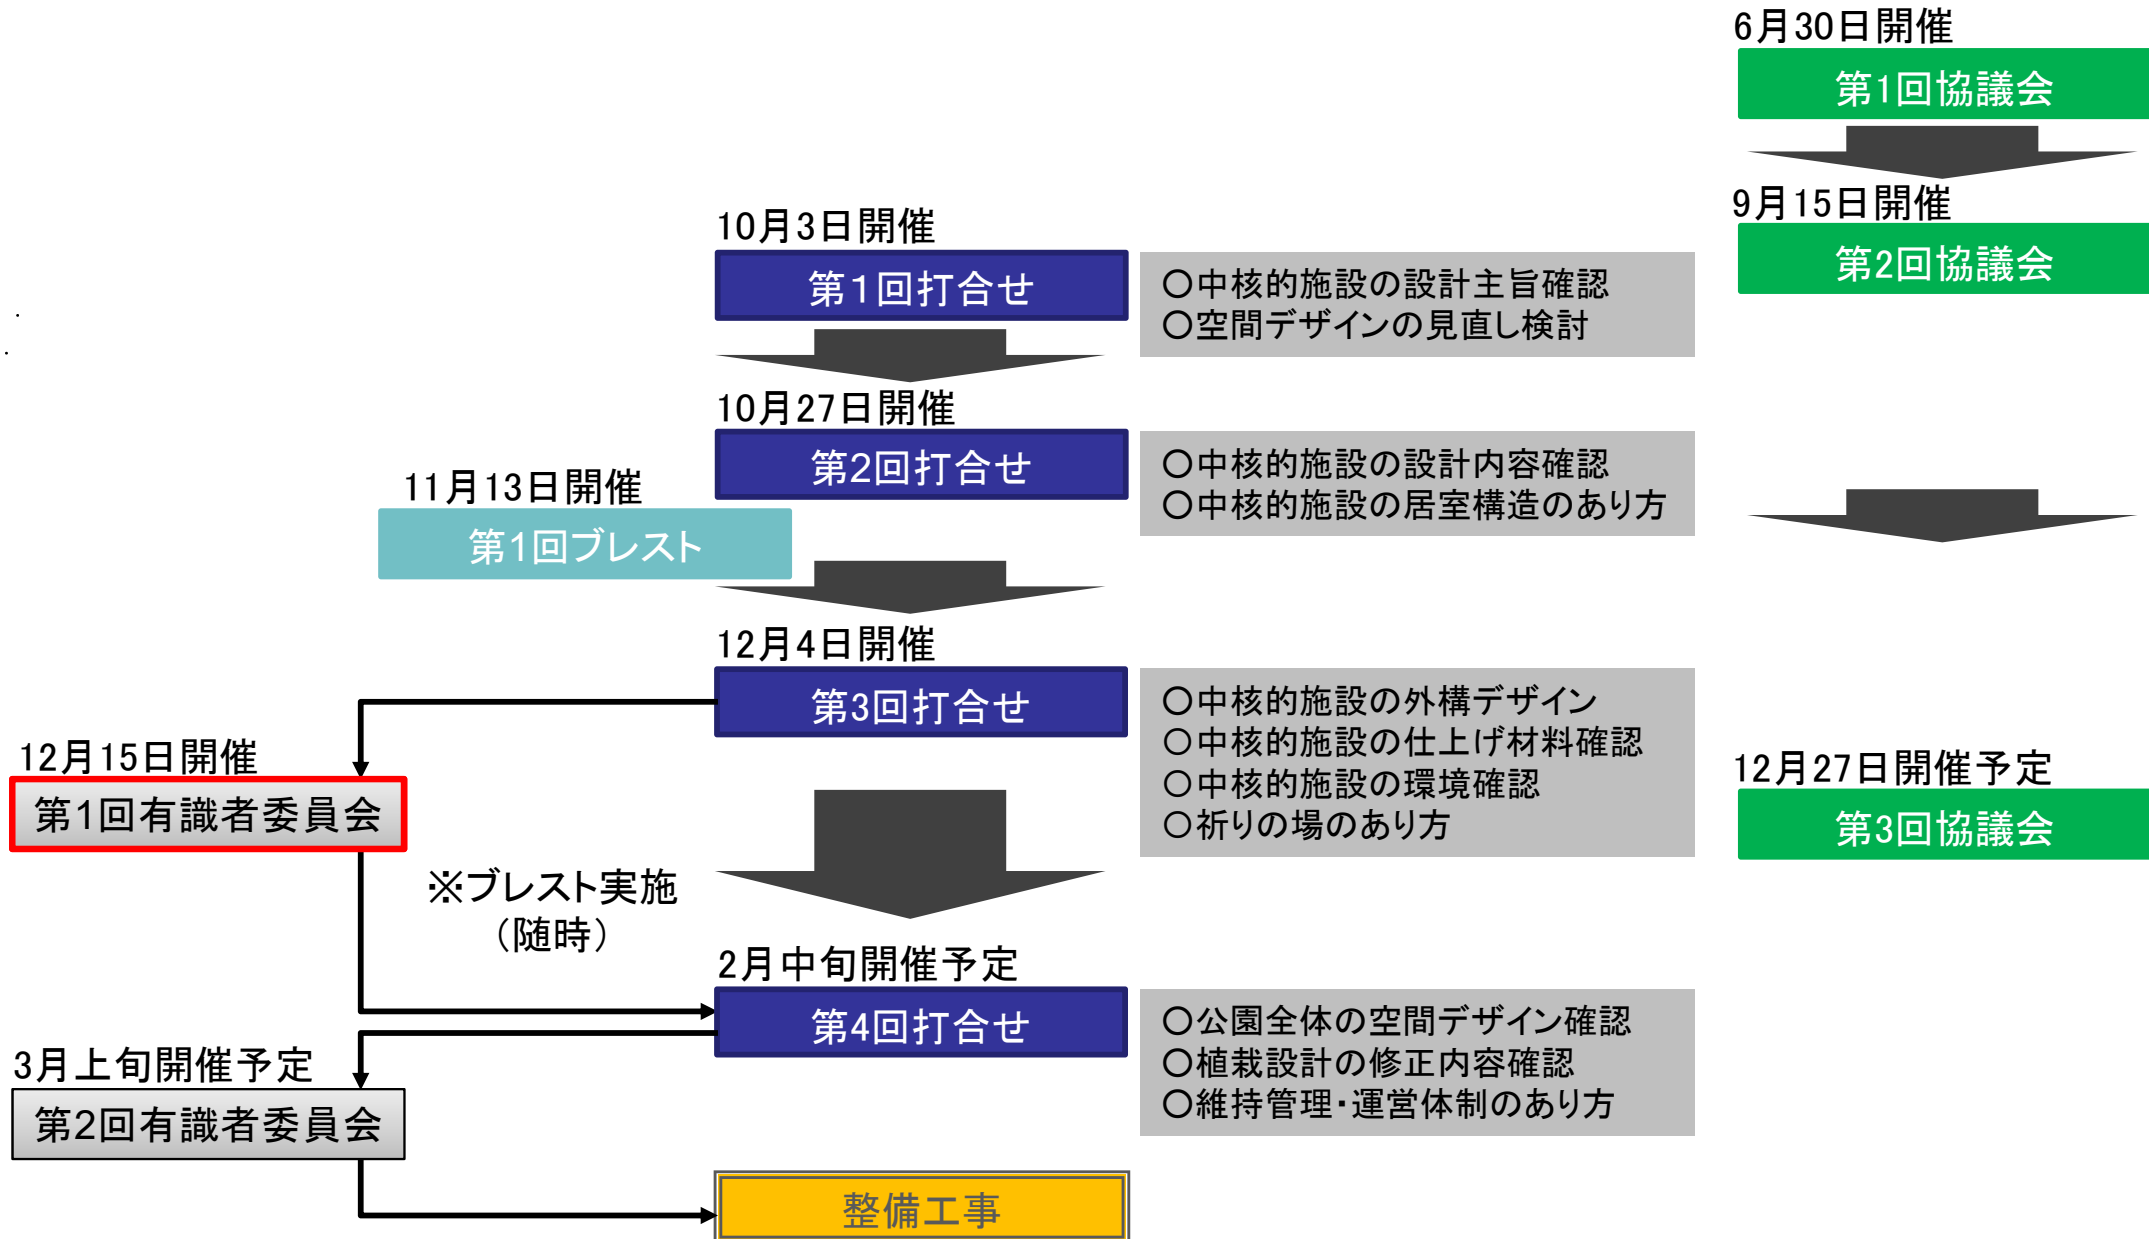

### 3. 主な検討項目(案)

#### ○今年度の主な検討項目(案)

- ① 公園の利活用と連携した中核的施設外構の空間デザインを検討する
- ② 公園の利用形態を考慮した祈りの場の空間デザインを検討する
- ③ 東日本大震災の記憶や教訓の伝承のあり方を検討する
- ④ 市民の参画を考慮した管理運営体制のあり方を検討する



# 4. 整備スケジュール(案)

整備の概要と要点		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33～42年度	H43～52年度
震災経過年・催事等		5年目●	起工式●				東京五輪● 10年目●	20年目○	30年目○
園地計画・設計		基本設計・実施設計							
市民活動拠点機能移設		交渉・検討	暫定移設				本移設		
市民活動拠点整備				整備工事					
追悼の広場整備				整備工事					
門脇広場・北上広場整備				整備工事					
アプローチ道路整備				整備工事					
駐車場整備				整備工事					
聖人堀、善海田池護岸整備					整備工事				
その他園地整備					整備工事				
植栽工事						整備工事			
中核的施設計画・設計			基本設計・実施設計						
中核的施設整備					整備工事				
その他建築施設整備					整備工事				
運営管理							運営管理(施設・植物)		
都市計画審議会			●10月						
都市計画決定告示			●11月						
園地計画・設計		基本設計・実施設計							
一丁目の丘造成					整備工事				
善海田池造成					整備工事				
松原造成					基盤整備				
その他園地整備					整備工事				
植栽工事						植栽工事			
建築施設						整備工事			
運営管理					運営組織検討・準備			運営管理(施設・植物)	
用地買収			買収						
有識者委員会		●10月 ●3月 ●9月 ●3月 12月 ●○3月				○年1回開催予定	○年1回開催予定		
園地計画・設計		基本設計・実施設計							
四丁目南北広場・雲雀野広場整備					整備工事				
駐車場整備					整備工事				
善海田池造成					整備工事				
その他園地整備					整備工事				
植栽工事						植栽工事			
建築施設						整備工事			
運営管理							協議会と連携した運営管理		
用地買収			買収						
参加型維持管理運営検討協議会			準備		協議会・部会				



# 5. 周辺事業の進捗状況 1/4



※年度は現時点の工事予定期間


※マリーナ付近の堤防法線は検討中

(写真提供) 国際航業株式会社 (2013年3月22日撮影)



## 5. 周辺事業の進捗状況 2/4 【新門脇地区土地区画整理事業等】

- 新門脇地区は、平成30年度の完成に向けて造成工事が進められている
- 新門脇地区内の復興公営住宅は、平成29年1月頃から入居が開始された
- 都市計画道路のうち、門脇稲井線(新門脇地区内)と南光湊線の西側区間は平成28年度に完成した

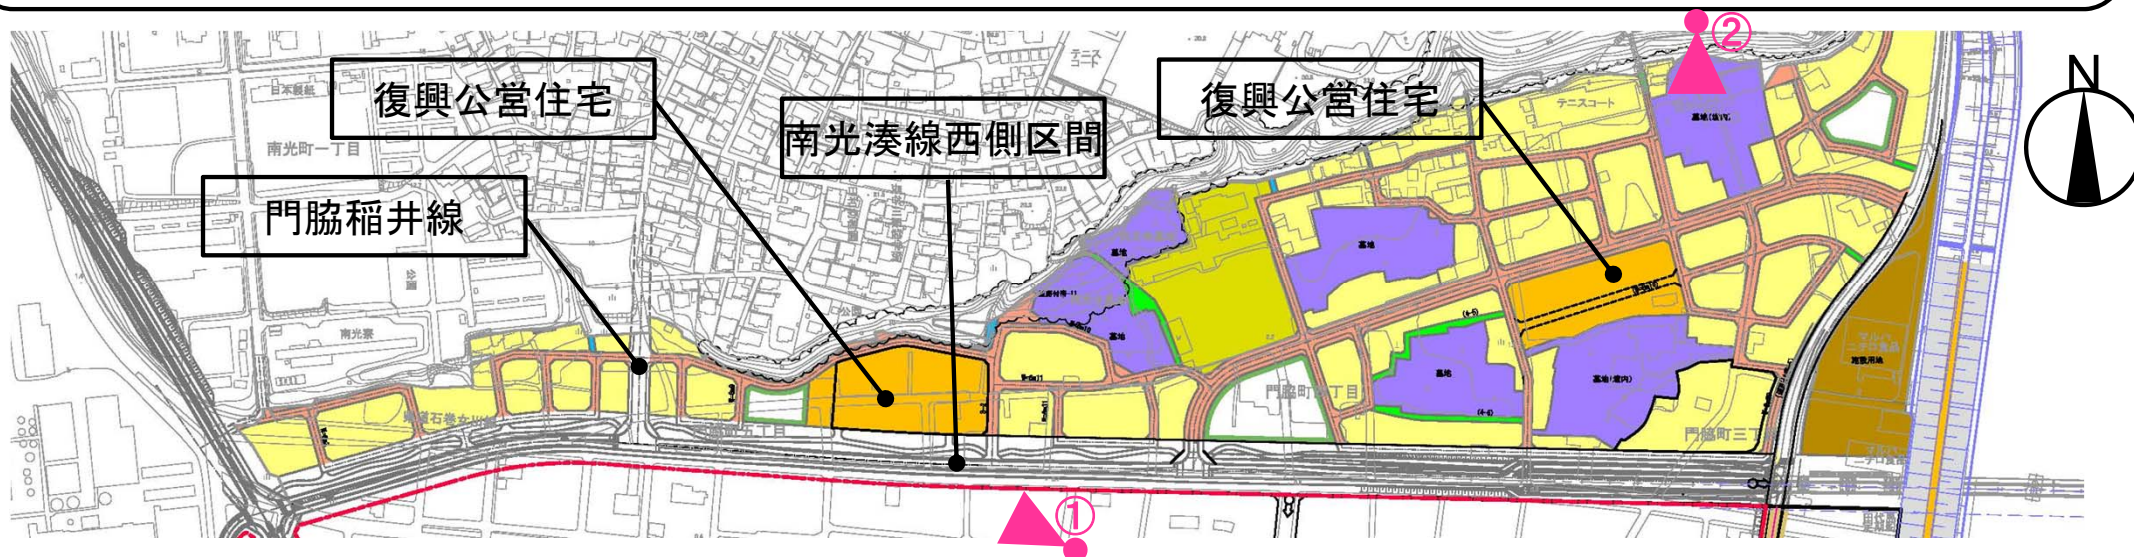

①完成した南光湊線(西側区間)と復興公営住宅(H29.9月撮影)



②日和田山から見た新門脇地区の整備状況(H29.9月撮影)

## 5. 周辺事業の進捗状況 3/4 【防災マリーナ】

○平成26年度より計画検討を開始し、今年度より基盤整備工事の実施を予定

○河川堤防、周辺整備及び施設の管理運営について検討・調整し、平成32年4月の供用開始を目指す

事業スケジュール(予定)

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
施設整備	計画検討	調査・設計・検討			基盤整備	施設整備	◎ H32年4月 供用開始
管理運営 指定管理者制度等				管理運営 方法の 調査検討	指定管理者 制度設計	指定管理者 選定手続き	◎ H32年4月 指定管理 開始
				アンケート 調査実施		指定管理 条例策定	




## 5. 周辺事業の進捗状況 4/4 【河川堤防・旧北上川かわまちづくり】

- 平成24年から堤防工事の前段となる護岸工事に着手しており、堤防整備事業は、平成32年度完了予定
- 堤防整備と合わせ、「旧北上川かわまちづくり」として、市民の集いの場、憩いの場となる水辺空間の整備を進めている



▲工事進捗状況 (H29.3末)

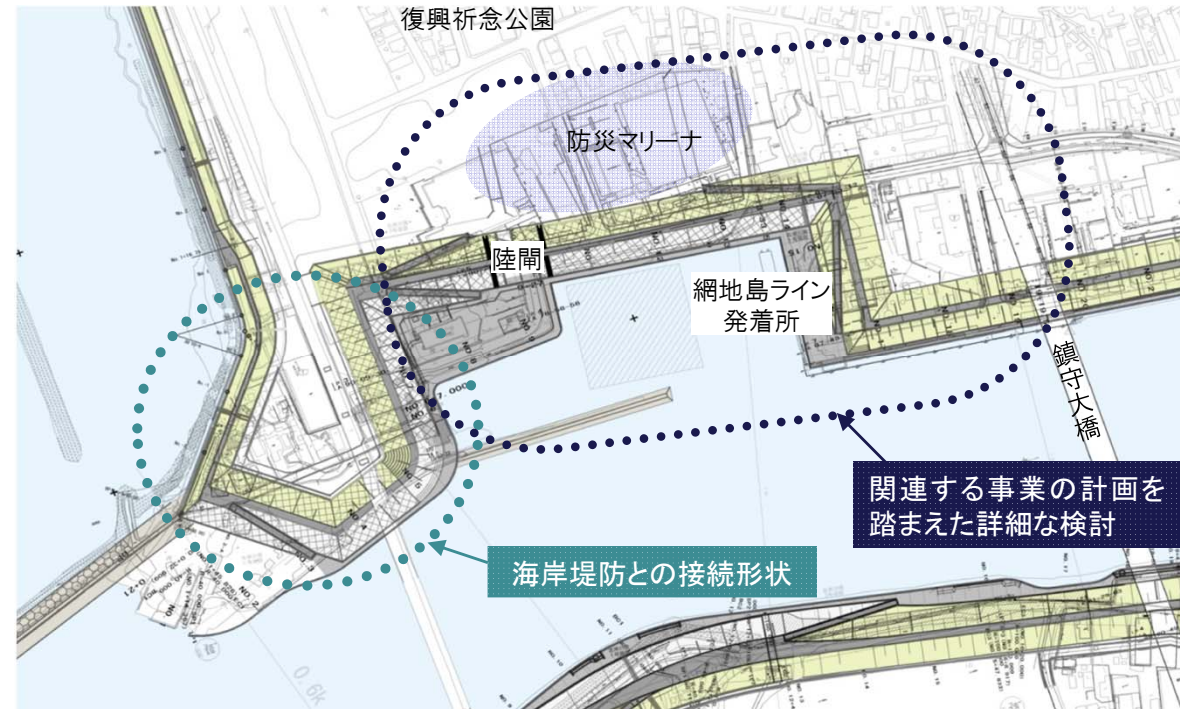

▲かわまちづくりの検討課題



▲整備イメージ



▲整備状況 (H29.12)

### 【かわまちづくりの検討状況—南浜地区の課題—】

- ◎関連する事業(復興祈念公園、防災マリーナ、網地島ライン、鎮守大橋等)の計画を踏まえ、それらとの関係性、利便性等を考慮した形状や施設配置等の詳細な検討を行う。
- ◎海岸堤防との接続部分のあり方について関係機関と調整を図りながら、堤防法線の検討を行う。
