


contents

- ・復旧・復興事業の進捗状況【平成26年6月末現在】
- ・復興トピックス
- ・災害公営住宅の整備について




復旧・復興の進捗状況【平成26年6月末現在】

●災害復旧工事の進捗状況

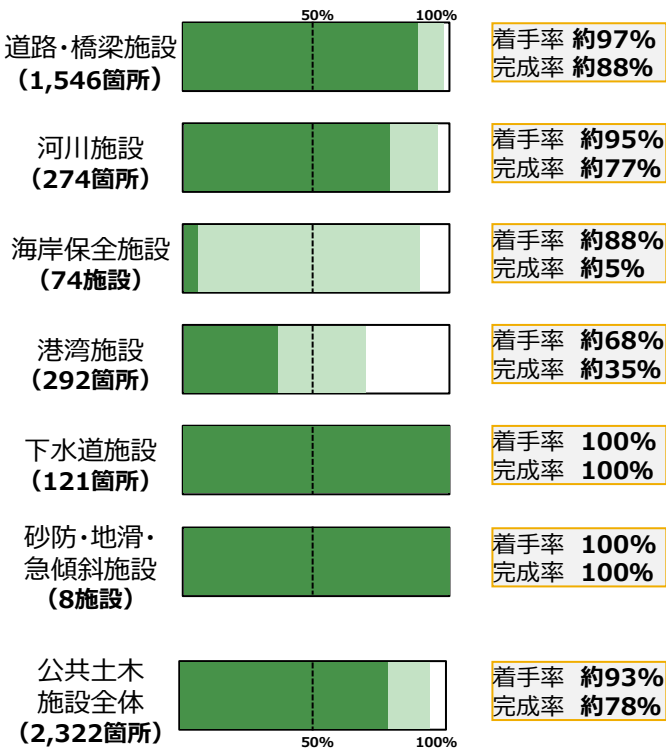


■ 着手率：工事請負契約を締結したもの
■ 完成率：工事が完了したもの

●復興まちづくり事業の進捗状況

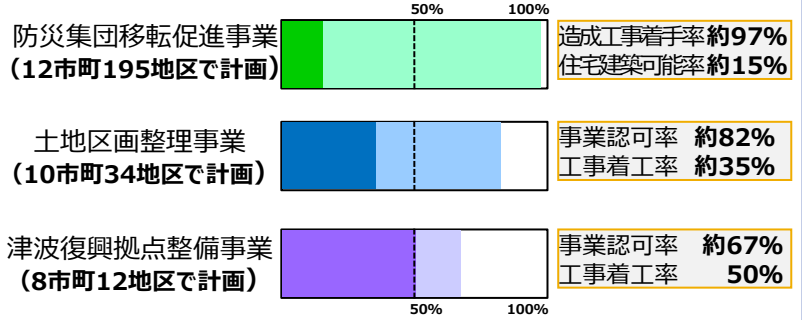


■ 造成工事着手率：工事請負契約の締結などが完了した地区数の割合
■ 住宅建築可能率：造成工事が完了するなど住宅等建築工事が可能となった地区の割合
■ 事業認可率：事業計画が知事の認可を受けた地区数の割合
■ 工事着手率：施工業者が事業用地内の工事に着手した地区の割合

●災害公営住宅の整備状況




●仙台塩釜港（仙台港区）コンテナ貨物取扱量



■ 回復率：震災前(H22/1～H22/3)に対して現在(H26/1～H26/3)のコンテナ取扱量(TEU)の割合

※TEUとは20フィートコンテナ1個分相当を示す単位

●仙台空港乗降客数の状況

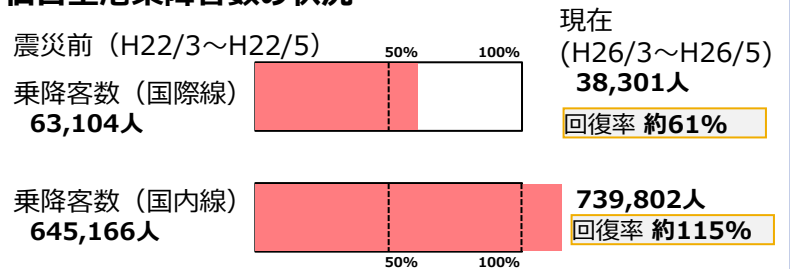

■ 回復率：震災前(H22/3～H22/5)に対して現在(H26/3～H26/5)の仙台空港乗降客数の比率

▲宮城県では、毎月復興の進捗状況を取りまとめて公表しています。詳しくは下記URL又はQRコードを参照願います。

・震災復興・企画部震災復興政策課ホームページ「復興の進捗状況」

<http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/shintyoku.html>

・土木部土木総務課ホームページ「東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況」

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/dobokusom/doboku-sintyoku-press.html>



復興トピックス（平成26年5月下旬～7月下旬）

●5月31日 千年希望の丘植樹祭2014 開催

「千年先の子どもたちへ10万本の植樹」を目指して、国内最大級の植樹祭が岩沼市の主催で開催されました。当日は7,000名のボランティアスタッフが集まり、約7万本の木々が植えられました。



●6月8日 国営みちのく杜の湖畔公園の全園開園式 開催

国営みちのく杜の湖畔公園は、東北唯一の国営公園として平成元年8月に南地区の一部（約62ha）を開園して以降、多くの方に親しまれてきました。

この度「里山地区」（森と環境のゾーン）の整備（地域交流館「小野分校」、「森の学校」等）が完了したことから、33年間にわたる全ての事業が終了し、全園開園式が開催されました。



災害復旧工事の本格着工に合わせて各地で安全祈願祭を開催

●6月13日 新北上大橋橋梁災害復旧工事安全祈願祭

津波により一部落橋した北上大橋は、仮設橋の供用により早期に通行を確保していましたが、本格着工にあたり復興の架け橋となるよう鋭意工事を進めて参ります。



●6月19日 北上運河河川災害復旧工事安全祈願祭

安全祈願祭には、関係者等20名が参列して神事が執り行われました。



●6月19日 砂押川安全祈願祭

関係者等約60名が参加して神事が執り行われました。

●6月16日 五間堀川安全祈願祭

災害復旧工事の施工会社7者の共催で、安全祈願祭が実施されました。

●7月2日 皿貝川河川災害復旧工事安全祈願祭

河北地域の日も早い復興を祈念し、安全祈願祭を開催しました。

●6月27日 仙台空港特定運営事業等募集要項 公表

県では仙台空港のさらなる発展と周辺地域の活性化を目指して「仙台空港民営化」へ向けた取組を進めておりますが、県空港臨空地域課では、空港運営権者の選定手続開始にあたり、空港ビル等の譲渡に関する確認手続を行うほか、国の選定審査委員会の委員として、運営権者選定手続に携わっています。この度、確認手続の要領を正式に公表し、公募手続を開始したものです。

これまでの経緯と今後のスケジュール

平成24年10月	仙台空港の経営改革に関する宮城県基本方針策定
平成25年3月	仙台空港及び周辺地域の将来像策定
5月	仙台空港600万人5万トン実現サポーター会議設置
6月	民活空港運営法成立※
	※民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
10月	国基本方針公表※
	※民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針
平成26年4月	仙台空港特定運営事業等実施方針公表
6月	国募集要項、県確認要領公表
6月～12月	県確認手続
12月～平成27年8月	国選定手続
平成27年8月	優先交渉権者の選定
11月	運営権設定、実施契約の締結
平成28年3月	空港運営事業開始

▲選定手続きに関しては県空港臨空地域課のホームページをご覧ください。<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kurin/>

●6月25日 ハワイアン航空「仙台—ホノルル線」就航1周年

「仙台—ホノルル線」が就航1周年を迎えることを記念し、仙台空港において記念イベントが実施されました。当日は、出発便の搭乗客全員にハワイアン航空オリジナルブランドグッズがプレゼントされたほか、ホノルルまでの往復チケットなどが当たる抽選会が開催されました。



▲詳しくは下記URLをご覧ください。<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kurin/20140625hawaiianair.html>

●6月28日 塩竈市浦戸地区災害公営住宅安全 祈願祭・着工式 開催

塩竈市浦戸諸島では、野々島、桂島、寒風沢島、朴島で合計45戸の災害公営住宅の建設が予定されておりますが、今年度内に工事完了を目指して鋭意工事を進めています。



4地区の区長の皆様に完成予想図が手渡される

●6月29日 三陸沿岸道路気仙沼道路（仮称） 気仙沼湾横断橋着工式 開催

三陸沿岸道路気仙沼道路の一部である気仙沼湾横断橋は、三陸縦貫自動車道を象徴する大規模な土木構造物であり、今後、気仙沼地域の復興のシンボルとして地域産業や観光の振興などにも大きく寄与するものと期待されます。



▲詳しくは道路課ホームページをご覧ください。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/kesennu_mawanoudankyouchakkousiki.html

●7月16日 宮城県建設工事表彰式・ 事故防止対策推進大会 開催

宮城県建設工事表彰式は、県が発注した工事のうち優良な工事を施工した施工業者及び安全管理に対する取組が優良であった現場代理人を表彰するもので、今年度は、95社、97名が受賞されました。



▲詳しくは下記URLをご覧ください。
<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/snd-doboku/gokenborisaigai.html>

●7月23日 名取市下増田地区災害公営住宅起工式 開催

名取市下増田地区では、防災集団移転促進事業による移転団地内に92戸の災害公営住宅が建設予定となっておりますが、名取市では初の工事着手となり起工式が開催されました。木造42戸については、今年度内の入居を目指して整備を進めています。



佐々木市長（右）とUR都市機構宮城福島震災復興支援の稲垣満宏本部長による鍬入れの様子

災害公営住宅の整備について

●整備計画の見直しについて（平成26年7月18日現在）

平成23年12月に策定した「宮城県復興住宅計画」では、全ての災害公営住宅を平成27年度末までに完成させることを目標としていましたが、造成工事に時間を要したことなどから平成29年度末となります。

県全体の計画戸数は**15,561戸**で、平成27年度末までに完成する戸数は**11,555戸（全体計画の約74%）**となり、平成28年度以降に完成する戸数は**3,800戸（全体計画の約24%）**となります。平成28年度中の完成戸数は**2,741戸**、平成29年度中の完成戸数は**1,059戸**となります。（石巻市が計画している4,000戸のうち、206戸は、整備スケジュールを調整中）

今後は、整備スケジュールに遅れが出ないように、また、一日も早い災害公営住宅の全戸完成を目指し、各市町とともに整備を推進してまいります。

年度別の完成予定戸数

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	石巻市検討中	計
完成戸数	50戸	1,301戸	5,324戸	4,880戸	2,741戸	1,059戸	(206戸)	15,561戸
累計		1,351戸	6,675戸	11,555戸	14,296戸	15,355戸	15,561戸	
%	0.3%	8.7%	42.9%	74.3%	91.9%	98.7%	100.0%	

▲詳しくは復興住宅整備室のホームページをご覧ください。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/seibikeikaku-minaoshi.html>

●整備状況について

県内の災害公営住宅の整備状況について、市町村の地区別にまとめて、毎月公表しています。

平成26年6月末時点で21市町、216地区、11,947戸において事業着手しています。事業着手している災害公営住宅のうち、20市町、123地区、6,673戸について着工し、10市町、28地区、1,361戸については工事が完了しました。

なお、各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。


災害公営住宅整備の進捗状況【平成26年6月末現在】

	設計着手	工事着手	うち工事完了	入居開始
市町数	21市町	20市町	10市町	10市町
地区数	216地区	123地区	28地区	27地区
戸数	11,947戸 (77%)	6,673戸 (43%)	1,361戸 (9%)	1,353戸 (9%)

()内は、平成26年7月18日に更新した計画戸数に基づいた進捗率を示している。



巨理町荒浜地区災害公営住宅
足場が外れて塗装した外壁が見えてきました。現在、主に建物の内装工事を行っています。

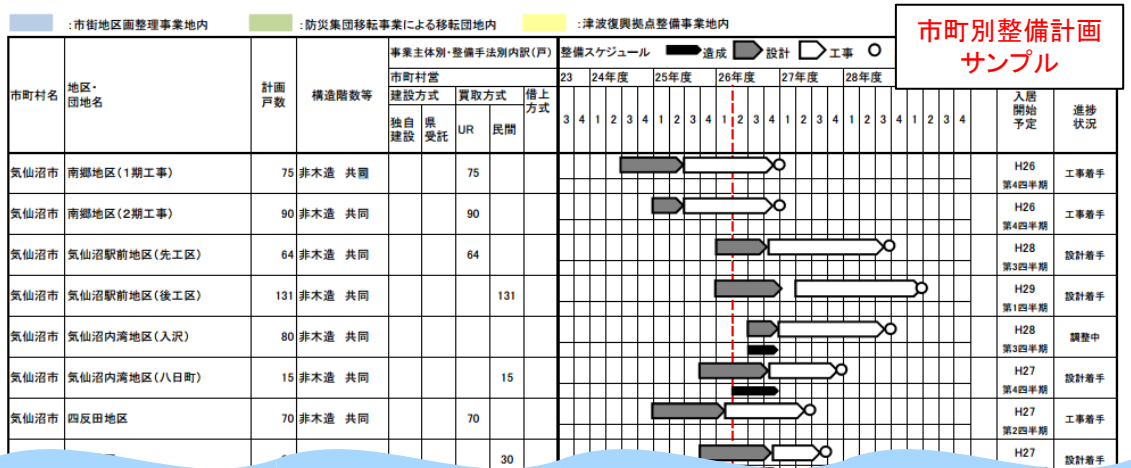

▲詳しくは下記URL又はQRコードをご覧ください。<http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/seibiplan.html>



○記事に関する問い合わせ○

宮城県土木部土木総務課企画調整班

TEL : 022-211-3108

E-mail : dobokgk1@pref.miyagi.jp

H P : <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/dobokusom/>
