


# 【港川水系港川(下流工区)】 進捗状況

## 事業概要

復旧延長 L = 507.0m  
 河川土工 築堤盛土工 V = 107,500m<sup>3</sup>  
 法覆護岸工 コンクリートブロック工 (2t型) A = 18,126m<sup>2</sup>  
 地盤改良工 一式  
 樋門工 N = 2基

## 計画平面図

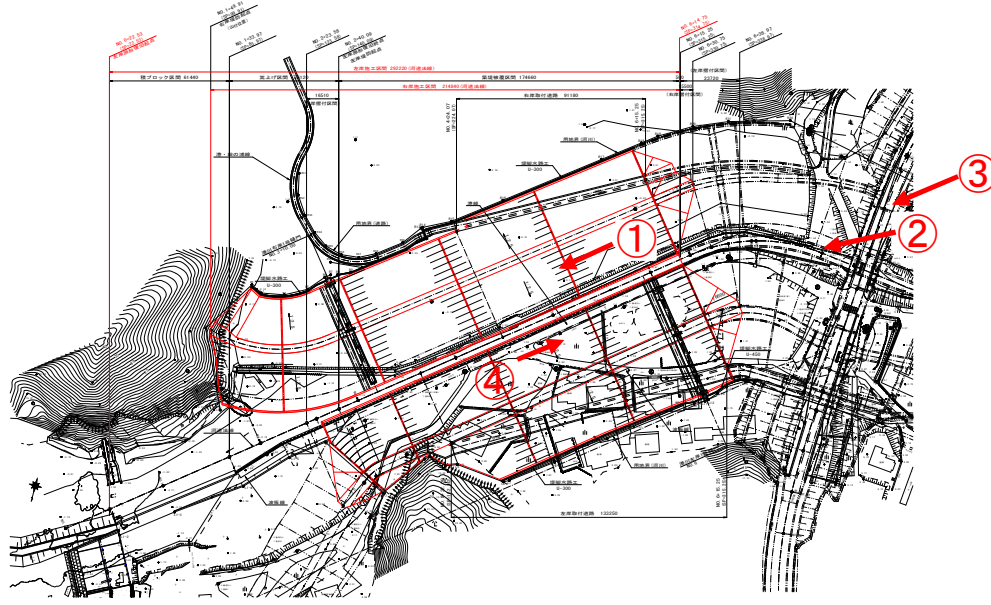

## 事業位置



二級河川・港川水系港川  
南三陸町歌津字港地内


### ① 着手前 平成26年10月



### ② 着手前 平成26年10月



## 計画横断面図





# 【港川水系港川(下流工区)】 進捗状況

## 進捗状況

中流側の護岸工が完成し今後は取付坂路工及び町道等の付帯施設工を施工します。

### ③ 令和5年2月末現在の状況



(上流側より) 中流工区 of 取付坂路工及び町道を施工しています。

### ④ 令和5年2月末現在の状況



(北側より) 中流工区 of 取付坂路工及び町道を施工しています。
