


【針浜地先海岸】進捗状況

事業概要

復旧延長 L=1,007.7m
 直立型コンクリート護岸工 L=997.2m
 水門工(カーテンウォール工) N=2基
 基礎捨石(50~200kg) V=7,670m³
 消波根固めブロック工(2t型) N=2,467個

計画平面図

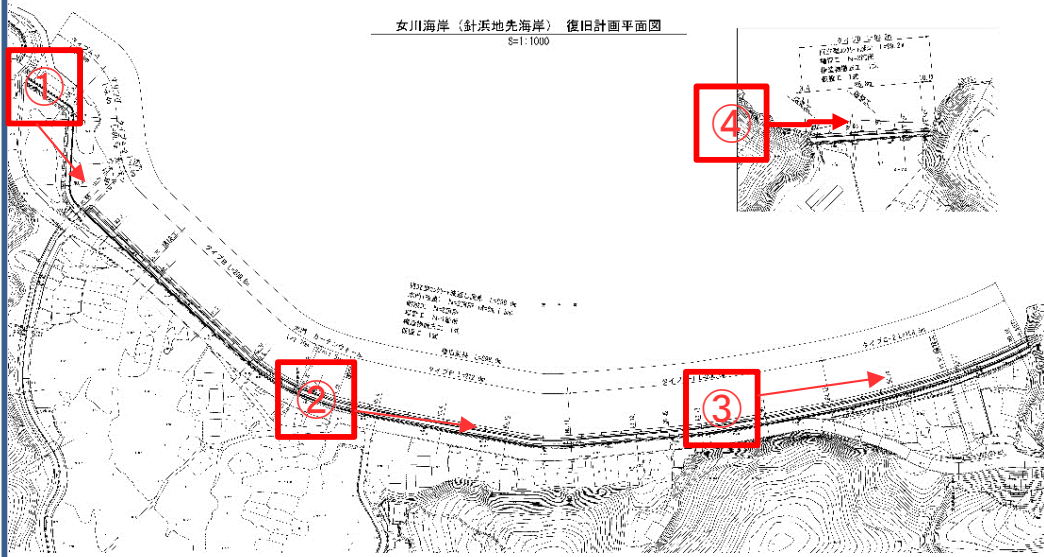

事業位置



針浜地先海岸
牡鹿郡女川町針浜地内

① 着手前 平成24年12月



② 着手前 平成24年12月




③ 着手前 平成24年12月



④ 着手前 平成24年12月



計画横断図

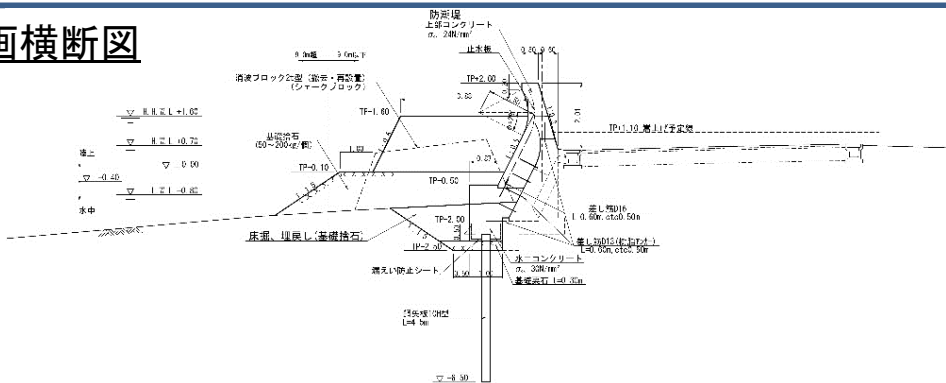

【針浜地先海岸】 進捗状況

進捗状況

平成27年2月に完成しました。

① 平成27年2月完成



② 平成27年2月完成



③ 平成27年2月完成



④ 平成27年2月完成

