


【一級河川名取川水系 川内沢川】 進捗状況

事業概要

復旧延長 L=3,355m, 右岸L=3,355m, 左岸L=3,355m

堤防工(津波堤防) L=436m、沈下戻し L=2919m
 橋梁架け替え 6橋 橋梁撤去 1橋

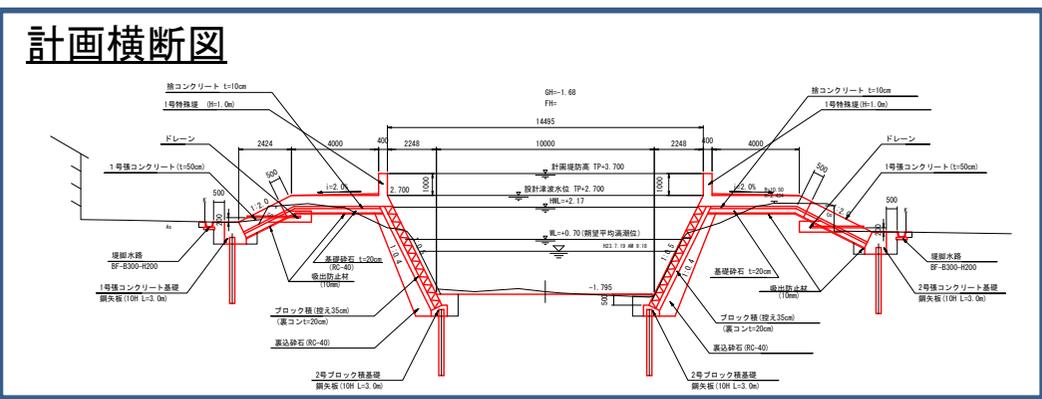

【一級河川名取川水系 川内沢川】 進捗状況

進捗状況

川内沢川の災害復旧事業は完了しました。

① 平成30年2月末現在の状況



護岸工事が完了しました。

② 平成30年2月末現在の状況



護岸工事が完了しました。

③ 平成30年2月末現在の状況



川内沢5号橋が完了しました。

④ 平成30年2月末現在の状況




沈下戻しの復旧が完了しました。

【一級河川名取川水系 川内沢川(放水路)】 進捗状況


事業概要

施工延長 L=5,640m
 河道掘削、築堤、護岸
 付帯工(橋梁 7橋、サイフォン2箇所、排水路付替え L= 3,446m)

計画平面図

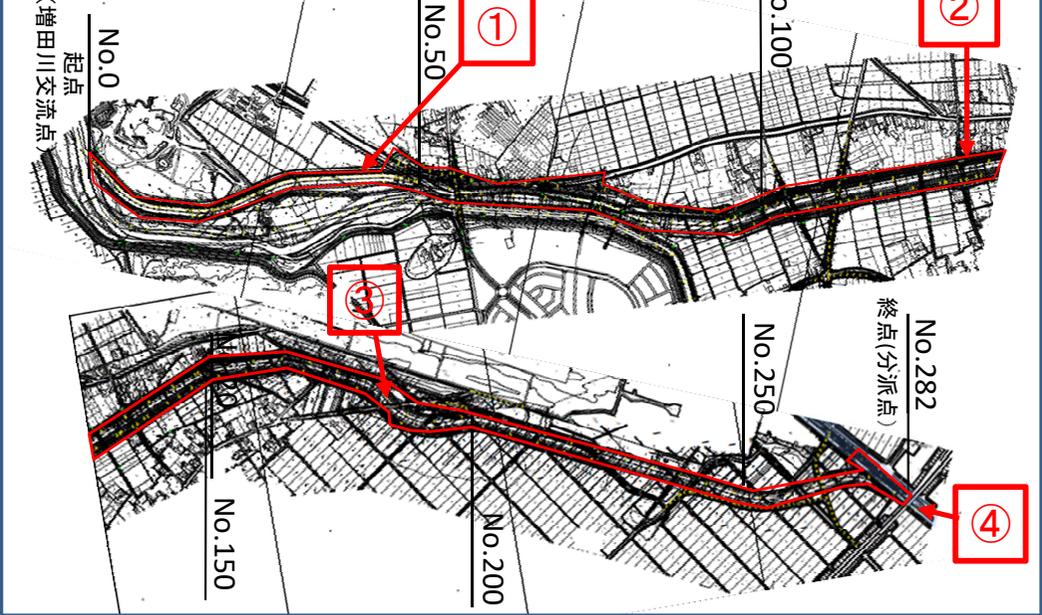

計画横断面

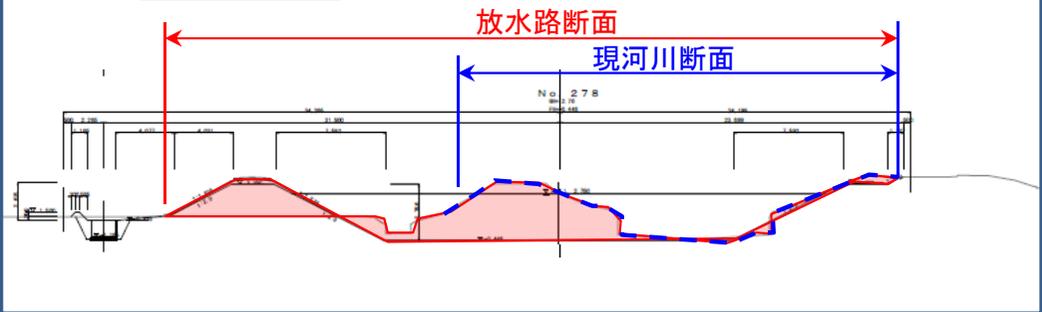

事業位置



① 着手前 平成30年5月



② 着手前 平成24年10月



③ 着手前 平成24年9月



④ 着手前 平成25年6月



【一級河川名取川水系 川内沢川(放水路)】 進捗状況

進捗状況

寺野大橋より下流区間については、「粘り強い構造」としてコンクリート被覆するものとして工事を進めています。

① 令和2年2月末現在の状況（寺野大橋から下流を望む）



「粘り強い構造」の護岸工事を進めています。

② 平成28年3月末完成（新鷹の橋から下流を望む）



放水路の掘削・築堤工事が完成し通水しています。

③ 平成28年3月末完成（矢野目新橋から上流を望む）



排水路付替えと放水路の掘削・築堤工事が完成し通水しています。

④ 平成28年3月末完成（放水路分派点から下流を望む）



放水路と現河川との切替えが完了しました。
