

女川原子力発電所
環境放射能調査結果(案)
資 料 編

令和 7 年度第 3 四半期

1 調査地点

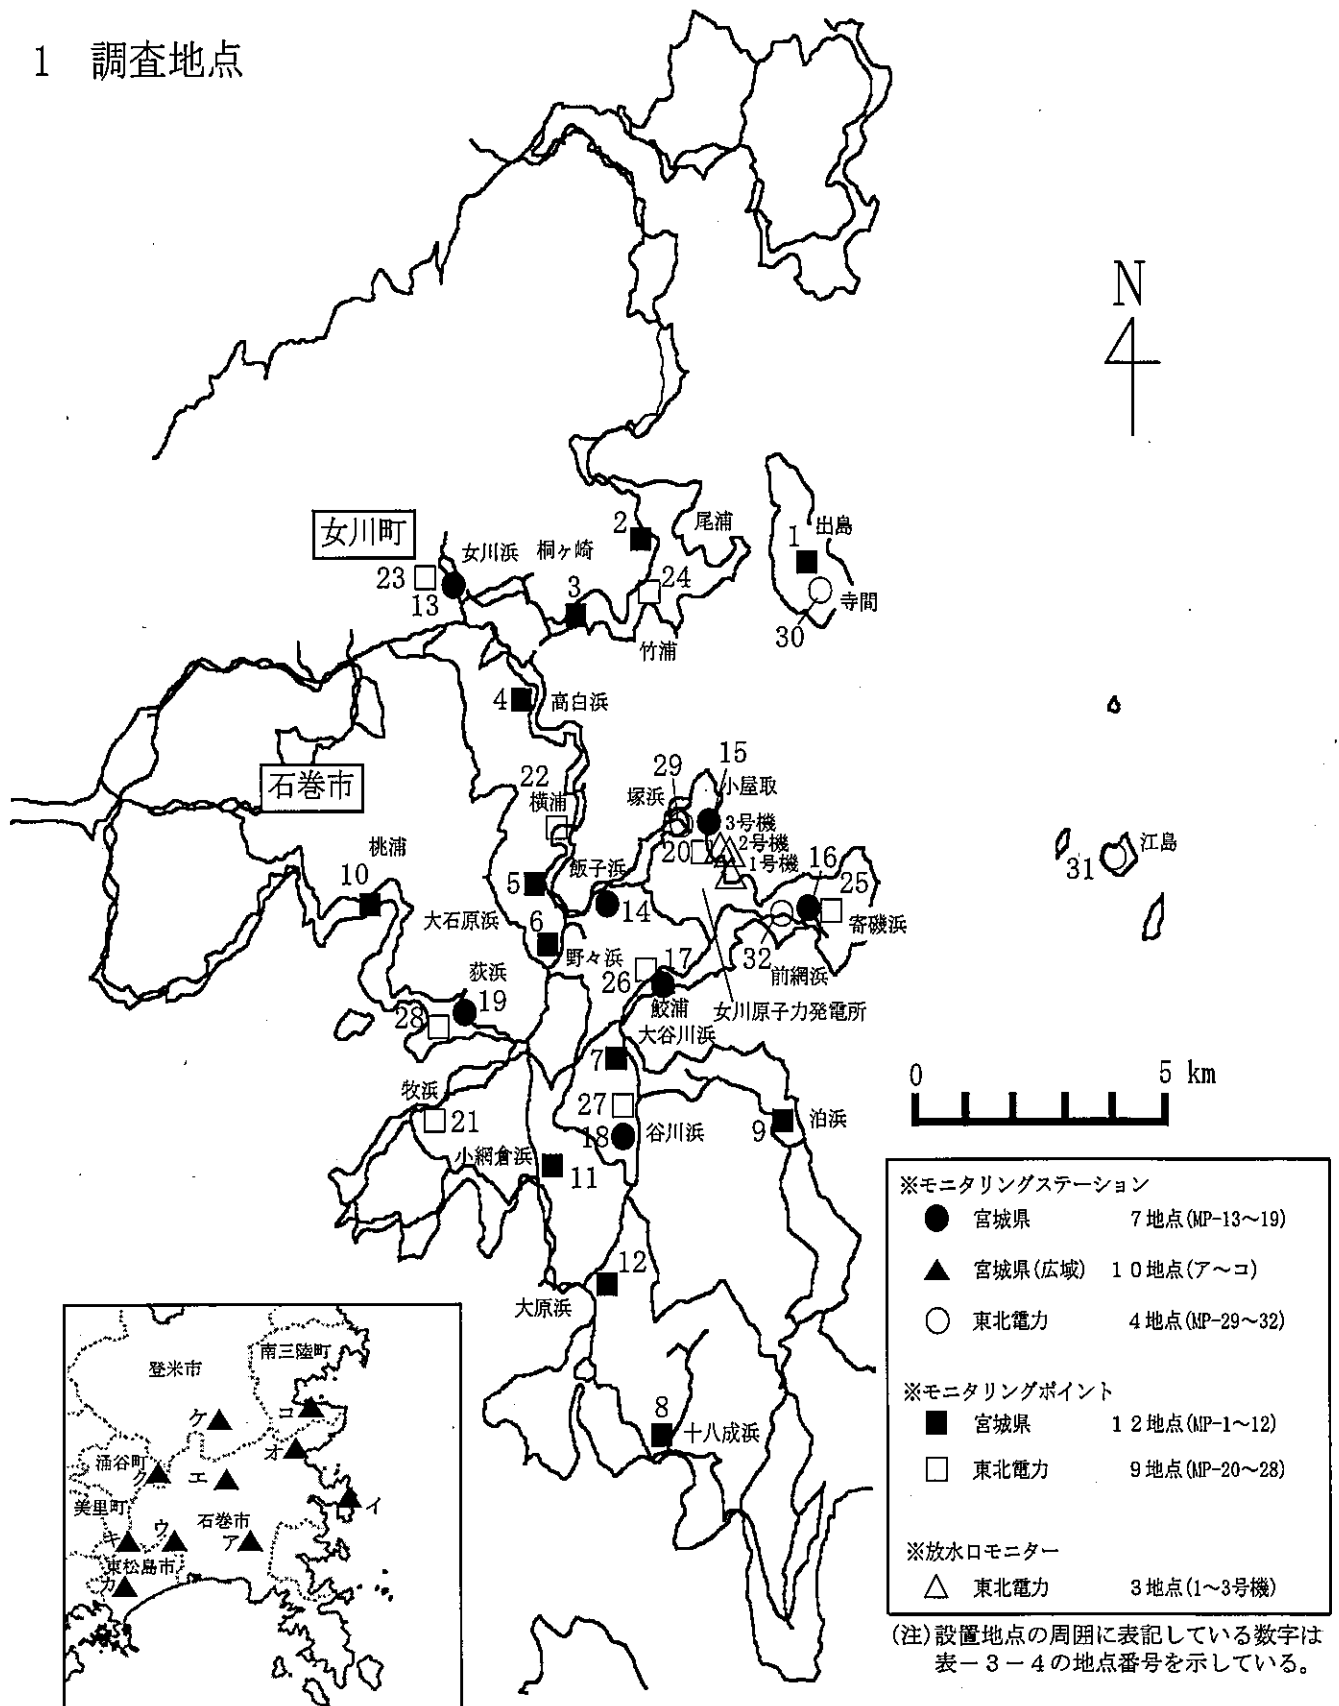


図-1-1 モニタリングステーション、モニタリングポイント及び放水口モニター設置地点

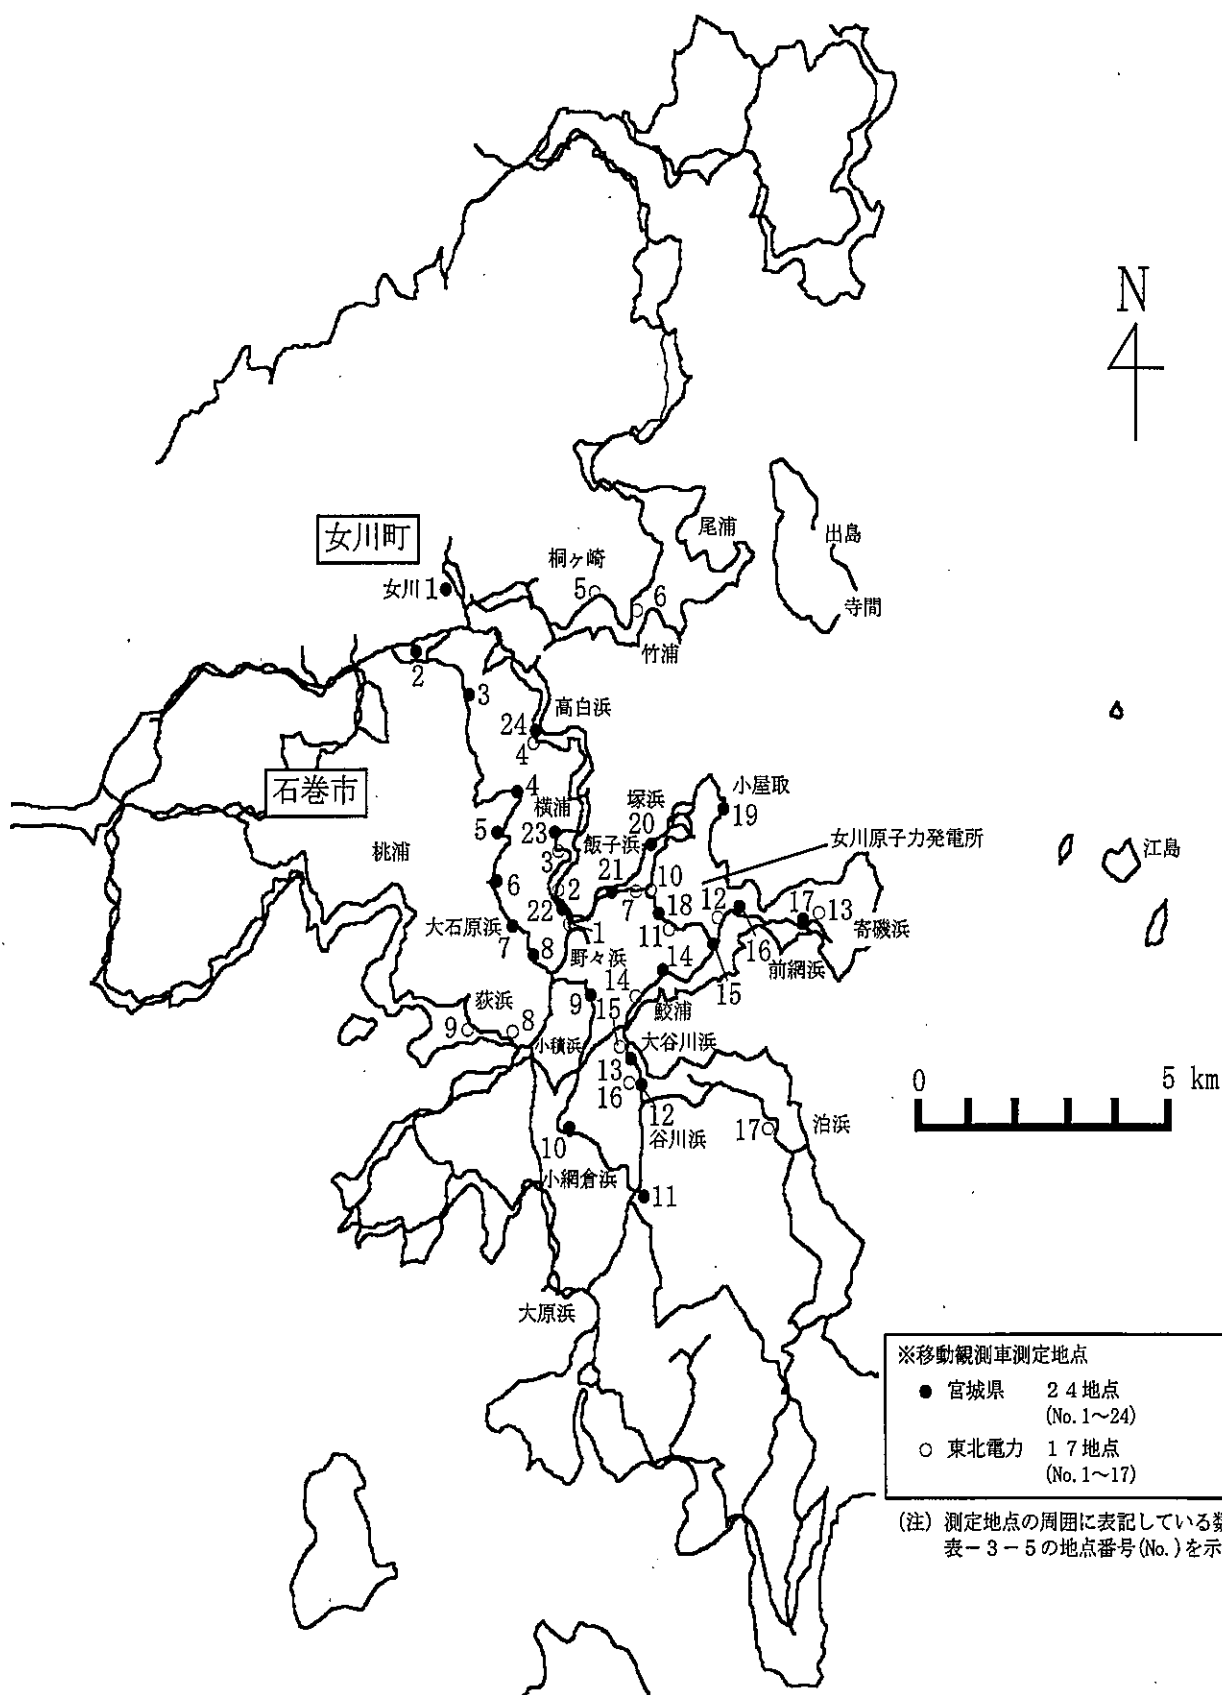


図-1-2 移動観測車測定地点

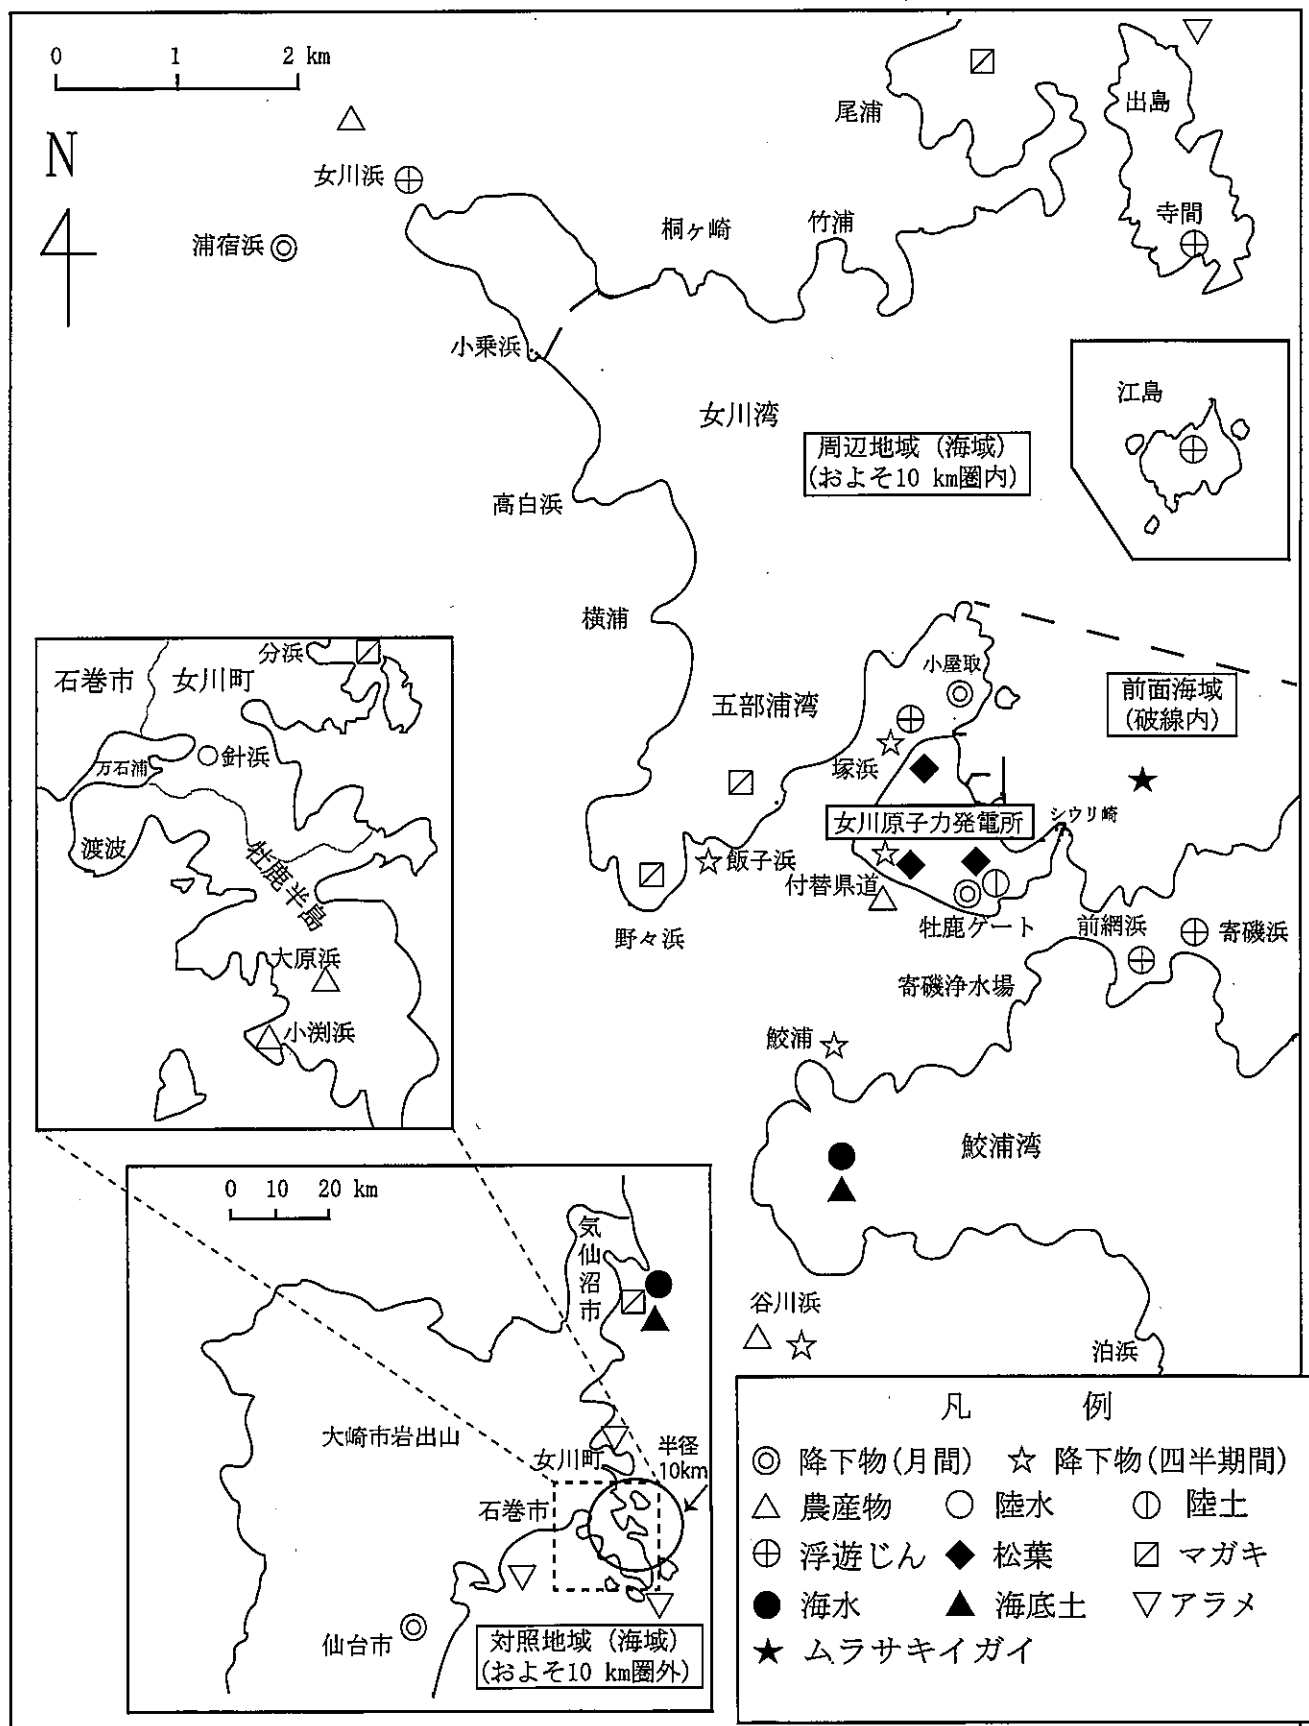


図-1-3 環境試料採取地点 (1)

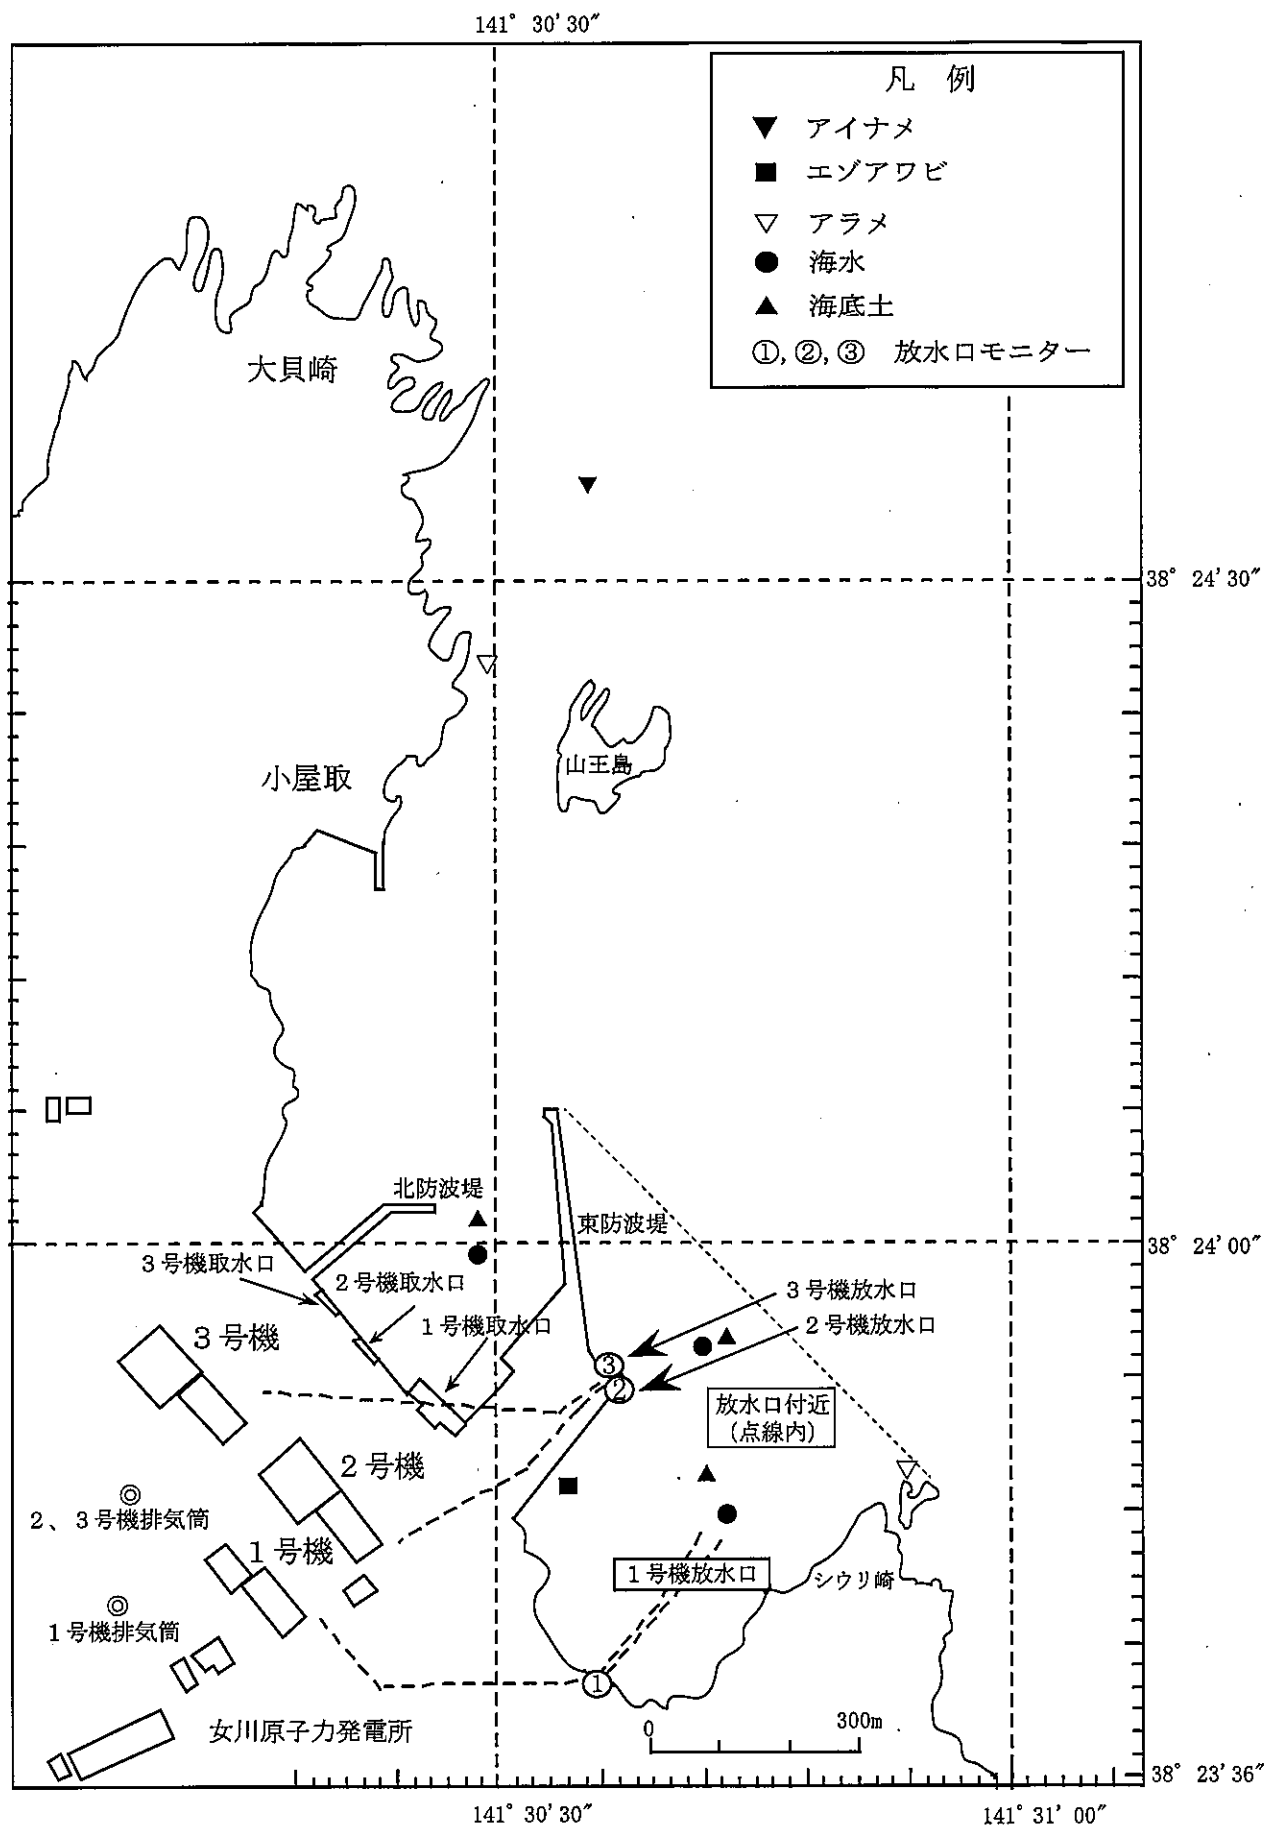


図-1-4 環境試料採取地点 (2)

2 測定方法及び測定機器等

(1) 測定方法及び測定機器

ア 環境試料の採取

「環境試料採取法（昭和58年文部科学省）」による。

イ 大気浮遊じんの採取

調査機関	ダストサンプラー型式	流 量
宮 城 県	応用光研工業 S-2766 (女川局) 日立アロカメディカル DSM-R41-22843 (寄磯局)	約30 L/分
東北電力(株)	日立アロカメディカル DSM-RC41-20392	約150 L/分

ウ モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の測定

調査機関	測 定 方 法	測 定 器
宮 城 県	① NaI(Tl) 検出器	NaI(Tl) 検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない 検出器： 日立製作所 ADP-1132UR1型 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器（恒温装置付） スペクトロメータ： 日立製作所 ASM-1465型
	② 電離箱 検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法 検出器： 日立製作所 RIC338型 Arガス封入球形加圧電離箱検出器（有効容積 約14L、ステンレス製）（寄磯局以外） アロカ RIC348型 Ar及びN ₂ ガス封入球形加圧電離箱検出器（有効容積 約14L、アルミ合金製）（寄磯局）
	③ データ 収 集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集
東北電力(株)	① NaI(Tl) 検出器	NaI(Tl) 検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない 検出器： アロカ ADP-1132UR1型 3"φ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器（恒温装置付） スペクトロメータ： アロカ ASM-RC41型
	② 電離箱 検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法 検出器： アロカ RIC338型 Arガス封入球形加圧電離箱検出器（有効容量 約14L、ステンレス製）
	③ データ 収 集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集

(参考) 広域モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の測定

調査機関	測定方法		測定器
宮城県	① 電離箱検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法	検出器： 富士電機 NCE207K1型 Ar 及びN ₂ ガス封入球形加圧電離箱検出器、有効容積 約14L
	② データ収集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	

エ 海水(放水)中の全ガンマ線計数率の測定

調査機関	測定方法		測定器
東北電力㈱	① NaI(Tl)検出器	1号機 放水路内に設置した検出器で、海水(放水)の全ガンマ線計数率を連続的に測定する方法 2、3号機 放水路から陸上に設置した遮へい容器に海水(放水)を汲み上げ、検出器で全ガンマ線計数率を連続的に測定する方法	1号機：日立製作所 2"φ×2"NaI(Tl)シンチレーション検出器 2号機：アロカ 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器 3号機：アロカ 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器
	② データ収集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	

オ 大気中の放射性物質の濃度の測定

調査機関	測定方法		測定器
宮城県	① ダストモニタ	大気浮遊じんを連続採取し、全アルファ放射能濃度と全ベータ放射能濃度を連続測定する方法	検出器：アロカ MDR-3000型 全アルファ放射能濃度： ZnS(Ag)シンチレーション検出器 全ベータ放射能濃度： プラスチックシンチレーション検出器
	② データ収集	テレメータシステムによる1時間ごとのデータ収集	

カ 空間ガンマ線積算線量の測定

調査機関	測定方法	測定器	読み取り装置の校正
宮城県	各地点(モニタリングポイント及びモニタリングステーション)に3本(3素子)の蛍光ガラス線量計(RPLD)素子を配置し、3か月間の積算線量を測定する方法	AGCテクノガラス FGD252	Cs-137(3.7GBq)標準照射装置による。
東北電力㈱	測定値は90日換算値で表す	AGCテクノガラス FGD-202S	Cs-137(18.5GBq)標準照射装置による。

キ 移動観測車による空間ガンマ線量率の測定

調査機関	測定方法	測定器
宮城県	NaI(Tl) 検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E) 関数法で処理し、吸収線量率を測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない。	検出器： アロカ ADP-1132 UR1型 3"φ×3" NaI(Tl) シンチレーション検出器、温度補償型 スペクトロメータ： アロカ ASM-1465型
東北電力(株)		検出器： 日立製作所 ADP-1132型 3"φ×3" NaI(Tl) シンチレーション検出器、温度補償型 スペクトロメータ： 日立製作所 ASM-1306型

ク ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

① 測定方法

「ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー（令和2年4訂 原子力規制庁）」による。

測定試料	試料形態	測定供試料量 ^{*1}	計測時間	報告単位
農産物	灰化物	灰 20g以上	30000～ 80000秒	Bq/kg生
陸水	蒸発濃縮物	10L以上		mBq/L
陸土	乾土	乾土 100g程度		Bq/kg乾土
浮遊じん	宮城県：ろ紙 HE-40T、CP-20 東北電力：ろ紙 HE-40T 灰化	1000m ³ 以上		mBq/m ³
降下物	月間 蒸発濃縮物	0.5m ² 以上		Bq/m ²
	四半期間 蒸発濃縮物	0.166m ² 以上		
指標植物	灰化物	灰 20g以上		Bq/kg生
魚介藻類	灰化物	灰 20g以上		Bq/kg生
海水	共沈法：AMP-MnO ₂ 共沈物	20L以上		mBq/L
	迅速法：未処理海水 ^{*2}	2L		mBq/L
海底土	乾土	乾土 100g程度		Bq/kg乾土
指標海産物	灰化法：灰化物	灰 20g以上		Bq/kg生
	迅速法：生または乾燥物 ^{*3}	生 1kg相当以上		

*1 降下物の測定供試料量の欄は、試料採取容器の開口部面積を表す。

*2 I(ヨウ素)-131も測定対象とするため。

*3 I-131を測定対象とするため。対象はアラメ及びエゾノネジモクのみ。

② 測定器

調査機関	測定器
宮城県	オルテック 高純度Ge半導体検出器 (相対効率* 28%、31%)
	セイコー E G & G MCA-7a型多重波高分析装置
東北電力(株)	シオテク/ロゼス・キャンバ GC3518型高純度Ge半導体検出器 (相対効率* 39%、40% 2台)
	シオテク/ロゼス・キャンバ LYNX-MCA型多重波高分析装置

* 相対効率とは、距離25cmにおけるCo-60の1.33MeVガンマ線に対する3"φ×3"NaI(Tl)の効率に対する相対値を表す。

ケ ストロンチウム-90の分析

調査機関	分 析 方 法	測 定 器
宮 城 県	「放射性ストロンチウム分析法(令和7年5訂 原子力規制庁)」による。	低バックグラウンド放射能自動測定装置 アロカ LBC-5102
東北電力㈱		低バックグラウンド放射能自動測定装置 日立アロカメディカル LBC-4601

コ トリチウムの分析

調査機関	分 析 方 法	測 定 器
宮 城 県	「トリチウム分析法(令和5年3訂 原子力規制庁)」による。	低バックグラウンド液体シンチレーション カウンター 日立アロカメディカル LSC-LB 7
東北電力㈱		低バックグラウンド液体シンチレーション カウンター 日立製作所 LSC-LB 7

サ 気象観測

調査機関	観 測 方 法	観 測 装 置
宮 城 県	主に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(平成13年一部改訂 原子力安全委員会)」による。	風向風速計 ANEOS (株) WS-BN6型 雨雪量計 ANEOS (株) RS-A52型 感雨雪計 ANEOS (株) NS-131型 温 度 計 ANEOS (株) TS-3D1型 日 射 計 ANEOS (株) MS-60C型 放射収支計 ANEOS (株) MF-11型 土壌水分計 ANEOS (株) DIK-321B-BS2型
東北電力㈱		風向風速計 ANEOS (株) WS-BN6型 雨雪量計 ANEOS (株) RS-A52型 感雨雪計 ANEOS (株) NS-131型

(参考) 広域モニタリングステーションの気象観測

調査機関	観 測 方 法	観 測 装 置
宮 城 県	主に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(平成13年一部改訂 原子力安全委員会)」による。	風向風速計 ANEOS (株) WS-BN6型 雨雪量計 ANEOS (株) RS-A52型 感雨雪計 ANEOS (株) NS-131型

(2) 検出下限値、数値及びトレンドグラフの表し方

ア 検出下限値

- ① ゲルマニウム半導体検出器による分析
検出下限値は、試料の測定値（正味計数）の統計誤差（計数誤差）の3倍とする。
- ② Sr（ストロンチウム）-90及びH-3（トリチウム）の分析
検出下限値は、試料の測定値の統計誤差の3倍とする。

イ 数値の表し方

本報告書では、測定結果は以下の規定に従って表示する。数値の丸め方は、表示数値を（n）桁とする場合、（n+1）桁まで計算し（n+1）桁目を四捨五入する。

① 環境放射線

- (ア) RPLDによる90日または365日間の空間ガンマ線積算線量のデータは、ミリグレイ単位で小数点以下2桁目まで表示する。
- (イ) 空間ガンマ線量率のデータは、ナノグレイ毎時単位で小数点以下1桁目まで表示する。
- (ウ) 降水量は、最少計量単位である0.5mm以上の降水（雨雪）量を表示する。
- (エ) 感雨は、感雨（雪）のないときは「」（空白）とし、感雨（雪）があったときは「○」（まる）を表示する。
- (オ) 測定対象外の項目は「/」（斜線）、欠測した時は「-」（ハイフン）とする。

② 環境放射能

- (ア) データはすべて統計誤差（ 1σ ）を併記する。
- (イ) 測定値の表示桁数は2桁とし、統計誤差は測定値の最下位桁まで表示する（例1、2）。
(例1) $69.07 \pm 14.32 \rightarrow 69 \pm 14$
(例2) $69.07 \pm 1.432 \rightarrow 69 \pm 1$
- (ウ) 測定値の最上位桁に比べて統計誤差の最上位桁が3桁目以下の場合、測定値は統計誤差の最上位桁と同じ位まで表示し、統計誤差は、最上位桁のみを表示する（例3、4）。
ただし、統計誤差を丸めた結果、位が上がり桁数が増えた場合は、統計誤差を2桁表示する（例5）。
(例3) $69.07 \pm 0.1432 \rightarrow 69.1 \pm 0.1$
(例4) $69.07 \pm 0.01432 \rightarrow 69.07 \pm 0.01$
(例5) $69.07 \pm 0.964 \rightarrow 69.1 \pm 1.0$
- (エ) 測定対象外の項目は「/」（斜線）、欠測した項目は「」（空白）とする。
- (オ) 測定結果が検出下限値よりも小さいものは「ND」（Not Detected）とする。
ただし、ゲルマニウム半導体検出器による核種分析結果においては、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。
- (カ) 測定時間はライブタイムで表示し、単位は「秒」とする。
- (キ) 陸土の分析結果の換算係数は、Bq/kg乾土からBq/m²への乗数を表す。

③ 海水放射線

単位はcpmとし、整数値で表す。

ウ 放射性物質の降下量及び環境試料の放射性核種濃度のトレンドグラフの表し方

福島第一原発事故前後の長期的な推移を視覚的に把握するため、事故前及び事故後に検出下限値以上の値が確認された試料に対してトレンドグラフを作成し、検出下限値未満又は欠測の場合はグラフに表示しない。

3 測定結果

(1) モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率測定結果

表-3-1-1

10月における空間ガンマ線量率測定結果 (1)

単位: nGy/h

局 項目 日	女 川							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	47.0	30.7	27.2	83.2	68.0	63.2	10.5	○
2	28.4	27.4	26.6	67.3	65.2	63.6		
3	29.3	28.2	27.3	67.9	65.4	62.8		
4	29.6	28.4	27.4	68.1	65.8	63.2		○
5	48.6	29.1	26.5	84.7	66.9	63.1	3.5	○
6	45.7	30.6	27.2	82.7	68.2	62.9	8.5	○
7	28.2	27.6	27.1	67.0	64.8	62.7		○
8	29.1	27.8	27.0	67.6	65.5	62.5		○
9	29.6	28.7	27.5	68.4	66.1	63.6		○
10	30.6	29.2	28.2	68.7	66.6	64.7		
11	61.3	38.4	28.5	95.2	74.5	64.0	35.5	○
12	48.1	32.6	26.9	83.4	70.1	63.9	10.0	○
13	36.3	29.2	27.3	73.3	66.9	64.3	0.5	○
14	28.7	28.0	27.3	68.1	65.5	63.8		○
15	29.0	28.4	27.7	68.4	65.7	63.6		
16	52.5	36.1	28.1	89.0	72.7	64.4	66.0	○
17	33.4	28.7	26.8	70.7	66.0	62.6	3.0	○
18	30.4	27.8	26.8	68.9	65.5	62.3		○
19	29.4	28.3	27.5	67.7	65.5	63.7		
20	32.4	28.8	27.8	70.4	66.2	63.5		○
21	29.6	28.4	27.3	68.6	65.4	63.2		
22	29.9	28.9	27.9	67.8	65.7	63.5		
23	29.6	28.8	27.9	67.9	65.8	63.9		
24	30.1	28.8	27.8	68.0	66.1	63.7		○
25	41.0	30.9	27.7	77.0	67.9	64.1	15.0	○
26	36.1	32.0	27.9	73.4	69.5	65.2	25.5	○
27	32.1	27.8	26.5	70.6	66.2	63.5		○
28	31.8	28.6	27.2	72.0	66.3	63.5		○
29	29.4	28.3	27.1	-	-	-		
30	30.3	28.8	26.4	-	-	-		
31	41.7	31.1	27.2	-	-	-	67.5	○
月 間	61.3	29.6	26.4	95.2	66.9	62.3	245.5	
標 準 偏 差	4.1			3.9				
欠測率 (%)	0.0			8.4				

-: 有効データ数が1日の半数に満たないこと(日欠測)を示す。

(注) 10月29日～31日の日欠測は検出器内の異常な放電に伴う故障によるものである。
令和7年度

表-3-1-1

10月における空間ガンマ線量率測定結果 (2)

単位: nGy/h

局 項目 日	飯子浜							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最大	平均	最小	最大	平均	最小		
1	55.3	44.1	41.3	96.0	84.0	78.5		
2	42.7	41.8	41.0	84.1	81.8	79.1		
3	43.3	42.4	41.6	84.7	81.8	79.3		
4	43.6	42.5	41.2	85.8	82.3	79.2		
5	51.0	42.3	41.0	89.7	82.3	78.9		
6	62.7	46.2	41.3	101.3	86.0	79.7		
7	42.4	41.7	41.0	84.2	81.4	78.9		
8	42.6	41.8	41.0	85.4	81.9	77.6		
9	44.3	43.0	41.8	86.3	82.8	80.1		
10	43.7	43.0	41.8	85.7	82.7	79.0		
11	76.9	51.9	41.9	116.1	91.1	79.0		
12	62.7	45.7	40.7	102.6	85.6	78.7		
13	53.0	43.9	41.4	92.4	83.9	78.2		
14	42.8	42.0	41.3	84.8	81.7	79.0		
15	42.9	42.1	41.3	84.4	81.9	78.1		
16	70.0	50.8	41.5	108.8	89.9	78.6		
17	45.8	42.1	40.4	87.7	82.0	78.3		
18	46.2	41.8	40.6	87.1	81.6	78.1		
19	43.2	42.3	41.2	84.7	81.9	79.2		
20	49.8	43.2	41.9	90.4	82.7	79.8		
21	43.3	42.2	41.3	84.8	81.4	78.2		
22	42.9	42.2	41.4	85.4	81.4	79.0		
23	42.9	42.3	41.3	86.5	81.6	77.9		
24	43.4	42.4	41.6	84.7	82.1	79.0		
25	53.5	44.5	41.4	92.9	84.0	78.8		
26	49.8	45.1	41.9	89.9	85.1	80.5		
27	44.8	41.8	40.7	86.0	82.6	79.4		
28	45.0	42.5	41.0	86.4	82.7	79.3		
29	42.8	42.0	41.2	85.7	81.6	79.2		
30	42.8	42.0	41.4	84.7	81.4	78.7		
31	55.9	44.6	41.2	98.2	84.4	79.5		
月 間	76.9	43.4	40.4	116.1	83.2	77.6		
標準偏差	4.2			4.1				
欠測率 (%)	1.6			1.6				

令和7年度

表-3-1-1

10 月における空間ガンマ線量率測定結果 (3)

単位: nGy/h

局 項目 日	小 屋 取							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	61.0	47.7	44.8	96.6	83.6	79.0	8.5	○
2	46.0	45.3	44.6	85.0	81.5	78.8		
3	46.8	46.0	44.7	84.6	81.8	78.8		
4	47.2	46.2	45.4	85.2	82.0	78.9		○
5	53.4	46.2	44.9	90.2	82.5	79.2	0.5	○
6	62.8	48.5	44.8	98.5	84.6	79.2	11.5	○
7	47.0	45.5	44.8	84.8	81.3	78.8		○
8	46.5	45.7	44.9	84.9	81.9	79.4		○
9	47.7	46.6	45.2	87.4	82.5	79.5		○
10	47.6	46.7	45.8	86.1	82.6	79.0		
11	78.3	55.1	45.7	111.0	90.1	78.7	39.0	○
12	63.7	48.7	44.5	99.9	85.0	79.5	6.5	○
13	56.9	47.6	44.9	93.0	84.0	78.2	1.0	○
14	46.2	45.4	44.6	85.2	81.4	78.6		○
15	46.3	45.5	44.9	84.1	81.5	78.3		
16	73.9	53.8	44.7	108.5	89.1	79.0	77.5	○
17	50.3	45.5	43.0	86.8	81.4	77.1	2.5	○
18	49.7	45.3	43.7	87.5	81.7	77.9		○
19	46.6	45.7	44.6	84.7	81.9	79.1		
20	54.0	46.3	44.6	90.0	82.3	79.5		○
21	46.3	45.3	44.4	85.2	81.1	78.3		
22	45.9	45.2	44.2	84.8	81.1	77.0		
23	47.1	45.9	44.4	85.0	81.6	77.9		
24	47.6	46.6	45.8	86.4	82.7	80.3		○
25	56.6	49.2	46.4	93.9	85.2	80.4	16.0	○
26	53.6	49.2	46.2	90.7	86.0	81.4	21.0	○
27	47.8	45.5	44.4	85.7	82.9	79.0		○
28	49.2	46.2	44.9	86.2	83.1	80.4		○
29	46.4	45.7	44.7	84.6	81.9	79.5		
30	46.4	45.8	44.8	84.4	81.8	79.1		
31	58.1	48.3	45.3	93.8	84.4	80.1	59.5	○
月 間	78.3	47.0	43.0	111.0	83.1	77.0	243.5	
標 準 偏 差	3.9			3.8				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-1

10月における空間ガンマ線量率測定結果 (4)

単位: nGy/h

局 項目 日	寄 磯							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	42.7	36.2	34.1	83.7	76.8	73.3	2.0	○
2	35.6	34.8	33.9	78.2	75.6	73.3		
3	36.7	35.5	34.7	78.5	75.7	73.5		
4	36.8	35.6	34.5	78.8	75.9	73.1		○
5	40.7	35.0	33.8	83.0	75.8	72.4		○
6	49.6	37.3	34.1	89.8	77.7	72.2	7.0	○
7	35.8	34.8	34.2	77.6	74.8	72.0		○
8	35.9	35.0	34.1	78.5	75.7	72.9		○
9	36.8	35.9	34.8	79.0	76.3	74.0		○
10	36.9	36.1	35.2	80.4	76.4	73.3		○
11	64.8	43.6	34.8	102.9	83.7	73.1	35.0	○
12	52.2	38.0	33.8	93.3	78.9	72.7	8.5	○
13	44.5	37.0	34.4	85.5	77.7	73.3	1.0	○
14	35.7	34.8	34.0	78.0	75.3	73.0		○
15	35.8	35.1	34.1	78.2	75.3	72.5		
16	61.2	42.9	34.5	100.6	83.0	71.8	57.5	○
17	40.0	35.1	33.4	83.2	75.7	72.0	1.5	○
18	38.7	34.8	33.6	80.3	75.4	72.4		○
19	36.2	35.2	34.2	78.5	75.6	73.0		○
20	48.8	36.2	34.6	88.6	76.8	73.3		○
21	35.8	35.1	34.3	78.4	75.1	72.7		
22	35.8	35.1	34.4	77.6	75.2	72.2		
23	36.2	35.2	34.2	78.1	75.4	72.0		
24	36.2	35.2	34.3	78.4	75.5	73.0		
25	44.9	37.4	34.3	87.3	77.7	72.8	15.0	○
26	43.2	38.1	34.9	83.9	79.0	74.7	22.5	○
27	37.1	34.7	33.6	79.3	76.2	72.8		○
28	37.5	35.2	34.2	79.7	76.3	71.9		○
29	35.7	34.8	33.9	78.3	75.2	73.1		
30	35.8	34.9	34.2	78.3	75.0	71.5		
31	46.3	37.1	33.4	88.0	77.7	73.3	55.5	○
月 間	64.8	36.2	33.4	102.9	76.7	71.5	205.5	
標 準 偏 差	3.6			3.6				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-1

10月における空間ガンマ線量率測定結果 (5)

単位: nGy/h

局 項目 日	鮫 浦							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	64.2	52.9	50.0	111.0	99.7	94.3	6.0	○
2	51.5	50.7	49.8	101.8	97.8	94.2		
3	52.0	51.2	50.3	101.9	97.9	94.3		
4	52.8	51.4	50.4	101.9	98.0	94.1		○
5	61.1	51.2	49.6	107.0	98.5	95.0	0.5	○
6	78.7	55.8	49.8	124.7	102.6	94.4	13.5	○
7	51.5	50.5	49.9	101.0	97.0	94.2		○
8	51.8	50.8	49.7	101.5	97.6	94.5		○
9	52.6	51.5	50.4	101.9	98.3	93.8		○
10	53.1	51.9	51.1	102.1	98.5	95.2		
11	86.9	61.2	50.6	131.4	106.7	95.2	37.5	○
12	72.7	54.4	49.2	117.9	101.2	94.5	9.0	○
13	60.7	52.8	49.8	107.9	99.6	95.2	0.5	○
14	51.3	50.6	49.8	101.3	97.5	93.9		○
15	51.8	50.8	50.0	101.7	97.4	94.2		
16	85.3	61.0	50.3	131.3	106.7	94.1	79.5	○
17	58.5	51.4	49.3	106.0	98.2	93.9	3.0	○
18	55.6	50.6	49.3	103.5	97.9	92.7	0.5	○
19	51.9	50.9	49.9	101.7	97.8	94.1		
20	62.7	51.8	50.1	108.1	98.4	94.5		○
21	51.7	50.9	50.2	100.5	97.1	93.7		
22	52.0	50.9	50.1	100.3	96.9	93.2		
23	51.8	51.0	50.3	100.1	97.3	94.2		
24	52.4	51.3	50.2	102.4	97.6	94.0		
25	62.1	53.5	50.4	108.4	99.9	94.5	14.5	○
26	59.2	54.4	50.4	106.9	101.3	94.1	23.0	○
27	53.6	50.6	49.4	101.7	98.1	93.8		○
28	55.3	51.4	49.7	101.9	98.3	94.3		○
29	51.5	50.8	50.2	100.5	97.2	93.7		
30	51.8	50.7	49.6	99.9	97.1	94.1		
31	63.0	53.2	49.9	110.4	99.8	94.6	57.5	○
月 間	86.9	52.3	49.2	131.4	99.0	92.7	245.0	
標 準 偏 差	4.6			4.4				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-1

10月における空間ガンマ線量率測定結果 (6)

単位: nGy/h

局 項目 日	谷 川							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	65.1	51.0	47.9	95.8	83.2	79.1		
2	49.6	48.5	47.5	83.7	81.1	78.8		
3	50.0	49.1	48.3	83.5	81.2	79.2		
4	50.9	49.3	48.0	84.0	81.4	78.8		
5	58.5	49.6	47.6	91.6	82.2	79.7		
6	69.2	52.6	47.9	99.4	84.6	78.7		
7	49.0	48.3	47.4	82.6	80.3	78.6		
8	49.8	48.8	48.0	83.5	81.2	78.2		
9	51.0	49.8	48.3	84.1	82.0	79.4		
10	50.5	49.7	49.0	84.3	81.9	80.0		
11	80.6	58.8	48.8	110.4	89.9	79.9		
12	72.7	52.4	47.0	102.6	84.7	79.3		
13	60.1	50.7	47.7	92.2	83.0	79.2		
14	49.5	48.4	47.7	82.6	80.7	78.6		
15	49.4	48.6	47.7	83.3	80.8	78.5		
16	73.6	56.3	47.8	102.9	87.9	78.9		
17	56.1	48.9	46.6	87.9	81.1	77.3		
18	50.3	47.8	47.0	83.3	80.3	78.3		
19	49.5	48.5	47.6	83.0	80.7	78.7		
20	60.7	49.5	47.7	92.4	81.7	78.7		
21	49.6	48.6	47.7	82.3	80.4	78.4		
22	49.6	48.8	48.0	82.6	80.3	77.9		
23	49.7	48.9	48.1	82.9	80.8	78.8		
24	49.9	49.0	47.8	82.8	81.0	78.8		
25	59.4	51.1	48.1	90.7	82.9	78.4		
26	55.8	51.9	48.3	89.5	84.4	80.3		
27	51.2	47.8	46.6	84.3	81.3	79.2		
28	49.5	48.5	47.4	84.1	81.1	79.0		
29	49.3	48.5	47.6	83.3	80.4	78.1		
30	49.6	48.7	47.8	83.1	80.4	78.3		
31	63.3	51.6	47.8	95.6	83.5	79.1		
月 間	80.6	50.0	46.6	110.4	82.1	77.3		
標 準 偏 差	4.1			3.8				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-1

10月における空間ガンマ線量率測定結果 (7)

単位: nGy/h

局 項目 日	荻 浜							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	71.8	57.2	54.1	104.0	90.3	85.8	12.0	○
2	55.5	54.5	53.6	90.2	87.6	85.4		○
3	55.9	55.1	54.2	90.5	87.9	85.8		
4	56.1	55.2	54.1	91.1	88.1	85.6		○
5	65.9	55.6	54.1	100.4	88.9	85.6	0.5	○
6	77.4	58.3	53.7	109.5	91.2	85.6	12.0	○
7	55.4	54.5	53.6	89.5	87.1	84.8		○
8	55.6	54.9	53.8	90.4	88.0	85.5		○
9	56.4	55.5	54.6	91.4	88.4	85.9		○
10	56.7	55.7	54.6	91.2	88.5	85.5		
11	82.3	63.7	54.6	112.9	96.0	86.8	32.5	○
12	75.2	58.3	53.1	105.9	91.6	86.2	8.0	○
13	62.3	56.3	54.1	96.8	89.6	86.0	0.5	○
14	55.3	54.6	54.0	90.4	87.6	85.4		○
15	55.5	54.8	53.9	89.7	87.6	85.6		
16	77.5	61.4	54.0	110.4	94.1	85.8	52.5	○
17	58.9	54.8	53.3	92.8	87.7	84.9	2.5	○
18	58.3	54.5	53.0	92.5	87.6	84.3		○
19	55.6	54.7	53.6	89.7	87.7	84.9		
20	58.7	55.3	54.2	93.3	88.3	85.8		○
21	55.5	54.8	53.2	89.4	87.4	85.3		
22	55.7	54.8	53.8	89.9	87.4	85.2		
23	55.8	54.9	53.8	89.6	87.6	85.5		
24	56.1	55.1	54.0	89.6	87.7	85.4		
25	65.2	57.2	54.3	98.2	90.0	85.8	14.5	○
26	61.7	57.6	53.7	95.7	91.2	86.8	22.5	○
27	57.8	54.1	52.9	92.4	88.3	85.7		○
28	60.2	55.1	53.3	94.5	88.4	85.5		○
29	55.5	54.5	53.7	89.4	87.3	84.5		
30	56.3	54.7	53.8	90.2	87.4	84.9		
31	65.6	56.8	53.8	99.5	89.8	84.9	59.0	○
月 間	82.3	56.0	52.9	112.9	88.9	84.3	216.5	
標 準 偏 差	3.6			3.5				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-1

10月における空間ガンマ線量率測定結果(8)

単位: nGy/h

局 項目 日	塚 浜							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	64.1	49.5	46.5	92.9	79.0	75.4		
2	47.5	46.8	46.0	78.1	76.5	75.2		
3	48.3	47.4	46.8	78.0	76.6	75.2		
4	49.0	47.6	46.4	78.7	76.9	75.0		
5	56.5	47.4	46.3	85.7	77.2	75.3		
6	67.6	50.6	46.4	96.9	80.0	74.8		
7	47.8	46.8	46.2	77.4	76.0	74.1		
8	47.7	47.1	46.3	78.4	76.6	74.7		
9	48.7	47.9	47.1	78.7	77.4	75.8		
10	48.6	48.1	47.5	79.0	77.5	76.1		
11	84.0	57.4	47.0	111.2	86.3	75.9		
12	66.9	50.6	45.8	94.7	80.4	75.5		
13	60.7	49.1	46.2	89.8	78.9	75.3		
14	47.2	46.8	46.3	77.9	76.4	74.7		
15	47.5	47.0	46.3	78.1	76.6	75.1		
16	80.9	56.8	46.8	108.6	86.0	75.7		
17	52.3	47.1	45.5	81.9	76.7	74.4		
18	51.6	46.8	45.6	81.0	76.7	74.3		
19	48.0	47.2	46.4	78.4	76.8	74.8		
20	55.8	47.9	46.7	84.5	77.4	75.4		
21	47.9	47.2	46.6	78.4	76.3	75.0		
22	47.9	47.3	46.5	77.5	76.2	74.8		
23	48.1	47.4	46.8	78.0	76.5	75.1		
24	48.4	47.5	46.8	78.7	76.8	75.4		
25	59.6	50.0	46.9	88.3	79.0	75.4		
26	55.8	50.4	46.7	84.9	80.2	76.3		
27	49.9	46.8	45.8	80.0	77.5	76.2		
28	50.8	47.7	46.5	80.8	77.6	75.7		
29	47.7	47.0	46.5	77.5	76.2	74.8		
30	47.7	47.1	46.5	77.8	76.3	75.0		
31	62.8	49.7	46.4	91.8	79.1	74.0		
月 間	84.0	48.5	45.5	111.2	78.0	74.0		
標 準 偏 差	4.5			4.3				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-1

10月における空間ガンマ線量率測定結果(9)

単位: nGy/h

局 項目 日	寺 間							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	48.7	39.4	36.7	82.2	73.4	69.7	6.5	○
2	37.9	37.2	36.7	73.0	71.4	69.7		
3	38.6	37.8	37.3	73.1	71.5	69.8		
4	39.1	37.8	36.8	73.6	71.7	69.9		○
5	56.3	38.4	36.6	88.9	72.5	69.5	4.5	○
6	59.6	41.1	36.8	91.1	74.8	69.9	16.0	○
7	37.6	37.1	36.7	72.3	70.6	69.1		○
8	39.8	37.5	36.8	73.6	71.4	69.6		○
9	39.3	38.4	37.2	73.9	72.3	70.6		○
10	39.2	38.5	37.8	74.0	72.2	70.8		
11	72.3	47.7	37.6	103.9	80.6	70.8	41.0	○
12	60.1	41.6	36.4	92.7	75.3	69.7	9.5	○
13	47.5	39.4	37.0	82.1	73.5	69.8	1.0	○
14	37.9	37.4	36.7	73.0	71.0	69.4		○
15	38.2	37.5	36.7	72.8	71.3	69.8		
16	67.9	47.1	37.0	99.5	80.2	69.9	68.0	○
17	44.5	38.1	36.1	78.4	71.8	68.8	4.0	○
18	42.3	37.5	36.2	76.7	71.4	69.1		○
19	38.6	37.9	37.0	73.4	71.5	69.8		○
20	48.0	38.5	37.3	80.3	72.1	69.7	0.5	○
21	38.3	37.7	37.0	73.1	70.9	69.7		
22	38.2	37.7	37.1	72.3	70.8	69.0		
23	38.3	37.8	37.2	72.6	71.0	69.4		
24	39.9	37.9	37.1	73.6	71.3	69.6		○
25	49.6	40.2	36.9	82.8	73.5	69.0	17.0	○
26	47.4	41.4	37.3	81.9	75.5	70.6	25.0	○
27	40.6	37.2	36.2	75.0	72.1	70.1	0.5	○
28	42.1	38.3	37.0	76.4	72.4	70.0		○
29	38.5	37.6	36.9	72.3	70.9	69.6		
30	38.1	37.5	36.9	72.5	70.8	69.2		
31	50.1	39.9	36.5	84.2	73.4	69.1	50.0	○
月 間	72.3	39.0	36.1	103.9	72.7	68.8	243.5	
標 準 偏 差	4.4			4.2				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-1

10月における空間ガンマ線量率測定結果(10)

単位: nGy/h

局 項目 日	江 島							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	38.4	33.3	31.8	68.3	63.6	61.0	1.0	○
2	33.2	32.4	31.6	64.3	62.8	60.9		
3	33.5	32.8	32.1	64.3	62.7	61.6		
4	34.5	32.8	31.7	65.0	62.8	61.0		○
5	38.6	32.2	31.3	69.5	62.8	60.8		○
6	54.5	35.4	31.6	83.2	65.5	61.1	9.0	○
7	32.8	32.2	31.8	63.5	62.0	60.6		
8	33.2	32.3	31.5	64.3	62.6	61.2		○
9	36.7	33.6	32.6	66.0	63.6	61.9		○
10	34.1	33.3	32.5	64.9	63.3	61.8		○
11	61.8	41.4	32.5	91.0	70.5	61.7	36.5	○
12	51.0	35.7	31.2	80.3	66.0	61.3	8.0	○
13	44.0	35.1	32.0	73.1	65.3	61.3	1.5	○
14	33.2	32.4	31.7	64.4	62.5	61.2		○
15	33.6	32.6	31.7	64.2	62.5	61.0		○
16	54.9	39.8	32.1	83.6	69.3	61.7	52.5	○
17	42.1	33.2	31.0	71.5	63.1	60.0	3.0	○
18	38.6	32.5	31.2	68.4	62.8	60.1	0.5	○
19	33.8	32.9	32.3	64.4	62.9	61.6		
20	45.4	33.9	32.4	74.6	63.8	61.2	0.5	○
21	33.4	32.8	32.0	63.4	62.3	61.0		
22	33.4	32.7	32.0	63.4	62.2	60.7		
23	33.7	32.9	32.0	64.5	62.5	61.0		
24	33.8	33.0	32.2	64.1	62.6	61.2		○
25	45.1	35.1	31.9	74.3	64.7	61.3	14.0	○
26	41.1	35.9	32.3	70.9	66.1	62.5	19.5	○
27	37.0	32.6	31.6	67.8	63.6	62.0	0.5	○
28	37.7	33.5	32.4	68.3	63.7	61.8		○
29	33.2	32.7	32.3	63.5	62.4	61.2		
30	33.5	32.7	32.1	63.8	62.4	60.9		
31	43.2	34.6	31.7	73.2	64.5	60.8	47.5	○
月 間	61.8	33.8	31.0	91.0	63.8	60.0	194.0	
標 準 偏 差	3.7			3.4				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-1 10月における空間ガンマ線量率測定結果(11)
単位: nGy/h

単位: mSv/h

局 項目 日	前 網							降水量 (mm)	感 雨 有無
	NaI(Tl)			電 離 箱					
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小			
1	59.6	54.0	51.9	88.6	82.6	79.8			
2	53.0	52.4	51.7	82.8	81.1	79.7			
3	54.0	53.0	51.9	82.9	81.2	79.7			
4	54.1	53.2	52.3	83.0	81.6	80.1			
5	59.0	52.9	51.9	87.8	81.7	80.0			
6	67.6	55.2	52.1	96.6	83.7	79.4			
7	53.3	52.4	51.8	82.2	80.6	79.1			
8	53.4	52.7	52.0	82.9	81.3	79.8			
9	54.5	53.7	52.4	83.7	82.0	80.1			
10	54.4	53.7	53.2	83.5	82.0	80.3			
11	83.9	61.6	52.7	109.1	89.3	80.6			
12	70.8	55.3	51.2	98.3	84.0	79.1			
13	61.1	54.2	51.7	90.0	82.9	79.2			
14	52.9	52.2	51.6	82.1	80.6	79.3			
15	53.2	52.5	51.7	82.1	80.8	79.3			
16	79.5	60.9	52.1	107.0	89.1	79.7			
17	56.8	52.3	50.9	85.5	80.8	78.1			
18	56.9	52.2	50.9	85.9	80.8	78.4			
19	53.2	52.5	51.8	82.7	80.9	78.4			
20	66.1	53.6	51.9	93.3	81.9	79.5			
21	53.1	52.6	52.1	82.0	80.6	79.1			
22	53.4	52.7	52.1	82.5	80.5	79.1			
23	53.4	52.8	52.1	82.6	80.9	79.4			
24	53.9	52.9	52.2	82.7	81.0	79.3			
25	62.4	55.1	52.2	90.6	83.3	79.4			
26	59.9	55.2	52.0	88.5	84.0	79.9			
27	54.5	51.9	51.0	84.2	81.5	79.5			
28	55.6	52.8	51.9	84.4	81.6	79.5			
29	53.2	52.5	51.8	82.5	80.6	79.4			
30	53.3	52.5	51.9	82.0	80.5	79.0			
31	63.4	54.6	51.6	92.7	82.9	79.3			
月 間	83.9	53.7	50.9	109.1	82.1	78.1			
標 準 偏 差	3.7			3.6					
欠測率 (%)	0.0			0.0					

令和7年度

表-3-1-2

11 月における空間ガンマ線量率測定結果 (1)

単位: nGy/h

局 項目 日	女 川							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	44.3	30.0	26.5	-	-	-	64.0	○
2	36.9	28.6	27.3	-	-	-		○
3	33.6	28.9	27.7	-	-	-		○
4	30.0	29.0	27.8	-	-	-		
5	29.8	29.1	28.4	-	-	-		
6	30.4	29.0	27.8	-	-	-		
7	29.9	28.8	27.3	-	-	-		○
8	30.0	28.9	27.4	-	-	-		
9	32.9	29.4	28.1	-	-	-		○
10	38.1	30.4	28.2	-	-	-	2.0	○
11	30.5	29.0	27.9	-	-	-		
12	29.7	28.6	27.2	-	-	-		
13	30.4	29.2	28.2	-	-	-		
14	29.9	28.8	27.8	-	-	-		
15	30.3	29.0	27.6	-	-	-		
16	30.6	29.3	28.2	-	-	-		
17	30.2	29.4	28.1	-	-	-		○
18	31.8	29.4	28.0	-	-	-		○
19	29.4	28.3	27.3	-	-	-		○
20	30.1	29.1	28.2	-	-	-		○
21	30.2	29.3	28.3	-	-	-		○
22	30.6	28.9	27.6	-	-	-		○
23	30.5	29.7	28.9	-	-	-		○
24	30.8	29.4	28.1	-	-	-		○
25	40.4	30.4	28.5	-	-	-	1.5	○
26	30.3	29.5	28.0	-	-	-	0.5	○
27	31.0	29.2	27.6	-	-	-		○
28	31.1	29.1	27.5	-	-	-		○
29	29.8	28.2	27.4	-	-	-		
30	30.4	29.5	28.9	-	-	-		
月 間	44.3	29.2	26.5	-	-	-	68.0	
標 準 偏 差	1.4			-				
欠測率 (%)	1.8			100.0				

- : 有効データ数が1日または1月の半数に満たないこと(日または月欠測)を示す。
 (注) 月欠測及び11月1日～30日の日欠測は検出器内の異常な放電に伴う故障によるものである。

令和7年度

表-3-1-2

11 月における空間ガンマ線量率測定結果 (2)

単位: nGy/h

局 項目 日	飯 子 浜							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	57.4	43.5	40.2	99.2	84.8	80.1		
2	56.3	42.7	40.1	96.4	83.2	80.1		
3	45.6	42.2	41.3	86.7	82.6	80.1		
4	42.5	41.8	41.0	84.3	81.2	78.4		
5	42.9	42.1	41.2	84.1	81.5	78.7		
6	43.1	42.1	41.1	84.6	81.9	79.6		
7	43.1	42.2	41.1	86.0	82.0	78.8		
8	42.8	42.0	41.1	83.7	80.6	77.9		
9	44.8	42.5	41.1	86.1	81.9	78.2		
10	48.1	43.3	41.8	89.0	83.8	80.6		
11	44.5	43.0	41.5	86.3	82.9	79.0		
12	42.9	42.0	41.3	85.3	81.3	78.7		
13	43.8	42.7	41.8	85.0	82.1	79.1		
14	43.5	42.5	41.5	84.4	81.9	78.5		
15	43.5	42.4	41.4	85.3	81.6	78.9		
16	43.1	42.2	41.3	84.5	81.5	78.4		
17	44.0	42.8	41.4	85.3	82.7	79.1		
18	45.1	43.3	42.0	86.7	83.6	80.8		
19	42.8	42.1	41.4	85.5	82.1	78.7		
20	43.4	42.3	41.6	85.4	82.4	80.3		
21	43.9	42.8	42.2	86.2	83.3	79.9		
22	43.3	42.4	41.5	86.4	82.2	79.6		
23	43.7	42.9	41.9	85.9	82.6	80.1		
24	44.3	42.8	41.8	87.6	82.8	80.0		
25	52.6	43.4	41.6	93.4	83.9	80.2		
26	45.9	42.7	41.7	86.5	82.9	79.6		
27	43.8	42.5	41.5	85.6	82.6	79.1		
28	43.4	42.2	41.2	88.0	83.8	80.2		
29	42.7	41.9	41.1	85.8	82.8	79.5		
30	43.2	42.5	41.5	86.4	83.4	80.0		
月 間	57.4	42.5	40.1	99.2	82.5	77.9		
標 準 偏 差	1.3			1.9				
欠測率 (%)	1.3			0.9				

令和7年度

表-3-1-2

11 月における空間ガンマ線量率測定結果 (3)

単位: nGy/h

局 項目 日	小 屋 取							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	58.8	47.1	44.2	96.5	85.0	80.4	55.5	○
2	59.2	46.7	44.5	93.9	83.9	80.8	2.0	○
3	49.7	46.1	44.9	87.2	83.1	79.7	0.5	○
4	46.3	45.2	44.5	84.0	81.3	78.3		
5	47.0	45.5	44.4	84.0	81.5	79.0		
6	46.4	45.5	44.6	85.5	82.0	79.3		
7	47.2	46.0	45.0	85.6	82.2	78.6		○
8	47.3	46.5	45.5	89.1	82.1	79.4		
9	49.8	47.1	45.9	87.2	83.3	79.8		○
10	52.3	47.5	45.6	89.8	84.4	81.3	0.5	○
11	48.1	46.6	45.5	86.5	83.0	79.7		
12	46.9	46.0	45.0	84.2	81.8	78.8		
13	47.2	46.4	45.4	85.2	82.3	79.9		
14	47.6	46.7	45.7	86.5	82.6	79.7		
15	47.9	47.2	46.3	85.4	82.9	80.1		
16	48.1	47.2	46.2	87.0	82.8	79.9		
17	48.5	47.3	46.0	86.7	83.8	80.4		○
18	48.9	47.6	46.3	87.8	84.5	81.8		○
19	47.5	46.6	45.9	86.5	83.2	79.9		○
20	47.8	46.9	46.0	86.2	83.2	80.5		○
21	48.8	47.7	47.0	87.7	84.5	81.9		○
22	48.6	47.7	46.7	86.8	83.6	80.2		
23	48.9	48.0	47.1	86.7	84.0	81.1		
24	49.0	48.0	46.8	87.6	84.3	81.6		○
25	55.4	48.3	46.5	93.0	84.9	81.1	2.5	○
26	53.0	47.6	46.2	91.6	84.3	80.8	1.0	○
27	48.5	47.2	46.3	87.4	83.8	80.9		○
28	49.7	47.9	46.6	88.8	85.3	81.7		○
29	48.0	47.4	46.5	87.6	84.2	81.6		
30	48.6	47.9	47.0	87.4	84.7	82.1		
月 間	59.2	47.0	44.2	96.5	83.4	78.3	62.0	
標 準 偏 差	1.4			1.9				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-2 11月における空間ガンマ線量率測定結果 (4)
単位: nGy/h

局 項目 日	寄 磯							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	46.6	35.9	33.3	88.6	77.8	73.5	40.5	○
2	46.5	35.5	33.6	87.2	77.0	72.8	1.5	○
3	40.3	35.2	34.2	82.7	76.3	72.6	0.5	○
4	35.5	34.9	34.1	78.3	75.1	72.4		
5	35.9	35.0	34.3	77.6	75.3	72.5		
6	36.3	35.3	34.5	79.0	76.0	73.2		
7	35.9	35.1	34.1	79.6	75.8	72.8		
8	35.9	35.0	34.2	77.0	74.5	71.3		
9	38.4	35.5	34.5	80.0	75.9	72.3		○
10	39.6	36.1	34.9	81.1	77.4	73.9		○
11	37.4	35.9	34.7	80.3	76.6	73.3		
12	35.7	34.9	34.2	77.5	75.2	72.1		
13	36.2	35.5	34.7	78.8	75.9	73.8		
14	36.3	35.4	34.4	78.3	75.6	72.7		
15	36.4	35.3	34.4	78.9	75.6	72.2		
16	35.7	35.2	34.6	78.0	75.3	71.8		
17	37.0	35.7	34.3	79.5	76.6	73.3		○
18	37.4	35.9	34.5	81.1	77.4	73.9		○
19	35.5	34.8	34.1	79.8	75.9	73.6		○
20	36.1	35.2	34.4	79.3	76.0	73.5		○
21	36.4	35.8	35.1	79.5	76.8	74.2		○
22	36.2	35.3	34.3	78.5	75.9	73.4		○
23	36.4	35.7	34.7	79.2	76.3	73.1		
24	37.5	35.8	34.9	79.8	76.9	74.1		
25	40.1	36.0	35.0	82.2	77.3	73.7	1.0	○
26	39.4	35.8	34.8	81.2	76.9	73.1	0.5	○
27	36.4	35.4	34.3	79.2	76.3	73.9		○
28	37.8	35.8	34.6	81.0	77.8	74.1		○
29	36.2	35.2	34.4	79.1	76.4	74.2		
30	36.8	35.8	34.9	80.1	77.0	74.0		
月 間	46.6	35.5	33.3	88.6	76.3	71.3	44.0	
標 準 偏 差	1.1			1.7				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-2

11 月における空間ガンマ線量率測定結果 (5)

単位: nGy/h

局 項目 日	鮫 浦							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	66.6	52.3	49.1	115.1	100.2	94.4	62.5	○
2	64.4	51.3	49.2	111.9	99.2	95.1	3.0	○
3	55.1	50.8	49.7	103.0	98.0	94.1	0.5	○
4	51.1	50.4	49.5	100.5	96.7	92.9		
5	51.5	50.7	49.8	101.4	96.9	92.8		
6	51.9	50.9	49.9	101.4	97.5	93.5		
7	52.1	51.1	49.7	101.0	97.6	94.0		
8	51.5	50.8	49.9	100.1	96.3	91.4		
9	55.8	51.4	50.2	102.0	97.7	94.4		○
10	55.1	52.2	50.9	104.5	99.4	96.3		○
11	53.2	52.0	50.9	101.8	98.6	95.1		
12	51.9	51.0	50.0	100.8	96.9	92.9		
13	52.3	51.6	50.9	101.7	97.5	93.5		
14	52.5	51.5	50.6	101.2	97.7	94.3		
15	52.2	51.3	50.6	101.4	97.4	93.8		
16	52.1	51.2	50.6	100.2	97.0	93.5		
17	53.1	51.9	50.9	103.5	98.9	94.2		○
18	53.7	52.3	50.8	103.0	99.4	95.8		○
19	52.2	51.3	50.4	102.4	98.0	94.3		○
20	52.6	51.6	50.9	101.6	98.3	94.1		○
21	53.0	52.1	51.2	103.2	98.9	95.6		○
22	52.6	51.7	50.8	102.5	98.3	93.9		○
23	53.0	52.0	51.2	102.1	98.5	94.2		
24	53.5	52.1	51.1	103.3	98.6	95.5		○
25	60.4	52.6	51.2	108.8	99.6	96.1	2.0	○
26	56.6	51.9	50.7	104.4	98.9	95.0		○
27	52.3	51.4	50.6	101.9	98.1	94.8		○
28	54.0	52.0	50.7	103.3	99.7	96.1		○
29	52.6	51.5	50.6	102.9	98.4	95.5		
30	52.7	51.9	50.7	102.5	98.9	95.6		
月 間	66.6	51.6	49.1	115.1	98.2	91.4	68.0	
標 準 偏 差	1.3			2.0				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-2

11 月における空間ガンマ線量率測定結果 (6)

単位: nGy/h

局 項目 日	谷 川							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	63.2	49.4	46.3	97.5	83.1	78.9		
2	65.5	49.0	47.1	95.6	81.9	78.6		
3	53.8	48.4	47.1	87.0	81.1	78.9		
4	49.2	48.2	47.1	82.1	80.0	77.5		
5	49.3	48.5	47.8	82.1	80.3	78.3		
6	49.5	48.5	47.7	82.6	80.8	78.7		
7	49.1	48.5	47.6	82.6	80.5	78.1		
8	49.4	48.6	47.4	82.0	79.6	77.5		
9	53.0	49.2	47.9	84.9	81.0	78.6		
10	51.8	49.4	48.0	85.9	82.1	79.6		
11	50.7	49.4	48.5	84.3	81.6	78.9		
12	49.6	48.7	47.8	82.8	80.3	78.6		
13	50.5	49.3	48.4	83.2	81.0	79.1		
14	50.1	49.0	47.9	83.4	80.9	79.3		
15	49.8	48.9	48.0	82.7	80.6	78.5		
16	49.9	49.1	48.3	82.4	80.6	78.2		
17	50.5	49.4	48.2	84.3	81.8	79.2		
18	51.1	49.6	48.2	84.9	82.3	79.6		
19	49.8	48.9	48.0	83.4	81.3	79.8		
20	50.5	49.4	48.6	83.8	81.5	79.8		
21	51.3	49.7	48.7	84.0	82.1	79.8		
22	50.5	49.3	48.2	83.4	81.2	78.4		
23	51.0	49.9	49.0	84.9	81.8	79.9		
24	51.5	49.9	48.9	84.4	82.2	80.5		
25	58.0	50.3	48.8	90.2	83.0	80.4		
26	53.1	49.8	48.5	86.5	82.3	79.7		
27	50.6	49.3	48.3	84.3	81.8	79.8		
28	51.1	49.7	48.5	86.0	83.2	80.0		
29	50.4	49.2	48.2	83.7	81.9	80.2		
30	50.7	49.9	48.8	84.8	82.5	80.6		
月 間	65.5	49.2	46.3	97.5	81.5	77.5		
標 準 偏 差	1.4			1.6				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-2

11 月における空間ガンマ線量率測定結果 (7)

単位: nGy/h

局 項目 日	荻 浜							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	69.8	55.6	52.6	103.8	90.0	85.4	51.5	○
2	70.2	55.1	53.4	102.5	88.9	85.7	3.5	○
3	57.2	54.5	53.5	92.6	88.0	85.6		○
4	55.1	54.3	53.3	90.5	87.1	84.8		
5	55.8	54.7	53.5	89.5	87.3	84.8		
6	55.7	54.7	53.9	89.6	87.6	85.4		
7	55.5	54.9	53.8	90.3	87.7	84.3		
8	55.7	54.6	53.7	88.7	86.6	84.6		
9	58.3	55.3	54.1	92.8	88.1	85.3		○
10	59.8	55.9	54.4	93.7	89.5	86.8	0.5	○
11	56.7	55.6	54.5	91.8	88.7	86.0		
12	55.7	54.9	53.9	89.1	87.3	84.1		
13	56.5	55.6	55.0	90.9	87.9	85.8		
14	56.3	55.3	54.4	90.7	88.1	85.9		
15	56.2	55.2	54.3	89.4	87.4	85.3		
16	56.2	55.3	54.2	89.8	87.5	85.4		
17	57.3	55.8	54.3	91.4	89.0	86.7		○
18	57.4	55.9	54.7	91.6	89.3	86.5		○
19	56.2	55.3	54.5	90.3	88.2	85.8		○
20	56.4	55.6	54.8	91.5	88.5	86.3		○
21	56.8	56.0	55.0	91.6	89.2	87.2		○
22	56.8	55.6	54.5	90.9	88.1	86.2		○
23	57.7	56.1	55.2	91.2	88.8	86.2		
24	57.4	56.2	55.4	92.1	89.3	86.7		○
25	65.8	56.8	55.0	99.5	90.4	87.7	3.0	○
26	58.5	55.7	54.5	92.4	89.1	86.8	0.5	○
27	56.8	55.5	54.4	91.9	88.8	86.2		
28	57.3	56.0	54.7	93.1	90.2	88.1		
29	56.5	55.4	54.4	91.1	88.8	86.7		
30	57.2	56.0	55.2	91.2	89.2	86.7		
月 間	70.2	55.4	52.6	103.8	88.5	84.1	59.0	
標 準 偏 差	1.3			1.7				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-2

11月における空間ガンマ線量率測定結果(8)

単位: nGy/h

局 項目 日	塚 浜							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	63.2	48.8	45.4	93.1	79.9	75.4		
2	61.9	47.7	45.9	90.3	78.1	75.7		
3	51.0	47.3	46.3	81.0	77.3	75.6		
4	47.7	46.8	46.2	77.6	75.9	74.6		
5	47.7	47.0	46.4	77.9	76.2	74.8		
6	47.8	47.1	46.4	78.0	76.7	74.7		
7	48.0	47.3	46.6	78.5	76.8	74.9		
8	47.8	47.2	46.5	77.2	75.6	74.2		
9	50.5	47.7	46.7	80.1	76.9	74.7		
10	54.5	49.0	47.2	84.8	79.1	75.6		
11	49.6	48.4	47.5	79.7	78.0	75.9		
12	48.2	47.4	46.7	78.6	76.5	74.1		
13	48.4	47.9	47.4	78.6	77.0	75.6		
14	48.5	47.8	47.1	78.3	77.0	74.9		
15	48.6	47.7	46.9	78.5	76.6	74.5		
16	48.7	47.5	46.9	77.8	76.3	74.4		
17	49.3	48.2	47.2	79.9	77.9	75.3		
18	50.0	48.7	47.6	80.7	78.6	75.7		
19	48.1	47.6	47.0	78.9	77.2	75.8		
20	48.5	47.8	47.1	79.1	77.5	76.0		
21	49.0	48.4	47.8	79.8	78.2	76.5		
22	48.8	48.0	47.3	79.0	77.2	75.6		
23	48.9	48.3	47.5	79.0	77.5	75.8		
24	49.3	48.3	47.6	79.1	77.9	76.4		
25	57.5	48.9	47.4	87.2	78.9	76.4		
26	53.8	48.2	47.3	84.1	78.3	76.2		
27	48.9	47.9	47.1	79.0	77.6	76.1		
28	50.0	48.4	46.9	81.5	79.1	77.0		
29	48.7	47.9	47.2	79.8	77.9	75.9		
30	49.1	48.3	47.6	79.9	78.2	76.7		
月 間	63.2	47.9	45.4	93.1	77.5	74.1		
標 準 偏 差	1.4			1.7				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-2

11月における空間ガンマ線量率測定結果(9)

単位: nGy/h

局 項目 日	寺 間							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	52.2	39.1	36.1	86.5	74.4	70.3	53.0	○
2	46.3	38.0	36.6	80.6	72.6	70.3		○
3	43.7	38.2	37.2	77.5	72.4	69.5	0.5	○
4	38.0	37.5	37.1	72.4	70.9	69.6		
5	38.4	37.7	37.0	72.7	71.0	69.3		
6	38.4	37.7	37.2	72.9	71.5	69.5		
7	39.6	38.0	36.8	74.2	71.8	69.4		○
8	38.3	37.7	37.0	71.7	70.2	68.0		
9	40.0	38.0	37.3	74.8	71.5	69.8		○
10	50.3	39.6	37.6	83.8	74.0	71.3	0.5	○
11	40.1	38.6	37.5	75.4	72.6	70.5		
12	38.4	37.8	37.1	72.6	71.0	69.4		
13	38.9	38.3	37.5	73.5	71.6	70.3		
14	38.9	38.3	37.5	73.7	71.8	69.8		
15	38.7	38.0	37.3	73.4	71.2	69.7		
16	38.6	37.9	37.3	73.6	71.1	69.1		
17	39.6	38.5	37.5	75.1	72.6	70.5		○
18	40.3	38.9	37.6	75.4	73.4	71.4		○
19	38.4	37.8	37.4	73.6	71.9	70.4		
20	38.9	38.2	37.7	73.7	72.0	70.1		○
21	39.2	38.7	38.1	74.5	72.9	70.7		○
22	39.0	38.2	37.4	73.2	71.7	70.0		○
23	39.3	38.6	37.8	74.1	72.2	70.3		○
24	39.6	38.5	37.8	74.4	72.5	70.8		○
25	46.7	39.0	37.6	81.4	73.4	70.3	2.0	○
26	41.4	38.6	37.7	77.2	72.7	70.4	0.5	○
27	39.6	38.3	37.3	74.5	72.3	70.7		
28	40.3	38.9	37.7	76.2	73.9	71.8		○
29	38.9	38.3	37.6	73.8	72.5	71.2		
30	39.6	38.7	38.1	74.6	73.0	71.6		
月 間	52.2	38.3	36.1	86.5	72.2	68.0	56.5	
標 準 偏 差	1.3			1.6				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-2

11月における空間ガンマ線量率測定結果(10)

単位: nGy/h

局 項目 日	江 島							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	44.3	33.7	30.3	74.4	65.3	62.0	47.0	○
2	58.3	34.2	31.5	86.7	65.0	61.9	3.0	○
3	38.3	33.3	32.3	69.0	63.8	61.3	0.5	○
4	33.0	32.5	32.0	63.5	62.3	61.2		
5	33.3	32.7	31.9	63.8	62.5	61.1		
6	33.7	32.9	31.9	64.5	63.1	61.5		
7	33.5	32.9	32.2	64.4	63.0	61.0		○
8	33.1	32.6	31.8	63.1	61.7	60.4		
9	36.8	32.9	31.7	66.5	62.9	60.7		○
10	41.2	34.1	32.5	72.0	64.9	62.2		○
11	35.3	33.8	32.8	66.3	64.1	62.6		○
12	33.3	32.6	32.0	64.0	62.3	60.9		
13	33.8	33.2	32.5	64.3	62.9	61.5		
14	33.8	33.2	32.4	64.8	63.0	61.3		
15	33.7	32.9	32.2	63.9	62.6	61.2		
16	33.4	32.7	32.1	63.7	62.3	61.0		
17	35.8	33.4	32.2	67.0	63.8	61.5		○
18	35.4	33.8	32.6	66.4	64.5	62.6		○
19	33.3	32.7	32.2	64.9	63.1	62.0		○
20	33.5	32.9	32.3	64.6	63.1	61.9		○
21	34.1	33.5	33.0	65.3	64.0	62.4		○
22	34.0	33.1	32.3	64.9	63.1	61.6		
23	34.0	33.3	32.7	64.7	63.2	61.7		
24	34.9	33.6	32.8	65.2	63.7	61.8		
25	41.5	33.6	32.2	72.1	64.3	62.1	5.5	○
26	37.5	33.4	32.5	68.0	63.9	62.2	0.5	○
27	34.4	33.0	32.3	64.7	63.4	62.0		○
28	35.6	33.7	32.5	67.6	65.0	63.1		○
29	33.6	33.1	32.4	64.9	63.8	62.4		
30	34.9	33.6	32.9	66.0	64.2	62.5		
月 間	58.3	33.2	30.3	86.7	63.5	60.4	56.5	
標 準 偏 差	1.4			1.6				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和7年度

表-3-1-2

11月における空間ガンマ線量率測定結果 (11)

単位: nGy/h

局 項目 日	前 網							降水量 (mm)	感 雨 有無
	NaI(Tl)			電 離 箱					
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小			
1	64.2	53.2	50.8	93.3	83.2	79.7			
2	63.5	52.8	51.0	92.9	82.1	79.9			
3	57.1	52.6	51.4	86.4	81.5	79.7			
4	52.8	52.2	51.6	81.6	80.4	79.1			
5	53.1	52.4	51.9	82.1	80.6	79.3			
6	53.2	52.6	51.9	82.4	81.2	79.5			
7	53.3	52.7	51.9	82.9	81.2	79.4			
8	53.2	52.6	51.9	81.4	80.0	78.7			
9	56.3	53.1	52.2	85.0	81.4	79.4			
10	57.6	53.8	52.4	88.0	83.0	80.6			
11	54.7	53.6	52.7	84.7	82.2	80.1			
12	53.8	52.8	52.3	82.0	80.8	79.0			
13	53.9	53.5	52.9	82.9	81.4	80.0			
14	54.1	53.4	52.6	83.1	81.4	79.5			
15	54.1	53.2	52.4	83.1	81.1	79.3			
16	53.6	53.1	52.5	82.2	80.9	79.5			
17	54.8	53.6	52.6	84.6	82.4	80.3			
18	55.2	54.1	53.0	85.8	83.1	81.3			
19	53.8	53.2	52.5	83.1	81.8	80.2			
20	54.1	53.5	52.9	83.7	82.1	80.6			
21	54.6	53.9	53.0	84.8	82.7	81.3			
22	54.3	53.6	53.0	83.4	81.8	80.2			
23	54.7	54.0	53.3	84.0	82.3	80.7			
24	55.0	54.0	53.0	84.1	82.5	80.8			
25	58.8	54.2	53.1	88.0	83.2	80.7			
26	56.8	53.8	53.0	86.4	82.7	81.0			
27	54.7	53.6	52.9	83.8	82.3	80.7			
28	55.5	54.0	53.0	85.6	83.7	81.0			
29	54.3	53.6	52.9	83.8	82.6	81.4			
30	54.8	54.1	53.6	85.0	83.1	81.6			
月 間	64.2	53.4	50.8	93.3	81.9	78.7			
標 準 偏 差	1.1			1.4					
欠測率 (%)	0.0			0.0					

令和7年度

表-3-1-3

12 月における空間ガンマ線量率測定結果 (1)

単位: nGy/h

局 項目 日	女 川							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	30.3	29.4	28.4	-	-	-	28.0	○
2	30.5	29.6	28.8	-	-	-		○
3	37.1	30.0	28.3	-	-	-		○
4	31.8	29.2	28.1	-	-	-		○
5	36.3	29.3	27.6	-	-	-		○
6	30.1	28.4	27.5	-	-	-		○
7	31.1	29.5	28.5	-	-	-		○
8	29.9	29.2	28.2	-	-	-		○
9	31.4	29.7	28.3	-	-	-		○
10	31.5	30.1	28.6	-	-	-		○
11	31.1	29.5	28.3	-	-	-		○
12	33.2	29.8	28.0	-	-	-		○
13	30.3	29.2	27.9	-	-	-		○
14	38.1	31.5	27.8	-	-	-		○
15	29.4	27.9	26.9	-	-	-		○
16	29.3	28.3	27.4	-	-	-	6.0	○
17	48.8	31.2	27.3	-	-	-		○
18	29.8	28.2	26.8	-	-	-		
19	30.2	29.1	28.1	-	-	-		
20	30.3	28.7	27.3	-	-	-		○
21	36.7	29.3	27.0	-	-	-	5.5 13.0	○
22	30.9	29.1	28.1	-	-	-		○
23	30.3	29.3	28.2	-	-	-		
24	40.2	32.4	28.9	-	-	-		○
25	49.4	36.3	27.1	-	-	-		○
26	53.9	31.3	27.7	72.9	68.2	65.1	4.5	○
27	30.2	28.2	27.1	70.5	67.0	64.2		
28	29.9	28.1	26.8	70.6	66.9	64.6		
29	29.5	28.6	27.8	69.9	67.7	65.1		
30	30.5	29.0	28.0	71.4	68.6	66.0		○
31	30.6	28.9	28.1	70.7	68.7	66.1		
月 間	53.9	29.6	26.8	(72.9)	(67.8)	(64.2)	57.0	
標 準 偏 差	2.7			(1.3)				
欠測率 (%)	0.2			82.1				

- : 有効データ数が1日の半数に満たないこと(日欠測)を示す。

(注) 月欠測及び12月1日~25日の日欠測は検出器内の異常な放電に伴う故障によるものである。

() は、有効データ数が当該月の半数に満たないことから、参考値扱いとしたことを示す。

令和7年度

表-3-1-3

12月における空間ガンマ線量率測定結果 (2)

単位: nGy/h

局 項目 日	飯子浜							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	43.4	42.6	42.0	86.9	83.6	80.1		
2	44.1	43.0	41.6	87.1	83.8	80.9		
3	53.6	43.7	41.8	96.2	85.0	80.7		
4	45.2	43.1	41.8	88.2	84.1	80.5		
5	50.2	42.8	41.5	90.1	83.6	79.6		
6	43.1	42.1	41.0	84.5	82.2	79.7		
7	43.4	42.6	41.9	86.4	83.2	80.0		
8	44.2	42.8	41.8	86.4	83.2	80.4		
9	44.2	43.1	41.9	86.5	83.3	80.7		
10	44.3	43.1	42.1	85.6	83.2	81.2		
11	44.0	42.8	42.2	86.0	83.5	80.1		
12	48.7	43.6	41.5	90.9	83.9	80.1		
13	43.6	42.1	41.2	85.4	82.2	78.2		
14	51.0	44.6	40.8	92.8	85.6	81.6		
15	43.4	41.7	40.7	86.3	82.9	79.9		
16	42.5	41.7	40.8	85.9	82.4	79.5		
17	62.9	44.4	40.9	102.9	84.9	79.5		
18	43.1	41.6	40.6	85.2	81.8	78.2		
19	42.6	41.9	41.2	85.0	81.6	78.3		
20	42.8	41.8	40.9	84.7	81.7	79.4		
21	50.5	43.1	40.5	90.9	83.4	79.1		
22	44.2	42.7	41.3	85.6	82.5	78.7		
23	42.9	42.0	41.1	85.0	81.7	78.8		
24	51.8	45.1	41.7	93.0	85.3	78.6		
25	69.0	50.6	41.4	108.7	91.4	80.4		
26	74.4	46.3	41.7	113.9	87.7	80.9		
27	43.2	41.9	41.1	85.9	82.7	79.8		
28	43.4	41.6	40.8	86.1	81.9	78.6		
29	42.7	41.9	41.0	86.0	82.7	79.7		
30	46.8	42.5	41.5	88.6	83.6	80.0		
31	43.4	42.4	41.6	86.8	83.4	80.0		
月 間	74.4	43.1	40.5	113.9	83.6	78.2		
標 準 偏 差	3.0			3.2				
欠測率 (%)	1.0			1.0				

令和7年度

表-3-1-3

12月における空間ガンマ線量率測定結果 (3)

単位: nGy/h

局 項目 日	小 屋 取							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	48.4	47.6	46.9	87.9	84.8	81.9	0.5	○
2	48.7	47.8	46.8	88.2	85.2	82.5		
3	50.6	47.6	46.8	88.9	85.3	82.7		
4	50.9	47.9	46.7	89.1	85.5	81.1		
5	54.6	47.8	46.4	90.1	84.8	79.4		
6	48.0	47.2	46.4	86.0	83.5	80.2		
7	49.0	47.8	47.0	87.5	84.5	81.7		
8	48.6	47.8	46.9	88.4	84.7	81.4		
9	48.9	47.7	46.6	87.0	84.3	81.3		
10	49.6	47.7	46.8	88.1	83.9	79.5		
11	48.4	47.5	46.7	87.5	84.6	81.9	28.0	○
12	53.3	48.5	46.6	90.5	84.9	80.5		
13	49.0	47.5	46.3	87.6	83.8	80.0		
14	54.8	49.9	46.5	92.3	87.1	81.5		
15	47.6	46.7	45.7	87.9	84.4	79.9		
16	47.2	46.4	45.5	86.1	83.3	80.6	6.5	○
17	66.2	49.0	45.7	101.7	85.5	80.2		
18	47.2	46.2	45.0	86.2	82.3	79.7		
19	47.7	46.8	46.0	86.0	82.8	79.6		
20	48.2	47.0	46.0	86.4	83.3	80.4		
21	54.5	48.2	45.6	92.2	85.0	80.1	0.5	○
22	48.8	47.3	45.8	87.0	83.6	79.9		
23	47.1	46.4	45.5	85.9	82.5	79.2	5.5	○
24	56.0	49.4	45.6	94.0	86.0	80.6		
25	71.1	53.9	46.2	108.2	90.9	81.2	14.5	○
26	73.2	50.4	46.5	109.2	88.1	82.5	4.0	○
27	47.7	46.9	46.2	87.3	84.3	81.7		
28	48.4	46.7	46.0	87.0	83.8	79.7		
29	47.5	46.8	46.1	87.1	84.1	81.3		
30	51.9	47.6	46.5	89.5	85.2	81.6		○
31	48.4	47.6	46.8	88.2	85.0	81.7		
月 間	73.2	47.9	45.0	109.2	84.7	79.2	59.5	
標 準 偏 差	2.7			2.9				
欠測率 (%)	1.9			1.9				

令和7年度

表-3-1-3

12月における空間ガンマ線量率測定結果 (4)

単位: nGy/h

局 項目 日	寄 磯							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	36.6	35.9	35.0	81.4	77.4	74.2	1.0	○
2	37.1	36.2	35.3	80.4	77.7	75.4		
3	46.2	36.8	34.6	89.2	79.2	75.6		
4	39.0	36.0	34.9	81.8	77.6	74.7		
5	41.1	35.7	34.2	84.1	77.1	73.8		
6	35.8	34.8	34.1	79.2	75.9	72.3		
7	36.2	35.5	34.6	80.7	77.0	74.5		
8	37.1	35.7	34.8	79.8	76.9	74.7		
9	37.1	35.8	34.8	80.3	77.0	74.3		
10	36.8	35.9	35.1	79.7	77.0	74.6		
11	36.5	35.7	34.8	80.6	77.3	74.3	0.5	○
12	38.7	35.8	34.4	81.9	77.1	74.1		
13	35.7	34.8	34.1	79.9	75.7	72.7		
14	42.1	37.1	33.8	85.0	79.3	73.7		
15	35.4	34.5	33.8	79.7	76.5	74.0		
16	35.2	34.4	33.5	78.5	75.9	73.4	7.0	○
17	54.9	37.1	33.8	94.0	78.2	72.5		
18	35.8	34.3	33.4	78.8	75.3	71.5		
19	35.3	34.7	33.8	78.1	75.1	72.6		
20	35.5	34.7	33.9	79.0	75.8	73.5		
21	42.1	35.8	33.4	84.2	77.1	72.7	4.0	○
22	36.6	35.5	34.3	79.4	76.4	73.4		
23	35.6	34.8	34.1	78.0	75.3	71.9		
24	42.1	37.2	34.3	85.2	78.3	73.9		
25	56.2	40.9	34.3	97.3	82.7	74.8		
26	53.4	38.0	34.6	95.1	80.2	74.1	4.0	○
27	37.1	34.8	34.2	79.1	76.2	73.6		
28	36.6	34.4	33.4	78.7	75.6	72.5		
29	35.3	34.6	33.8	79.6	76.1	73.8		
30	36.9	35.4	34.6	80.5	77.3	74.6		
31	36.2	35.3	34.7	79.6	77.4	74.9		
月 間	56.2	35.7	33.4	97.3	77.1	71.5	63.5	
標 準 偏 差	2.5			2.7				
欠測率 (%)	1.7			1.7				

令和7年度

表－３－１－３

12 月における空間ガンマ線量率測定結果 (5)

単位：nGy/h

局 項目 日	鮫 浦									
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無		
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小				
1	53.0	52.1	51.2	106.5	99.5	96.7	1.0	○ ○ ○		
2	53.4	52.3	51.5	104.0	99.4	95.1				
3	66.0	53.1	50.6	114.9	100.9	96.4				
4	54.2	52.1	50.7	103.8	99.6	95.7				
5	58.1	51.9	50.5	107.4	98.9	94.6				
6	52.4	51.3	50.6	101.6	97.9	94.4			27.0	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7	53.1	51.9	51.2	102.4	98.9	95.8				
8	53.4	52.1	51.1	101.8	98.8	95.6				
9	53.4	52.0	50.8	102.6	99.0	95.3				
10	52.8	51.8	50.8	102.4	99.0	95.1				
11	52.4	51.5	50.8	104.0	99.3	96.5				
12	56.2	52.1	49.9	104.0	99.3	94.3				
13	51.9	50.8	49.7	101.0	97.7	91.7				
14	59.5	53.3	49.4	107.9	101.1	96.0				
15	52.1	50.3	49.4	102.5	98.3	94.8				
16	51.2	50.1	49.3	102.2	97.8	95.0	5.5	○ ○		
17	74.4	53.3	49.5	120.4	100.3	94.2				
18	51.2	50.0	48.7	100.4	96.9	93.7				
19	50.9	50.2	49.5	100.4	96.9	93.0				
20	51.8	50.3	49.1	100.7	97.2	94.1				
21	60.8	51.9	49.2	108.2	99.4	92.9	0.5	○ ○		
22	53.2	51.2	49.9	101.8	97.9	94.8				
23	51.2	50.4	49.5	100.6	97.0	93.9	5.5	○ ○		
24	60.1	53.4	50.2	108.6	100.7	95.2				
25	79.8	59.0	49.6	126.7	106.7	95.8	16.5	○		
26	73.2	54.1	50.2	120.1	102.5	95.5	4.0	○ ○		
27	51.6	50.3	49.3	102.5	98.0	93.8				
28	51.4	49.9	49.1	103.6	97.5	93.4		○		
29	51.0	50.1	49.3	101.1	98.0	94.4				
30	53.6	50.8	49.7	102.2	98.9	96.1				
31	51.5	50.8	50.0	102.5	99.0	95.9				
月 間	79.8	51.8	48.7	126.7	99.1	91.7	60.0			
標 準 偏 差	3.1			3.4						
欠測率 (%)	1.7			1.8						

令和7年度

表-3-1-3

12月における空間ガンマ線量率測定結果 (6)

単位: nGy/h

局 項目 日	谷 川							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	50.7	49.9	48.9	85.5	82.8	80.5		
2	51.2	50.1	49.0	85.5	83.0	80.9		
3	63.0	50.8	48.6	96.1	84.3	80.7		
4	52.2	49.9	48.5	86.6	83.1	80.6		
5	53.2	49.4	48.3	87.0	82.3	79.2		
6	50.5	49.3	48.3	84.8	81.7	79.1		
7	50.7	49.9	49.0	85.6	82.6	80.5		
8	50.9	49.9	48.7	84.6	82.3	80.1		
9	51.0	50.0	48.8	86.1	82.5	80.6		
10	51.6	50.4	49.4	84.7	82.5	80.0		
11	50.8	49.7	48.3	85.1	82.6	80.3		
12	53.5	49.9	47.9	86.2	82.7	79.4		
13	50.5	49.1	48.1	83.6	81.5	79.3		
14	59.3	51.5	47.1	92.3	84.9	80.4		
15	49.0	47.9	47.2	83.7	81.6	78.9		
16	49.0	48.1	47.2	83.5	81.3	79.2		
17	79.1	51.9	47.4	108.6	84.4	78.7		
18	49.0	47.9	46.8	83.2	80.6	78.7		
19	49.0	48.4	47.7	82.7	80.5	78.6		
20	49.2	48.2	47.2	83.3	80.9	78.1		
21	55.4	49.4	46.9	87.7	82.4	79.5		
22	50.7	49.1	47.9	84.5	81.6	79.2		
23	49.7	48.6	47.7	83.4	80.9	78.5		
24	59.0	51.6	48.4	92.4	84.4	79.3		
25	73.3	56.5	47.8	105.3	89.6	80.2		
26	73.2	52.0	47.5	104.7	85.8	79.6		
27	49.6	48.0	46.7	83.7	81.3	78.7		
28	49.4	47.8	46.8	83.3	81.0	78.6		
29	48.9	48.2	47.1	83.2	81.5	78.9		
30	49.3	48.4	47.6	84.5	82.1	79.6		
31	49.3	48.6	48.0	84.9	82.2	80.5		
月 間	79.1	49.7	46.7	108.6	82.6	78.1		
標 準 偏 差	3.2			3.1				
欠測率 (%)	1.7			1.7				

令和7年度

表-3-1-3

12 月における空間ガンマ線量率測定結果 (7)

単位: nGy/h

局 項目 日	萩 浜							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	57.2	56.2	55.1	92.4	90.0	87.8	0.5	○
2	57.2	56.2	55.2	92.6	90.0	87.9		
3	66.0	56.8	54.9	100.5	91.2	88.2		
4	58.1	56.1	55.0	94.0	90.0	87.2		
5	59.9	55.8	54.6	93.7	89.2	86.9		
6	56.7	55.4	54.4	91.0	88.6	86.0		
7	57.2	56.1	55.2	92.1	89.5	87.1		
8	57.1	56.1	55.3	91.8	89.7	87.8		
9	57.4	56.2	54.9	91.5	89.3	86.5		
10	57.3	56.3	55.3	91.8	89.1	86.3		
11	57.0	56.2	55.2	92.2	89.7	87.4	38.0	○
12	60.7	56.6	54.4	95.6	89.8	86.6		
13	56.4	55.5	54.1	91.0	88.2	86.1		
14	67.7	58.2	53.9	101.5	92.0	87.2		
15	55.6	54.7	53.6	91.6	89.0	86.9		
16	55.3	54.5	53.7	91.1	88.4	86.4	6.0	○
17	76.6	57.5	53.5	108.8	91.1	86.1		
18	55.1	54.3	53.5	91.0	87.8	85.7		
19	55.6	54.7	54.0	89.7	87.8	85.6		
20	56.3	54.7	53.5	90.7	88.2	86.5		
21	65.6	56.1	53.7	99.2	90.0	86.2	0.5	○
22	57.4	55.4	54.1	91.3	88.6	86.2		
23	55.5	54.8	53.9	90.1	87.8	85.7	5.5	○
24	64.4	58.1	54.6	99.0	92.0	86.6		
25	77.9	63.6	54.2	111.5	97.9	87.7	16.0	○
26	77.5	57.8	54.2	111.3	92.9	87.5	4.0	○
27	55.4	54.5	53.3	91.1	88.7	86.9		
28	55.2	54.2	53.1	90.3	88.0	85.4		
29	55.9	54.6	53.7	91.2	88.7	86.0		
30	56.2	55.1	54.1	92.3	89.6	87.1		
31	55.9	55.0	54.2	92.2	89.5	86.8		
月 間	77.9	56.1	53.1	111.5	89.8	85.4	70.5	
標 準 偏 差	2.9			3.1				
欠測率 (%)	1.8			1.8				

令和7年度

表-3-1-3

12月における空間ガンマ線量率測定結果(8)

単位: nGy/h

局 項目 日	塚 浜						降水量 (mm)	感 雨 有無
	NaI(Tl)			電 離 箱				
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	48.7	48.2	47.2	80.4	78.6	77.6		
2	49.2	48.4	47.6	80.2	78.7	77.0		
3	59.4	49.2	47.5	91.1	80.2	77.6		
4	51.9	48.7	47.5	83.2	79.3	76.7		
5	55.8	48.5	46.9	85.8	78.6	76.4		
6	48.2	47.6	47.1	79.1	77.2	75.7		
7	48.8	48.1	47.5	79.1	78.1	76.5		
8	49.3	48.3	47.4	80.2	78.3	76.6		
9	49.5	48.5	47.7	80.0	78.4	77.1		
10	49.9	48.5	47.6	80.1	78.1	76.6		
11	48.9	48.1	47.6	80.6	78.6	76.9		
12	55.1	49.3	46.5	84.6	79.1	76.3		
13	48.8	47.5	46.9	78.4	77.0	75.6		
14	55.4	49.9	46.3	85.8	80.7	77.3		
15	47.8	47.0	46.3	79.7	77.9	76.4		
16	47.9	47.0	46.4	79.4	77.2	75.4		
17	70.2	50.0	46.4	99.1	79.8	75.8		
18	47.8	46.8	45.8	78.8	76.5	74.4		
19	47.6	46.9	46.4	77.5	76.3	75.0		
20	47.7	46.9	46.0	78.2	76.7	75.5		
21	55.3	48.3	46.0	84.4	78.4	75.4		
22	49.2	47.8	46.7	79.6	77.2	75.2		
23	47.7	47.1	46.5	78.0	76.3	74.7		
24	57.9	50.4	46.9	88.3	80.3	76.0		
25	75.5	55.6	46.5	105.2	86.2	77.0		
26	79.1	51.4	46.9	108.6	82.6	77.1		
27	48.1	47.0	46.2	79.2	77.4	75.7		
28	48.1	46.6	46.0	78.8	76.9	75.1		
29	47.4	46.8	46.3	78.6	77.3	75.6		
30	52.3	47.6	46.7	82.9	78.4	76.7		
31	48.1	47.5	46.8	79.5	78.2	76.5		
月 間	79.1	48.4	45.8	108.6	78.5	74.4		
標 準 偏 差	3.2			3.2				
欠測率 (%)	0.1			0.1				

令和7年度

表-3-1-3

12月における空間ガンマ線量率測定結果(9)

単位: nGy/h

局 項目 日	寺 間							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	39.5	38.9	38.3	76.0	73.5	71.7	1.5	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2	40.3	39.2	38.3	75.6	73.8	71.7		
3	49.6	39.7	37.9	83.6	74.9	72.6		
4	43.6	39.3	38.1	79.6	74.0	71.6		
5	49.1	39.4	37.8	83.1	73.8	71.2		
6	39.0	38.2	37.6	74.2	72.0	70.3		
7	39.2	38.7	38.2	74.5	72.8	71.3		
8	40.1	38.9	38.1	75.3	73.1	70.9		
9	40.1	39.2	38.4	74.5	73.3	71.5		
10	40.7	39.2	38.4	75.3	73.1	71.4		
11	39.7	38.9	38.4	75.2	73.4	71.3	0.5	○ ○ ○ ○ ○
12	44.2	39.8	37.9	78.4	73.8	70.4		
13	39.0	38.2	37.5	73.3	71.6	69.6		
14	45.8	40.7	37.4	80.4	75.4	70.9		
15	38.3	37.8	37.0	75.2	72.7	70.8		
16	38.4	37.7	36.9	73.9	72.0	69.4	7.0	○ ○ ○ ○ ○
17	59.9	40.9	37.2	93.2	74.7	70.0		
18	38.8	37.6	36.8	73.4	71.4	69.3		
19	38.4	37.9	37.3	72.6	71.1	69.7		
20	38.5	37.8	36.8	73.0	71.5	69.9		
21	45.1	39.0	36.9	80.0	73.2	70.1	1.0	○ ○
22	40.9	38.8	37.7	75.4	72.5	69.4		
23	38.7	37.9	37.2	72.9	71.2	68.9	5.0	○ ○
24	49.8	41.1	37.6	83.8	75.3	70.7		
25	65.5	45.8	37.4	99.8	80.5	71.3	16.5	○
26	64.5	41.5	37.6	98.8	76.9	72.0	4.0	○ ○
27	39.8	37.8	37.2	74.9	72.5	70.6		
28	40.0	37.4	36.7	74.7	71.7	69.9	○	○ ○ ○
29	38.1	37.5	36.8	75.3	72.1	70.4		
30	39.5	38.1	37.6	75.4	73.1	71.7		
31	39.0	38.3	37.8	76.0	73.2	71.4		
月 間	65.5	39.1	36.7	99.8	73.4	68.9	68.5	
標 準 偏 差	3.1			3.2				
欠測率 (%)	0.1			0.1				

令和7年度

表-3-1-3

12月における空間ガンマ線量率測定結果(10)

単位: nGy/h

局 項目 日	江 島							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	34.7	33.6	33.0	65.8	64.4	63.3	2.0	○
2	34.4	33.6	33.0	65.9	64.5	63.0		
3	49.4	35.1	33.0	80.0	66.3	63.7		
4	35.7	34.0	33.2	68.1	65.0	63.3		
5	39.3	33.6	32.3	70.3	64.4	62.4		
6	33.7	32.7	32.0	64.7	63.0	61.5	31.5	○
7	33.9	33.3	32.7	65.3	63.9	62.6		
8	34.9	33.5	32.4	65.7	64.2	62.7		
9	34.9	33.8	32.8	65.9	64.3	62.6		
10	34.8	33.6	33.1	65.5	64.0	62.7		
11	34.5	33.4	32.8	66.2	64.2	62.5	6.0	○
12	37.8	34.2	33.0	68.8	64.6	62.8		
13	33.2	32.7	32.2	64.4	63.0	61.7		
14	42.8	35.7	32.3	75.0	66.9	62.0		
15	33.6	32.7	32.0	66.3	64.1	62.4		
16	33.7	32.5	31.6	65.0	63.3	61.7	1.0	○
17	57.7	35.9	32.1	86.9	66.2	61.9		
18	33.8	32.6	31.7	65.0	62.8	61.1		
19	33.2	32.6	32.1	63.8	62.6	61.6		
20	33.2	32.5	31.7	63.9	62.8	61.4		
21	47.2	34.6	31.4	77.1	65.2	61.4	5.0	○
22	35.2	33.6	32.6	65.8	63.7	61.4		
23	33.4	32.7	32.0	64.4	62.5	60.9		
24	43.1	35.6	32.6	73.0	66.1	61.8		
25	58.8	40.1	32.1	89.3	71.1	63.2		
26	62.5	37.3	32.9	92.9	68.8	63.3	4.0	○
27	35.6	32.8	32.1	66.9	63.9	62.3		
28	35.7	32.5	31.6	67.0	63.3	61.6		
29	33.0	32.4	31.8	65.0	63.4	62.0		
30	33.8	33.2	32.4	66.2	64.4	63.1		
31	34.0	33.2	32.4	66.0	64.4	62.8		○
月 間	62.5	33.9	31.4	92.9	64.6	60.9	62.5	
標 準 偏 差	3.2			3.2				
欠測率 (%)	0.1			0.1				

令和7年度

表-3-1-3

12月における空間ガンマ線量率測定結果(11)

単位: nGy/h

局 項目 日	前 網							降水量 (mm)	感 雨 有無
	NaI(Tl)			電 離 箱					
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小			
1	54.7	54.1	53.2	84.9	83.4	81.8			
2	55.4	54.4	53.6	85.2	83.6	81.4			
3	66.2	55.1	53.0	96.0	84.9	81.9			
4	57.0	54.4	53.3	87.8	83.8	81.8			
5	60.3	54.3	53.0	89.6	83.4	81.3			
6	54.4	53.6	52.8	84.1	82.1	80.4			
7	54.6	54.1	53.4	84.8	83.0	80.7			
8	55.0	54.2	53.4	85.1	83.1	81.4			
9	55.6	54.4	53.5	85.0	83.1	81.4			
10	55.1	54.3	53.4	84.8	82.8	81.3			
11	54.8	54.1	53.4	85.2	83.3	81.8			
12	58.9	54.6	52.1	87.5	83.4	80.9			
13	54.5	53.4	52.4	83.6	81.9	79.9			
14	60.8	55.3	51.8	90.8	85.1	81.0			
15	53.1	52.5	51.8	84.0	82.2	80.1			
16	53.2	52.5	51.7	83.2	81.6	79.4			
17	74.7	55.3	51.9	103.8	84.3	80.2			
18	53.5	52.3	51.6	83.5	81.0	79.0			
19	53.2	52.6	52.0	82.9	81.0	79.6			
20	53.3	52.5	51.9	83.1	81.2	79.0			
21	61.1	53.7	51.6	90.0	82.9	80.0			
22	55.0	53.3	52.3	84.2	81.9	79.8			
23	53.6	52.8	52.1	82.3	80.9	79.6			
24	62.1	55.7	52.6	91.5	84.7	80.8			
25	75.9	59.2	52.1	104.2	88.8	80.8			
26	73.1	55.8	52.4	101.8	86.0	81.5			
27	54.7	52.5	51.9	84.1	81.9	79.8			
28	54.8	52.3	51.6	84.3	81.4	79.5			
29	52.9	52.4	51.8	83.7	81.7	79.9			
30	54.6	53.0	52.4	84.7	82.7	81.2			
31	53.6	53.1	52.4	84.4	82.8	81.1			
月 間	75.9	53.9	51.6	104.2	83.0	79.0			
標 準 偏 差	2.7			2.8					
欠測率 (%)	0.1			0.1					

令和7年度

(2) 海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

表-3-2-1 10月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

項目 日	放 水 口 モ ニ タ ー											
	1号機 (A)			1号機 (B)			2号機			3号機		
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小
1	313	289	272	286	262	244	434	413	394	480	463	443
2	309	290	272	286	263	246	430	411	397	485	464	442
3	339	287	264	292	258	235	431	408	391	484	463	444
4	304	285	268	278	257	236	426	410	392	484	464	441
5	303	284	260	275	257	242	429	412	393	489	469	451
6	300	285	269	271	255	237	440	415	394	484	465	447
7	303	284	269	271	257	245	434	411	392	475	459	442
8	323	294	275	288	265	249	429	413	398	491	466	447
9	314	289	271	289	263	242	428	412	397	479	465	451
10	322	294	270	300	270	249	428	414	398	480	463	433
11	323	292	275	297	267	245	468	424	398	501	468	449
12	316	291	266	286	264	246	436	417	403	486	465	451
13	323	298	278	297	274	252	434	417	401	484	468	445
14	307	290	272	282	264	251	429	414	398	477	460	443
15	338	296	273	306	269	247	427	412	396	-	-	-
16	312	292	277	283	264	247	451	420	397	-	-	-
17	315	297	280	285	270	253	434	413	393	472	455	436
18	327	301	283	306	279	262	431	415	397	482	459	440
19	311	297	282	289	273	258	430	416	400	475	460	446
20	331	300	282	301	271	251	436	417	393	480	461	442
21	314	298	283	286	272	254	437	414	398	480	457	439
22	344	297	265	331	273	234	433	408	389	473	456	439
23	332	285	268	283	255	235	417	400	384	-	-	-
24	308	289	268	276	261	238	423	403	388	-	-	-
25	328	297	275	293	269	249	423	404	384	481	459	434
26	324	300	274	295	273	253	421	407	391	487	465	447
27	327	301	280	302	273	254	433	410	394	484	467	450
28	327	299	281	301	273	255	425	408	384	480	461	446
29	322	299	282	285	264	243	424	405	387	479	459	443
30	302	285	271	268	250	235	429	406	387	483	461	445
31	305	286	272	272	254	239	440	411	394	499	466	449
月間	344	293	260	331	265	234	468	412	384	501	462	433
標準偏差	11			12			9			8		
欠測率(%)	0.1			0.1			0.8			9.2		

-：有効データ数が1日の半数に満たないこと（日欠測）を示す。

（注）3号機放水口モニターの10月15日～16日及び10月23日～24日の日欠測は、定期点検によるものである。

令和7年度

表-3-2-2 11月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

項目 日	放水口モニター											
	1号機 (A)			1号機 (B)			2号機			3号機		
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小
1	316	289	268	276	256	234	446	417	395	512	471	451
2	309	293	275	280	261	246	431	412	396	483	465	446
3	311	290	273	277	258	242	430	410	393	488	465	444
4	318	295	272	288	262	243	420	407	389	478	461	442
5	314	293	270	282	259	240	425	409	393	480	463	445
6	314	287	267	282	254	237	426	410	396	486	469	452
7	308	288	270	278	257	238	430	412	385	483	466	449
8	316	289	267	278	257	236	425	407	390	481	457	438
9	311	287	270	279	254	238	428	412	393	485	463	446
10	317	287	270	270	253	237	433	418	400	490	468	450
11	296	280	267	261	248	236	434	415	399	481	463	443
12	300	281	265	264	249	233	433	410	388	476	461	444
13	298	280	263	267	248	234	425	404	382	478	462	441
14	307	283	266	272	250	237	421	404	389	481	461	443
15	297	280	265	264	249	234	425	404	388	478	461	446
16	297	282	264	266	250	235	419	403	382	485	463	444
17	298	284	272	270	251	236	425	407	390	484	467	449
18	300	284	269	267	252	236	428	410	393	485	467	450
19	303	284	267	273	251	238	425	409	390	478	462	445
20	304	282	263	273	250	229	425	409	395	480	461	441
21	296	281	264	262	247	229	424	412	397	479	463	445
22	300	283	268	265	249	233	424	410	388	482	462	446
23	304	284	269	266	252	240	430	412	395	482	463	441
24	300	281	267	264	249	232	434	415	393	485	468	452
25	306	281	262	268	247	234	433	417	400	490	470	451
26	289	277	257	259	244	232	434	414	396	494	471	449
27	290	276	261	259	244	229	432	412	393	490	468	449
28	292	276	264	256	243	231	432	418	401	498	475	458
29	296	275	263	259	242	227	428	414	390	483	465	448
30	288	276	262	260	245	230	433	415	397	483	465	449
月間	318	284	257	288	251	227	446	411	382	512	465	438
標準偏差	9			9			8			8		
欠測率(%)	0.1			0.1			0.8			1.5		

令和7年度

表-3-2-3

12月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

項目 日	放水口モニター											
	1号機 (A)			1号機 (B)			2号機			3号機		
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小
1	309	279	265	266	247	235	434	419	402	485	468	450
2	293	277	262	258	246	231	431	418	403	488	467	448
3	-	-	-	271	-	-	441	422	401	488	471	454
4	-	-	-	-	-	-	437	419	400	484	469	450
5	-	-	-	-	-	-	435	418	399	481	466	448
6	-	-	-	-	-	-	430	415	400	483	464	446
7	-	-	-	-	-	-	433	417	400	483	469	454
8	-	-	-	-	-	-	434	417	398	488	470	453
9	-	-	-	-	-	-	436	417	399	487	466	446
10	-	-	-	-	-	-	430	415	395	-	-	-
11	288	276	260	-	-	-	435	418	401	487	464	444
12	296	278	263	-	-	-	437	419	402	484	463	443
13	294	277	262	-	-	-	433	416	405	482	463	443
14	301	281	262	-	-	-	451	428	403	489	472	454
15	-	-	-	-	-	-	440	421	404	485	466	450
16	-	-	-	-	-	-	434	419	403	487	466	448
17	308	288	268	-	-	-	-	-	-	485	466	449
18	301	285	269	-	-	-	-	-	-	481	461	444
19	310	286	268	-	-	-	431	405	387	480	465	448
20	309	289	275	-	-	-	421	406	389	486	467	454
21	306	288	264	-	-	-	423	408	393	482	467	451
22	324	287	271	262	242	227	428	407	390	481	462	445
23	300	284	265	261	243	230	420	406	391	481	463	448
24	298	282	268	255	240	227	429	410	388	491	472	449
25	317	285	265	268	241	225	452	418	394	498	478	459
26	296	278	263	249	236	219	438	417	395	493	474	448
27	299	286	277	258	243	231	433	412	395	484	465	448
28	300	289	267	259	245	230	427	411	395	481	466	449
29	307	292	277	261	247	234	429	412	396	485	469	451
30	306	292	272	263	247	233	429	413	399	490	473	452
31	313	292	277	269	248	237	430	414	399	489	472	456
月間	324	284	260	(271)	(244)	(219)	452	415	387	498	467	443
標準偏差	8			(7)			9			8		
欠測率(%)	28.7			61.4			4.4			3.9		

-：有効データ数が1日の半数に満たないこと（日欠測）を示す。

(注) 1号機放水口モニター（A）の12月3日～10日及び12月15日～16日の日欠測は、定期点検によるものである。

1号機放水口モニター（B）の12月3日～21日の日欠測は、定期点検によるものである。

2号機放水口モニターの12月17日～18日の日欠測は、定期点検によるものである。

3号機放水口モニターの12月10日の日欠測は、定期点検によるものである。

（ ）は、有効データ数が当該月の半数に満たないことから、参考値扱いしたことを示す。

下線部は、日欠測時のデータが最大値となったものを示す。

令和7年度

(3) ダストモニタによる大気中の放射性物質の濃度
表3-3 大気中の放射性物質の全アルファ及び全ベータ放射能濃度測定結果

調査機関	局名	測定項目	項目	10月	11月	12月	過去4年度の測定値	単位
宮城県	飯子浜	全ベータ放射能濃度	平均値	1.51	1.83	1.58	1.33	Bq/m ³
			標準偏差	1.12	1.29	1.23	1.27	
			最大値	8.77	11.02	11.48	26.54	
			最小値	0.15	0.34	0.10	0.01	
		全アルファ放射能濃度	平均値	1.19	1.41	1.23	1.06	
			標準偏差	0.87	0.97	0.95	1.00	
			最大値	6.81	8.68	9.17	20.63	
			最小値	0.11	0.26	0.07	0.01	
		全ベータ／全アルファ放射能濃度比	平均値	1.26	1.29	1.27	1.25	
			標準偏差	0.06	0.07	0.08	0.10	
			最大値	1.58	1.56	1.59	2.83	
			最小値	1.08	1.10	1.10	0.22	
		欠測率		2.4	12.1	1.9		%
	鮫浦	全ベータ放射能濃度	平均値	1.50	1.71	1.57	1.28	Bq/m ³
			標準偏差	1.15	1.20	1.14	1.18	
			最大値	11.64	8.14	8.87	35.89	
			最小値	0.12	0.19	0.13	0.01	
		全アルファ放射能濃度	平均値	1.19	1.34	1.24	1.02	
			標準偏差	0.91	0.93	0.88	0.92	
			最大値	9.62	6.53	7.22	26.67	
			最小値	0.09	0.13	0.09	0.01	
		全ベータ／全アルファ放射能濃度比	平均値	1.26	1.28	1.27	1.25	
			標準偏差	0.07	0.08	0.08	0.10	
			最大値	1.61	1.66	1.55	4.92	
			最小値	1.08	1.06	1.06	0.42	
		欠測率		0.0	0.3	1.7		%

令和7年度

(4) 空間ガンマ線積算線量測定結果

表-3-4 (1) 蛍光ガラス線量計による積算線量測定結果 (宮城県調査分)

単位：mGy/90日

調査 機関	地点番号	測定地点名	令和7年度 第3四半期	前年度までの測定値 ^{*1}
				最小値～最大値（参考）
				（上段）S56年度～H22年度第3四半期 （下段）H24年度～R6年度 ^{*2}
宮 城	MP－ 1	出 島 ^{*3}	0.13	0.12 ～ 0.17 0.13 ～ 0.20
	MP－ 2	尾 浦 ^{*4}	0.12	0.11 ～ 0.15 0.13 ～ 0.17
	MP－ 3	桐 ケ 崎 ^{*3}	0.12	0.10 ～ 0.14 0.12 ～ 0.16
	MP－ 4	高 白 ^{*3}	0.12	0.10 ～ 0.14 0.12 ～ 0.18
	MP－ 5	大 石 原 ^{*3}	0.13	0.13 ～ 0.16 0.13 ～ 0.19
	MP－ 6	野 ヶ 浜 ^{*3}	0.14	0.12 ～ 0.17 0.14 ～ 0.19
	MP－ 7	大 谷 川 ^{*3}	0.14	0.11 ～ 0.14 0.14 ～ 0.17
	MP－ 8	十 八 成 浜 ^{*3}	0.14	— 0.14 ～ 0.17 ^{*5}
県	MP－ 9	泊 浜	0.14	0.15 ～ 0.21 0.14 ～ 0.21
	MP－10	桃 浦 ^{*3}	0.12	0.10 ～ 0.12 0.12 ～ 0.19
	MP－11	小 網 倉 ^{*3}	0.19	0.12 ～ 0.17 0.18 ～ 0.21
	MP－12	大 原 浜	0.11	0.11 ～ 0.15 0.11 ～ 0.17
	MP－13	女 川 M S	0.11	0.10 ～ 0.13 0.12 ～ 0.15
	MP－14	飯子浜M S ^{*4}	0.14	0.14 ～ 0.17 0.14 ～ 0.22
	MP－15	小屋取M S	0.13	0.13 ～ 0.17 0.14 ～ 0.20
	MP－16	寄 磯 M S	0.14	0.12 ～ 0.17 0.14 ～ 0.22
	MP－17	鮫 浦 M S	0.16	0.13 ～ 0.17 0.16 ～ 0.17 ^{*6}
	MP－18	谷 川 M S ^{*4}	0.15	0.12 ～ 0.16 0.15 ～ 0.20
	MP－19	荻 浜 M S ^{*4}	0.14	0.15 ～ 0.17 0.14 ～ 0.20

*1 福島第一原発事故の前後に分けて過去の測定値の範囲を表示した。

なお昭和56年度～平成22年度第3四半期測定値は、熱堂光線量計によるものである。

*2 平成22年度第4四半期～平成23年度第4四半期は震災の影響により測定機器が消失し欠測となった。

また、集落の被災状況や復旧工事等の影響により、欠測期間や代替箇所での測定期間がある。

*3 令和3年度第1四半期から更新した積算線量計収納設備により測定している。

*4 令和4年度第1四半期から更新した積算線量計収納設備により測定している。

*5 令和元年度第1四半期から測定を開始した。

*6 令和元年度第1四半期から測定を再開した。

表-3-4 (2) 蛍光ガラス線量計による積算線量測定結果(東北電力調査分)

単位: mGy/90日

調査 機関	地点番号	測定地点名	令和7年度 第3四半期	前年度までの測定値 ^{*1} 最小値～最大値(参考)
				(上段) S56年度～H22年度第3四半期 (下段) H22年度第4四半期～R6年度
東 北 電 力	MP-20	小屋取	0.15	0.14 ～ 0.17 0.15 ～ 0.38
	MP-21	牧浜	0.13	— 0.13 ～ 0.14 ^{*2}
	MP-22	横浦	0.16	0.12 ～ 0.15 0.15 ～ 0.26
	MP-23	女川	0.13	0.11 ～ 0.15 0.13 ～ 0.21
	MP-24	竹浦	0.14	0.11 ～ 0.15 0.12 ～ 0.17
	MP-25	寄磯	0.16	0.13 ～ 0.18 0.15 ～ 0.22
	MP-26	鮫浦	0.14	0.13 ～ 0.17 0.14 ～ 0.25
	MP-27	谷川	0.15	0.13 ～ 0.17 0.14 ～ 0.23
	MP-28	荻浜	0.18	0.13 ～ 0.17 0.14 ～ 0.31
	MP-29	塚浜 M S	0.16	0.15 ～ 0.18 0.15 ～ 0.41
	MP-30	寺間 M S	0.14	0.13 ～ 0.18 0.14 ～ 0.37
	MP-31	江島 M S	0.14	0.11 ～ 0.16 0.13 ～ 0.34
	MP-32	前網 M S	0.18	0.17 ～ 0.23 0.18 ～ 0.58

*1 福島第一原発事故の前後に分けて過去の測定値の範囲を表示した。
なお、昭和56年度～平成26年度測定値は、熱蛍光線量計によるものである。

*2 令和元年度第1四半期から測定を開始した。

(5) 移動観測車による空間ガンマ線量率測定結果

表-3-5 (1) 宮城県調査分

単位: nGy/h

調 査 年 月 日		R 7 年 11 月 21 日	
天 候		曇り	
No	地 点 名	測定値	前年度までの測定値*1 最小値～最大値 (参考)
			(上段) S60年度～H22年度第3四半期 (下段) H24年度～R6年度*2
1	女 川 駅 前	29.6	33.9 ～ 42.6 27.7 ～ 46.8
2	コ バ ル ト ラ イ ン 入 口	34.3	25.2 ～ 35.7 27.5 ～ 46.4
3	コ バ ル ト ラ イ ン 料 金 所 跡	35.0	24.3 ～ 35.7 32.9 ～ 53.3
4	大 六 天 駐 車 場	34.2	22.1 ～ 34.8 31.0 ～ 50.9
5	コ バ ル ト ラ イ ン 横 浦 西	45.0	27.5 ～ 39.2 42.4 ～ 66.5
6	コ バ ル ト ラ イ ン 大 石 原 西	48.9	31.8 ～ 49.7 43.9 ～ 78.1
7	コ バ ル ト ラ イ ン 野 々 浜 西	54.8	42.9 ～ 61.8 51.4 ～ 86.5
8	コ バ ル ト ラ イ ン 小 積 インター	56.1	38.3 ～ 55.8 54.8 ～ 133.0
9	コ バ ル ト ラ イ ン 小 積 展 望 所	39.3	27.0 ～ 38.2 36.7 ～ 50.5
10	コ バ ル ト ラ イ ン 大 谷 川 林 道	43.0	27.0 ～ 36.8 40.8 ～ 77.2
11	コ バ ル ト ラ イ ン 大 原 インター	43.9	28.7 ～ 46.8 40.5 ～ 76.8
12	水 産 技 術 総 合 セ ン タ ー 旧 養 殖 生 産 部 構 内	40.4	27.0 ～ 39.4 34.5 ～ 54.4
13	旧 大 谷 川 ポ ン プ 小 屋 付 近	35.4	27.0 ～ 39.8 34.0 ～ 54.2
14	宮 城 県 漁 業 協 同 組 合 旧 鮫 浦 支 所 前	38.8	24.7 ～ 37.4 37.6 ～ 48.2
15	付 替 県 道 牡 鹿 側 交 差 点	41.7	28.6 ～ 44.4 39.9 ～ 77.3
16	発 電 所 牡 鹿 ゲ ー ト	39.0	24.4 ～ 42.6 36.8 ～ 78.0
17	寄 磯 小 学 校 入 口	44.7	33.9 ～ 44.8 42.2 ～ 73.1
18	東 北 電 力 P R セ ン タ ー 前	36.7	24.7 ～ 35.7 33.6 ～ 56.0
19	小 屋 取 駐 車 場	35.2	24.6 ～ 35.7 31.0 ～ 47.4
20	旧 夏 浜 海 水 浴 場 前	36.9	23.5 ～ 33.1 33.6 ～ 52.8
21	旧 飯 子 浜 バ ス 停 前	32.8	20.0 ～ 31.5 29.6 ～ 50.6
22	野 々 浜 旧 六 小 ・ 四 中 前	38.4	27.0 ～ 43.1 40.3 ～ 63.0
23	横 浦 入 口	37.3	26.1 ～ 37.3 32.0 ～ 49.1
24	高 白	34.0	23.5 ～ 33.2 31.7 ～ 61.4

*1 測定地点を固定した昭和60年度からの測定値の範囲を福島第一原発事故の前後に分けて示す。

*2 平成22年度第4四半期～平成23年度第4四半期は、震災の影響により欠測となった。

また、集落の被災状況や復旧工事等の影響により、欠測期間や代替箇所での測定期間等がある。

表-3-5 (2) 東北電力調査分

単位: nGy/h

調 査 年 月 日		R 7 年 11 月 6 日	
天 候		晴れ	
No	地 点 名	測定値	前年度までの測定値*1 最小値～最大値 (参考)
			(上段) S60年度～H22年度 (下段) H23年度～R6年度
1	野々浜県道交差点	35.7 *2	33.1 ～ 47.9 31.2 ～ 73.9
2	大石原入口	48.2	42.9 ～ 54.8 45.2 ～ 114.1
3	横浦入口	35.7 *2	26.1 ～ 35.7 33.9 ～ 102.0
4	高白入口	29.8 *2	28.7 ～ 38.3 28.0 ～ 102.4
5	桐ヶ崎	30.5 *2	20.0 ～ 29.6 28.1 ～ 51.7
6	竹浦	32.8 *2	25.2 ～ 35.7 30.4 ～ 54.8
7	飯子浜入口	41.1	31.3 ～ 45.2 38.4 ～ 79.1
8	小積防波堤付近	42.5 *2	29.6 ～ 45.6 *3 39.2 ～ 110.7
9	荻浜	35.7 *2	30.5 ～ 40.1 33.7 ～ 67.8
10	発電所女川ゲート	36.4	31.8 ～ 40.9 33.5 ～ 101.6
11	付替県道第四駐車場	33.8	29.0 ～ 47.0 31.9 ～ 123.3
12	発電所牡鹿ゲート	32.4	25.2 ～ 33.3 30.6 ～ 100.7
13	寄磯岸壁	36.1 *2	24.7 ～ 31.3 33.8 ～ 53.4
14	鮫浦MP前	33.4 *2	32.2 ～ 45.2 31.7 ～ 92.9
15	大谷川ポンプ小屋前	35.7 *2	31.3 ～ 43.5 32.8 ～ 71.4
16	水産技術総合センター 旧養殖生産部前 (谷川)	42.4 *2	30.7 ～ 41.8 40.4 ～ 101.3
17	泊コミュニティセンター付近	50.2	44.5 ～ 59.2 48.6 ～ 107.0

*1 測定地点を固定した昭和60年度からの測定値範囲を福島第一原発事故の前後に分けて示す。

*2 震災の影響により、従来の測定地点付近において測定した。

*3 平成9年度第1四半期に測定地点を移動したが、旧地点のデータを含む。

(6) 環境試料の核種分析結果

ア ゲルマニウム半導体検出器による分析結果

表-3-6-1 月間降下物の核種分析結果(1)

単位: Bq/m²

調査機関		宮 城 県					
試 料 名		降 下 物					
		雨水・ちり					
採取地点		女川町浦宿浜 (女川オフサイトセンター)			仙台市宮城野区幸町 (環境放射線監視センター)		
採取期間		R7.10.1 ~ R7.11.4	R7.11.4 ~ R7.12.1	R7.12.1 ~ R8.1.5	R7.10.1 ~ R7.11.4	R7.11.4 ~ R7.12.1	R7.12.1 ~ R8.1.5
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	0.067±0.020	(0.063)	N D	N D	0.36±0.03	0.12±0.02
天然 核種	Be- 7	150±1	13.2±0.4	28.6±0.5	40.5±0.5	12.8±0.4	23.6±0.5
	K - 40	N D	N D	N D	(0.71)	(1.1)	N D
試料採取面積(m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		2.3	1.0	1.4	1.3	2.3	1.5
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考					対照地点		

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ () 書きで示す。

表-3-6-2 月間降下物の核種分析結果(2)

単位: Bq/m²

調査機関		東 北 電 力					
試 料 名		降 下 物					
		雨水・ちり					
採取地点		小 屋 取			牡 鹿 ゲ ー ト		
採取期間		R7.10.1 ~ R7.11.4	R7.11.4 ~ R7.12.1	R7.12.1 ~ R8.1.5	R7.10.1 ~ R7.11.4	R7.11.4 ~ R7.12.1	R7.12.1 ~ R8.1.5
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	0.14±0.02	0.094±0.015	0.057±0.014	0.11±0.02	0.072±0.016	0.082±0.015
天然 核種	Be- 7	82.2±0.7	14.4±0.3	23.7±0.4	131±1	14.1±0.3	33.0±0.4
	K - 40	1.1±0.2	(0.58)	N D	10.1±0.4	6.5±0.3	5.5±0.3
試料採取面積(m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		3.3	0.7	1.8	13.5	8.2	7.5
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考							

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ () 書きで示す。

表-3-6-3 四半期間降下物の核種分析結果

単位: Bq/m²

調査機関		宮 城 県			東 北 電 力	
試 料 名		降 下 物				
		雨水・ちり				
採取地点		飯子浜	鮫浦	谷川浜	塚浜	付替県道
採取期間		R7. 10. 1 ～ R8. 1. 5	R7. 10. 1 ～ R8. 1. 5	R7. 10. 1 ～ R8. 1. 5	R7. 10. 1 ～ R8. 1. 5	R7. 10. 1 ～ R8. 1. 5
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	0. 22±0. 05	0. 18±0. 04	0. 23±0. 06	0. 39±0. 05	0. 32±0. 04
天然 核種	Be- 7	88±1	103±1	81±1	45. 7±0. 8	55. 7±0. 9
	K - 40	4. 2±0. 7	(1. 9)	N D	8. 8±0. 6	3. 8±0. 6
試料採取面積 (m ²)		0. 1886	0. 1886	0. 1886	0. 173	0. 173
蒸発残渣量 (g/m ²)		6. 2	4. 4	4. 3	8. 4	6. 8
測定時間 (秒)		80000	80000	80000	80000	80000
備 考						

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ () 書きで示す。

表-3-6-4 農産物の核種分析結果(1)

単位: Bq/kg生

調査機関		宮城県	東北電力
試 料 名		精米	
		—	
採取地点		谷川浜	大原浜
採取月日		R7.11.4	R7.11.17
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D
	Co- 58	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D
	Co- 60	N D	N D
	Cs-134	N D	N D
	Cs-137	0.032±0.007	0.019±0.004
天然 核種	Be- 7	N D	N D
	K - 40	23.3±0.3	24.2±0.2
試料量(kg生)		4.99	5.00
測定時間(秒)		80000	80000
備 考			

表-3-6-5 農産物の核種分析結果(2)

単位: Bq/kg生

調査機関		宮 城 県				東 北 電 力							
試 料 名		大 根											
		根		葉		根		葉					
採取地点		女川浜		小湊浜		付替県道							
採取月日		R7. 11. 10		R7. 11. 10		R7. 11. 10		R7. 11. 10		R7. 10. 24		R7. 10. 24	
対 象 核 種	Mn- 54	N D		N D		N D		N D		N D		N D	
	Co- 58	N D		N D		N D		N D		N D		N D	
	Fe- 59	N D		N D		N D		N D		N D		N D	
	Co- 60	N D		N D		N D		N D		N D		N D	
	Cs-134	N D		N D		N D		N D		N D		N D	
	Cs-137	N D		N D		N D		N D		N D		(0.024)	
天然 核種	Be- 7	(0.19)		3.8±0.2		(0.22)		4.0±0.2		(0.13)		2.09±0.07	
	K - 40	67.1±0.4		78.5±0.7		90.6±0.5		95.0±0.8		119.0±0.4		116.3±0.6	
試料量(kg生)		4.99		2.00		5.00		2.00		5.01		2.01	
測定時間(秒)		80000		80000		80000		80000		80000		80000	
備 考													

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ()書きで示す。

表-3-6-6 陸水の核種分析結果

単位: mBq/L

調査機関		東北電力
試 料 名		陸水
		水道原水
採取地点		針浜
採取月日		R7.12.2
対 象 核 種	Mn- 54	N D
	Co- 58	N D
	Fe- 59	N D
	Co- 60	N D
	Cs-134	N D
	Cs-137	N D
天然 核種	Be- 7	N D
	K - 40	18±4
試料量(L)		20.0
測定時間(秒)		80000
備 考		

表-3-6-7 陸土の核種分析結果

単位: Bq/kg乾土

調査機関		東北電力
試料名		陸土
		未耕土
採取地点		牡鹿ゲート付近
採取月日		R7.12.1
対 象 核 種	Mn- 54	N D
	Co- 58	N D
	Fe- 59	N D
	Co- 60	N D
	Cs- 134	2.0±0.2
	Cs- 137	187±1
天然 核種	Be- 7	N D
	K- 40	427±7
換算係数*		32.3
試料量(g)		121
測定時間(秒)		80000
備考		

* 換算係数とは、Bq/kg乾土からBq/m²への換算乗数を表す。

表-3-6-8 浮遊じんの核種分析結果(1)

単位: mBq/m³

調査機関		宮 城 県					
試料名		浮遊じん					
採取地点		女川MS			寄磯MS		
採取期間		R7.9.30 ～ R7.10.31	R7.10.31 ～ R7.11.27	R7.11.27 ～ R7.12.25	R7.9.30 ～ R7.10.31	R7.10.31 ～ R7.11.27	R7.11.27 ～ R7.12.25
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	N D	N D	N D
天然核種	Be-7	3.5±0.1	2.9±0.1	2.6±0.1	3.1±0.1	3.0±0.1	2.6±0.1
	K-40	N D	N D	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)		1214	1129	1166	1423	1218	1223
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考							

表-3-6-9 浮遊じんの核種分析結果(2)

単位: mBq/m³

調査機関		東 北 電 力					
試料名		浮遊じん					
採取地点		塚浜MS			前網MS		
採取期間		R7.10.1 ～ R7.11.4	R7.11.4 ～ R7.12.1	R7.12.1 ～ R8.1.5	R7.10.1 ～ R7.11.4	R7.11.4 ～ R7.12.1	R7.12.1 ～ R8.1.5
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	N D	N D	N D
天然核種	Be-7	3.37±0.03	3.54±0.05	2.19±0.03	3.64±0.04	3.62±0.05	2.18±0.03
	K-40	N D	N D	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)		7498	5857	7537	7086	5898	7664
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考							

表-3-6-10 浮遊じんの核種分析結果(3)

表-3-6-11 指標植物の核種分析結果

単位: mBq/m³

調査機関		東北電力	
試料名		浮遊じん	
採取地点		寺間MS	江島MS
採取期間		R7. 9. 22 ～ R7. 12. 23	R7. 9. 22 ～ R7. 12. 23
対象核種	Mn- 54	N D	N D
	Co- 58	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D
	Co- 60	N D	N D
	Cs-134	N D	N D
	Cs-137	N D	N D
天然核種	Be- 7	2.58±0.02	2.61±0.02
	K - 40	N D	N D
試料量(m ³)		18474	17822
測定時間(秒)		80000	80000
備考			

単位: Bq/kg生

調査機関		東北電力		
試料名		松葉		
採取地点		小屋取	牡鹿ゲート付近	付替県道
採取月日		R7. 11. 13	R7. 11. 14	R7. 11. 14
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D
	Cs-137	0.24±0.01	0.232±0.009	0.28±0.01
天然核種	Be- 7	42.5±0.3	50.8±0.3	50.9±0.4
	K - 40	64.5±0.5	73.8±0.5	79.8±0.5
試料量(kg生)		2.00	2.00	2.01
測定時間(秒)		80000	80000	80000
備考				

表-3-6-12 魚介類の核種分析結果(1)

単位: Bq/kg生

調査機関		宮城県	東北電力
試料名		エゾアワビ	アイナメ
		軟体部 (除内臓)	皮・筋肉
採取地点		放水口付近	前面海域
採取月日		R7. 12. 22	R7. 10. 14
対象核種	Mn- 54	N D	N D
	Co- 58	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D
	Co- 60	N D	N D
	Cs-134	N D	N D
	Cs-137	(0.037)	0.100±0.009
天然核種	Be- 7	0.59±0.13	N D
	K - 40	59.3±0.7	116.0±0.7
試料量(kg生)		2.00	1.51
測定時間(秒)		80000	80000
備考			

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ()書きで示す。

表－３－６－１３ 魚介類の核種分析結果（２）

単位：Bq/kg生

調査機関		宮 城 県				東北電力
試 料 名		マガキ				
		軟体部				
採取地点		野々浜	尾浦	分浜	気仙沼	飯子浜
採取月日		R7. 10. 28	R7. 11. 10	R7. 11. 11	R7. 11. 11	R7. 10. 27
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	0.039±0.013	N D	N D	N D	0.038±0.007
天然 核種	Be- 7	1.2±0.1	1.2±0.1	1.9±0.2	1.8±0.1	1.54±0.08
	K - 40	66.6±0.7	63.4±0.7	71.8±0.7	82.1±0.8	56.8±0.5
試料量(kg生)		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000
備 考					対照地点	

表－３－６－１４ 海水の核種分析結果（１）

単位：mBq/L

調査機関		宮 城 県			
試 料 名		海 水			
		表層水			
採取地点		放水口付近		鮫浦湾	気仙沼湾
採取月日		R7. 11. 17		R7. 11. 20	R7. 10. 9
処理方法		共沈法	迅速法	共沈法	共沈法
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	3.0±0.8	(2.3)
天然 核種	Be- 7		N D		
	K - 40		11300±500		
参考 核種	I- 131		N D		
試料量(L)		20.0	2.0	20.0	20.0
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備 考					対照地点

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

表－３－６－１５ 海水の核種分析結果（２）

単位：mBq/L

調査機関		東 北 電 力			
試 料 名		海 水			
		表層水			
採取地点		放水口付近			取水口付近
採取月日		R7. 10. 23		R7. 12. 9	R7. 10. 23
処理方法		共沈法	迅速法	迅速法	共沈法
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	(2. 0)
天然 核種 参考 核種	Be- 7		N D	N D	
	K - 40		11700±400	11500±400	
	I- 131		N D	N D	
試料量(L)		20. 0	2. 0	2. 0	20. 0
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備 考					

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

表－３－６－１６ 海底土の核種分析結果

単位：Bq/kg乾土

調査機関		宮 城 県			東北電力	
試 料 名		海底土				
		表層土				
採取地点		放水口付近	鮫浦湾	気仙沼湾	放水口付近	取水口付近
採取月日		R7. 11. 17	R7. 11. 20	R7. 10. 9	R7. 10. 23	R7. 10. 23
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	3.9±0.3	2.2±0.3	(0.53)	2.8±0.2
天然 核種	Be- 7	N D	N D	(7.7)	5.4±1.0	11±1
	K - 40	410±8	470±9	328±8	424±6	574±7
試料量(g乾土)		131	115	111	148	149
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000
備 考				対照地点		

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

表-3-6-17 指標海産物の核種分析結果(1)

単位: Bq/kg生

調査機関			宮 城 県			東 北 電 力		
試 料 名			ア ラ メ					
			葉 部					
採取地点			放水口付近	牡鹿半島北側	牡鹿半島西側	前面海域	周辺海域	牡鹿半島南側
採取月日			R7.11.11	R7.11.6	R7.11.6	R7.11.11	R7.12.10*	R7.11.19
灰 化 法	対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
		Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
		Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
		Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
		Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
		Cs-137	N D	0.13±0.03	(0.096)	(0.063)	0.084±0.018	(0.061)
	天然 核種	Be- 7	1.8±0.4	1.7±0.4	(1.2)	1.1±0.2	1.2±0.2	2.3±0.2
		K - 40	303±2	312±2	369±2	375±2	399±2	327±1
	試料量 (kg生)		1.20	1.20	1.20	1.50	1.50	1.50
	測定時間 (秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
迅 速 法	参 考 核 種	I- 131	N D	N D	(0.12)	N D	N D	N D
		試料量 (kg生)	1.96	1.92	1.82	1.91	1.77	1.76
		測定時間 (秒)	80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考				対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.15±0.04	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.15±0.04	迅速法における その他検出核種 Cs-137: (0.094)	迅速法における その他検出核種 Cs-137: (0.099)	対照海域

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ()書きで示す。

* 環境放射能測定実施計画では11月の予定であったが、波が高い日が続いたため12月に延期して採取した。

表-3-6-18 指標海産物の核種分析結果(2)

単位: Bq/kg生

調査機関		宮 城 県
試 料 名		ムラサキイガイ
		軟体部
採取地点		前面海域
採取月日		R7.10.6
対 象 核 種	Mn- 54	N D
	Co- 58	N D
	Fe- 59	N D
	Co- 60	N D
	Cs-134	N D
	Cs-137	N D
天 然 核 種	Be- 7	2.8±0.2
	K - 40	69.0±0.7
試料量(kg生)		2.00
測定時間(秒)		80000
備 考		

イ Sr (ストロンチウム)-90 の分析結果

表-3-6-19 Sr-90 の分析結果

調査機関	試料名	部位	採取地点	採取年月日	Sr-90 濃度		Ca 濃度 (g/kg生)	Sr 単位 (Bq/g・Ca)
					測定値	単位		
宮城県	精米	—	谷川浜	R7.11.4	N D	Bq/kg生	0.05	N D
	マガキ	軟体部	野々浜	R7.10.28	N D	Bq/kg生	0.37	N D
	マガキ	軟体部	気仙沼 (対照地点)	R7.11.11	N D	Bq/kg生	0.38	N D
東北電力	精米	—	大原浜	R7.11.17	N D	Bq/kg生	0.04	N D
	陸土	未耕土	牡鹿ゲート付近	R7.12.1	1.1±0.2	Bq/kg乾土		
	アイナメ	皮・筋肉	前面海域	R7.10.14	N D	Bq/kg生	1.46	N D
	海底土	表層土	放水口付近	R7.10.23	N D	Bq/kg乾土		

ウ H-3 (トリチウム) の分析結果

表-3-6-20 H-3 の分析結果

調査機関	試料名		採取地点	採取年月日	H-3 濃度	
					測定値	単位
宮城県	海水	表層水	放水口付近	R7.11.17	N D	mBq/L
			気仙沼湾 (対照地点)	R7.10.9	N D	
東北電力	陸水	水道原水	針浜	R7.12.2	400±100	

4. 女川原子力発電所の運転状況

(1) 1号機の廃止措置の状況

H30/12/21 運転終了
R2/3/18 廃止措置計画認可
R2/7/28～ 廃止措置作業（核燃料物質による汚染の除去）に着手
R2/8/3～ 「核燃料物質の搬出」，「汚染状況の調査」，「設備の解体撤去」に係る詳細な検討に着手


(2) 2号機の運転状況

項目 \ 月	10月	11月	12月	計
発電日数 (日)	31	30	31	92
発電時間数 (時間)	744	720	744	2,208
電力量 (発電端) (10^3 kWh)	619,525	600,642	620,163	1,840,330
最大電力 (kW)	834,000	835,000	836,000	836,000
時間稼働率 ^{*1} (%)	100.0	100.0	100.0	100.0
設備利用率 ^{*2} (%)	100.9	101.1	101.0	101.0
備 考	R7/12/5 19:02～R7/12/8 6:57 潮位低下に伴う発電機出力抑制 R7/12/19 17:01～R7/12/22 7:00 潮位低下に伴う発電機出力抑制			

MW			定格熱出力一定運転中
800			
600			
400			
200			
0			
	10月	11月	12月

(3) 3号機の運転状況

項目 \ 月	10月	11月	12月	計
発電日数 (日)	0	0	0	0
発電時間数 (時間)	0	0	0	0
電力量 (発電端) (10^3 kWh)	0	0	0	0
最大電力 (kW)	0	0	0	0
時間稼働率*1 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
設備利用率*2 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
備 考	H23/3/11 地震による原子炉自動停止 H23/9/10～ 第7回定期事業者検査			



*1 時間稼働率 = (発電時間 / 暦時間) × 100 (%)

*2 設備利用率 = (発電電力量 / (認可出力 × 暦時間)) × 100 (%)

(4) 放射性廃棄物の管理状況

単位:Bq

	放射性気体廃棄物						放射性液体廃棄物					
	放射性希ガス *1			I-131 *2			H-3を除く *3			H-3		
	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号
令和7年 10月～12月	N D	N D	N D	N D	N D	N D	*4 ---	N D	*4 ---	*4 ---	2.5×10^9	*4 ---
令和7年度 累計	N D	N D	N D	N D	N D	N D	*4 ---	N D	*4 ---	*4 ---	2.9×10^9	*4 ---
	N D			N D			N D			2.9×10^9		
年間放出 管理目標値 *5	2.3×10^{15}			4.1×10^{10}			7.4×10^9			*6		

*1 測定下限濃度は 2×10^{-2} Bq/cm³である。*2 測定下限濃度は 7×10^{-9} Bq/cm³である。*3 測定下限濃度は 2×10^{-2} Bq/cm³である。(60Coで代表した。)

*4 ---は当該号機放水路からの放射性廃棄物の放出がなかったことを表す。

*5 放出管理目標値は原子炉設置変更許可申請書において設定した値。また、原子炉施設保安規定で定める値である。

*6 原子炉施設保安規定で定める放出管理の基準値は年間 7.4×10^{12} Bqである。

(5) モニタリングポスト測定結果


(単位 nGy/h)

	10月				11月				12月				過去の 測定値範囲*1	
	最大	平均	最小	標準 偏差	最大	平均	最小	標準 偏差	最大	平均	最小	標準 偏差	最大	最小
MP-1	64	37	34	3.4	48	37	34	1.1	58	37	35	2.4	70 63	32 34
MP-2	60	34	31	3.2	43	34	31	1.1	54	34	32	2.3	65 63	25 31
MP-3	65	36	33	3.6	46	35	33	1.1	57	36	33	2.5	69 66	30 32
MP-4	64	35	32	3.7	48	35	32	1.4	56	35	32	2.5	67 64	30 31
MP-5	68	43	40	3.1	54	43	41	1.1	65	44	41	2.4	68 67	29 33
MP-6	73	43	40	3.7	55	43	40	1.2	67	43	41	2.7	81 71	44 39
備考	測定器：2" φ×2" NaI (Tl)シンチレーション検出器 温度補償型 ・定期点検による欠測 MP-1：10/23 (3個)、12/8 (36個)、MP-2：10/21 (6個)、10/23 (3個)、12/5 (39個)、 MP-3：10/24 (3個)、12/4 (34個)、MP-4：10/24 (4個)、12/3 (38個)、MP-5：10/24 (4個)、12/2 (40個)、 MP-6：10/23 (5個)、12/1 (38個)													


*1上段：平成21年4月～平成23年3月11日までの測定値の範囲を示す（福島第一原発事故前）。

下段：令和5年4月～令和7年3月までの測定値の範囲を示す（福島第一原発事故後）。

なお、MP-5の過去の測定値範囲は、移設工事前の測定値の範囲を含む。

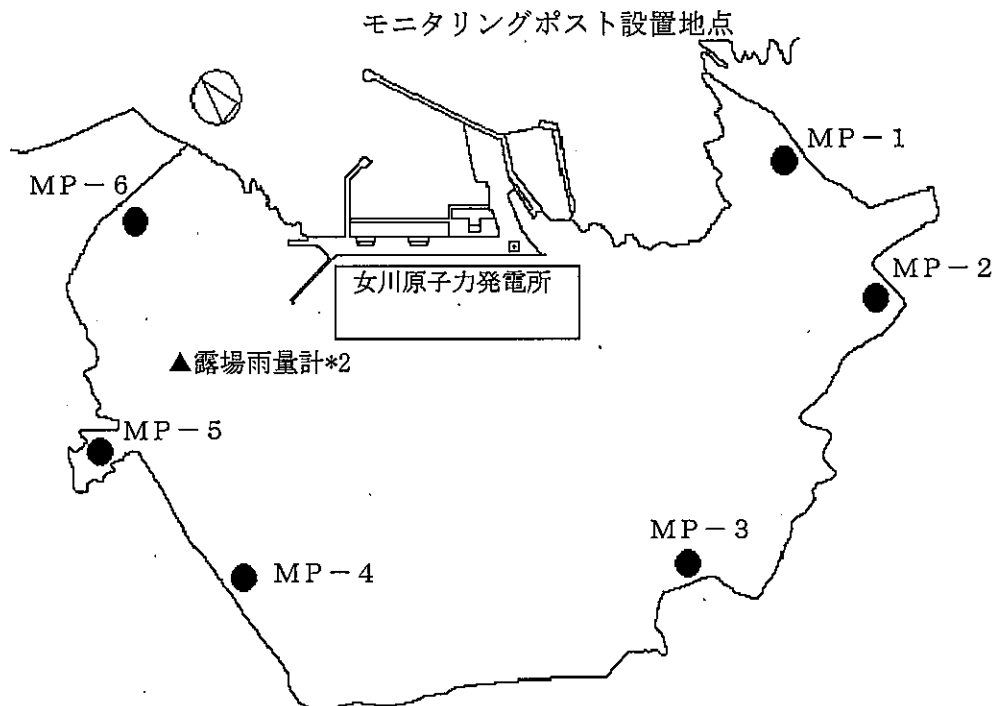


*2次ページ以降の各モニタリングポストの時系列グラフ中に記載した降水量データは、▲で示した地点に設置した雨量計によって測定した。

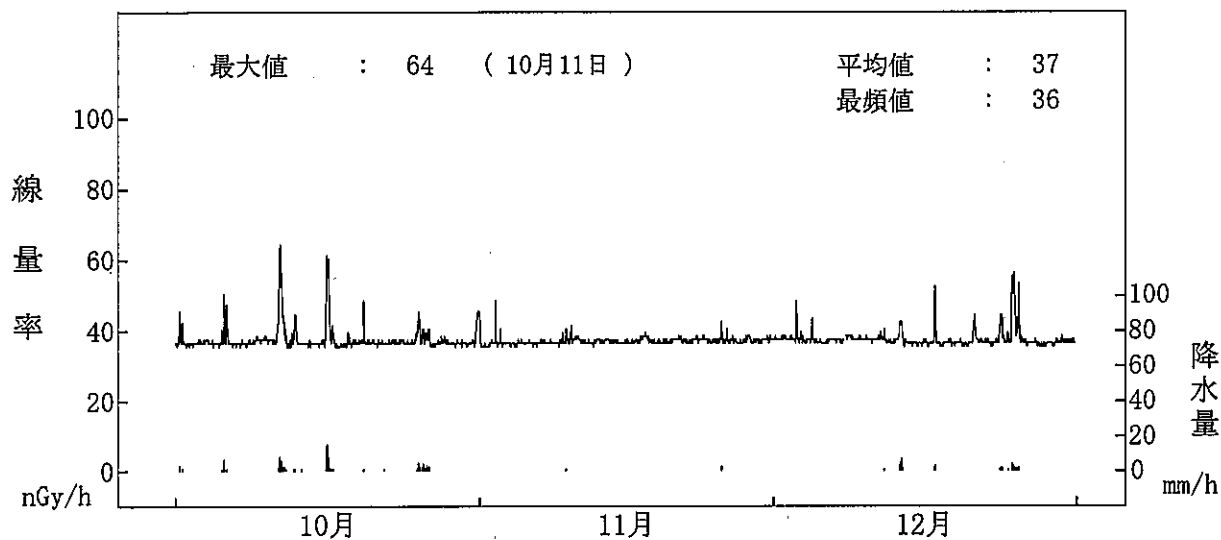

空間ガンマ線量率監視結果(MP-1)


(注) 12月8日の欠測は、定期点検によるものである。

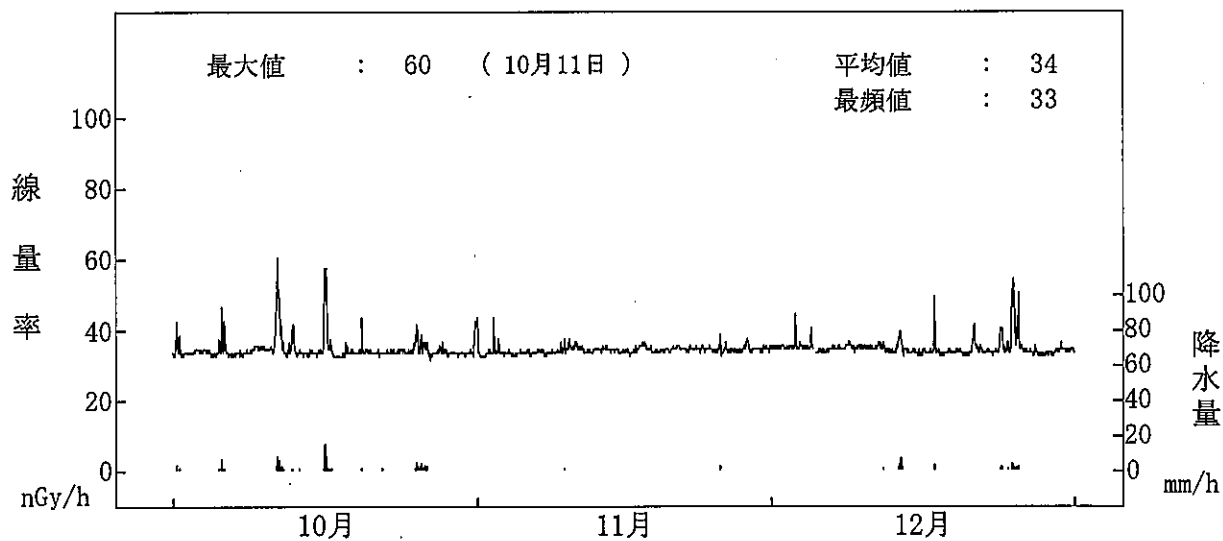

空間ガンマ線量率監視結果(MP-2)


(注) 12月5日の欠測は、定期点検によるものである。

令和7年度

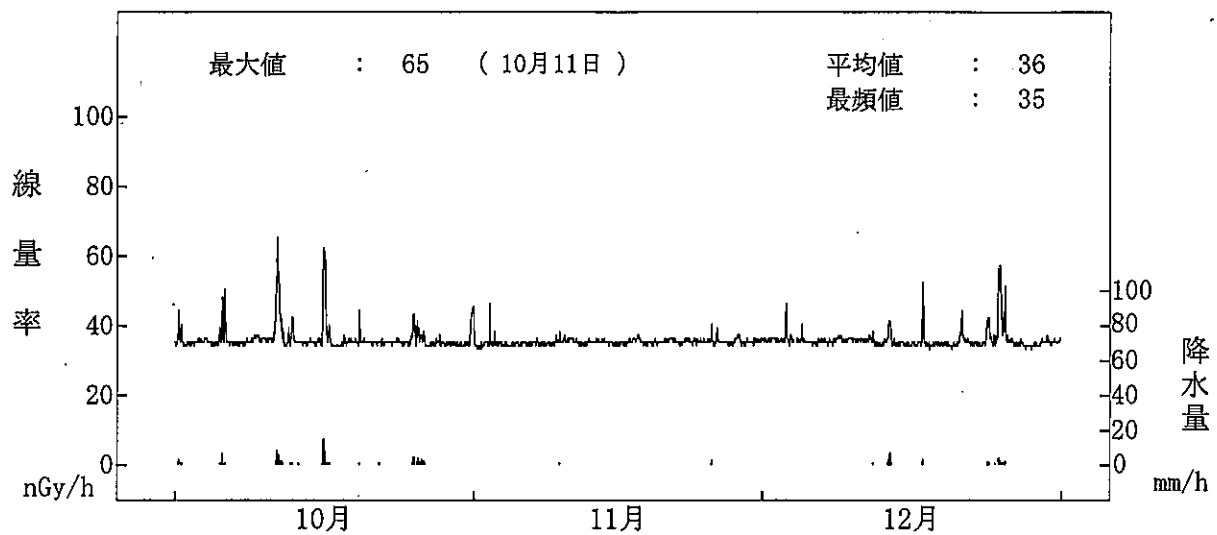

空間ガンマ線量率監視結果(MP-3)


(注) 12月4日の欠測は、定期点検によるものである。

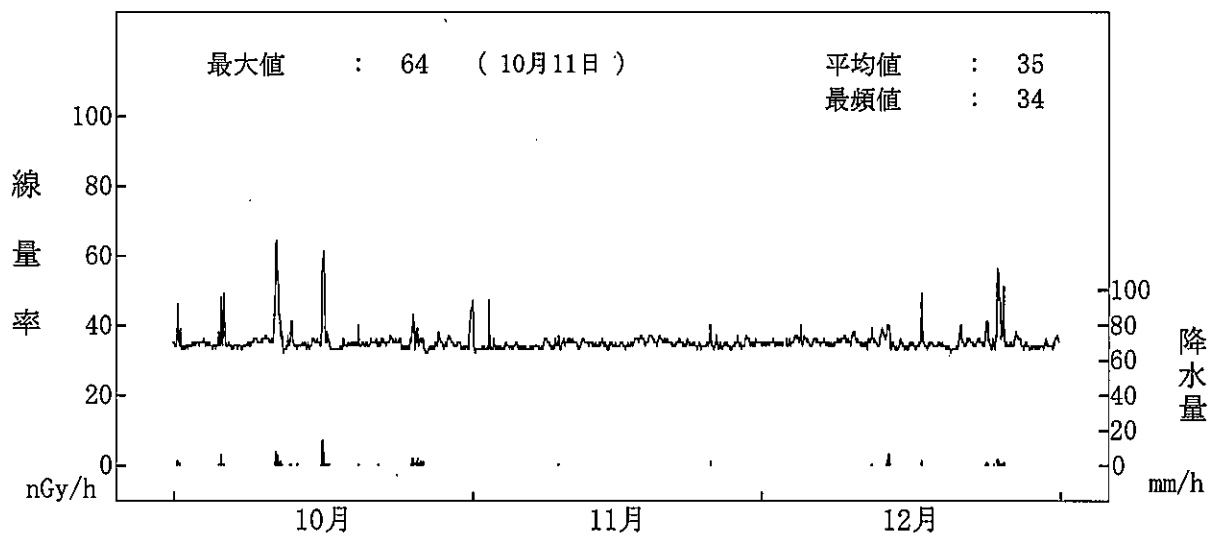

空間ガンマ線量率監視結果(MP-4)


(注) 12月3日の欠測は、定期点検によるものである。

令和7年度

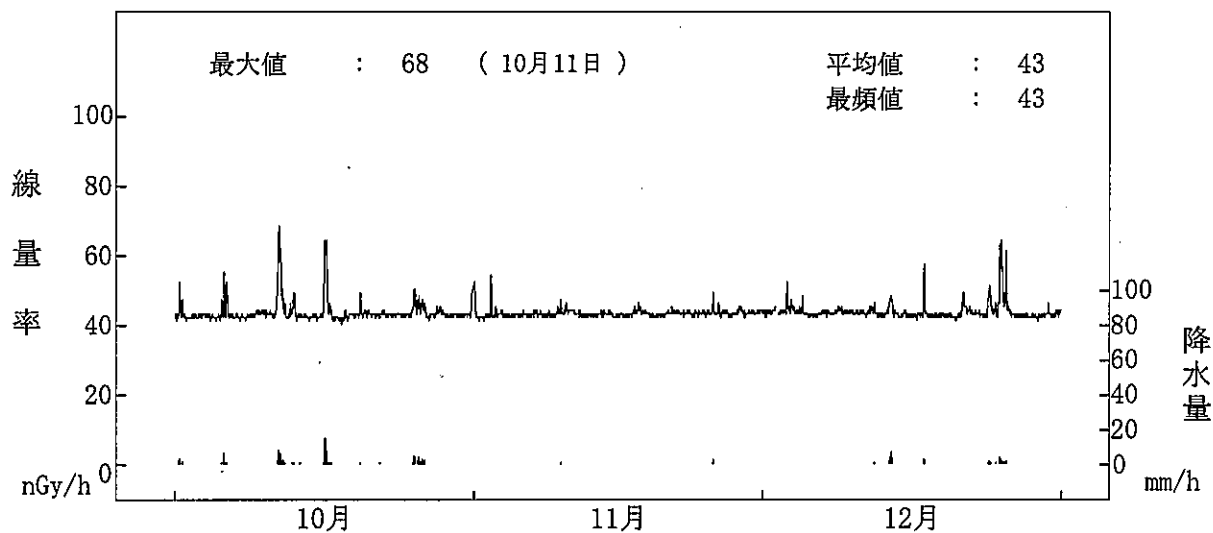

空間ガンマ線量率監視結果(MP-5)

(注) 12月2日の欠測は、定期点検によるものである。

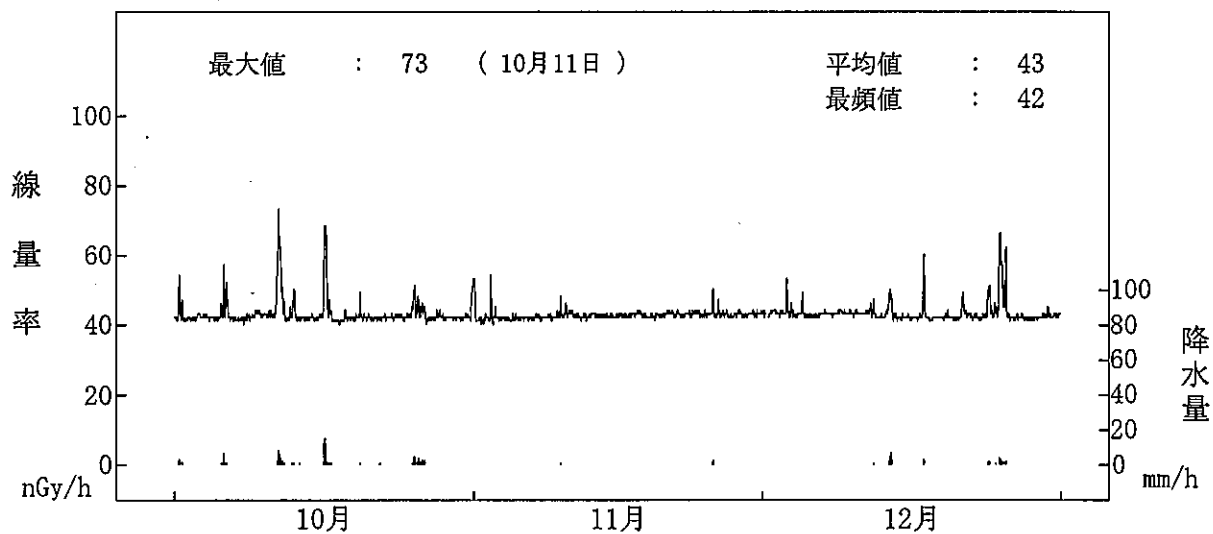

空間ガンマ線量率監視結果(MP-6)

(注) 12月1日の欠測は、定期点検によるものである。

令和7年度
