宮城県

R2.9月末現在

令和元年10月東日本台風による決壊箇所の進捗状況

完　成　12箇所
未完成　6箇所

決壊河川数	箇所数
18河川	36箇所

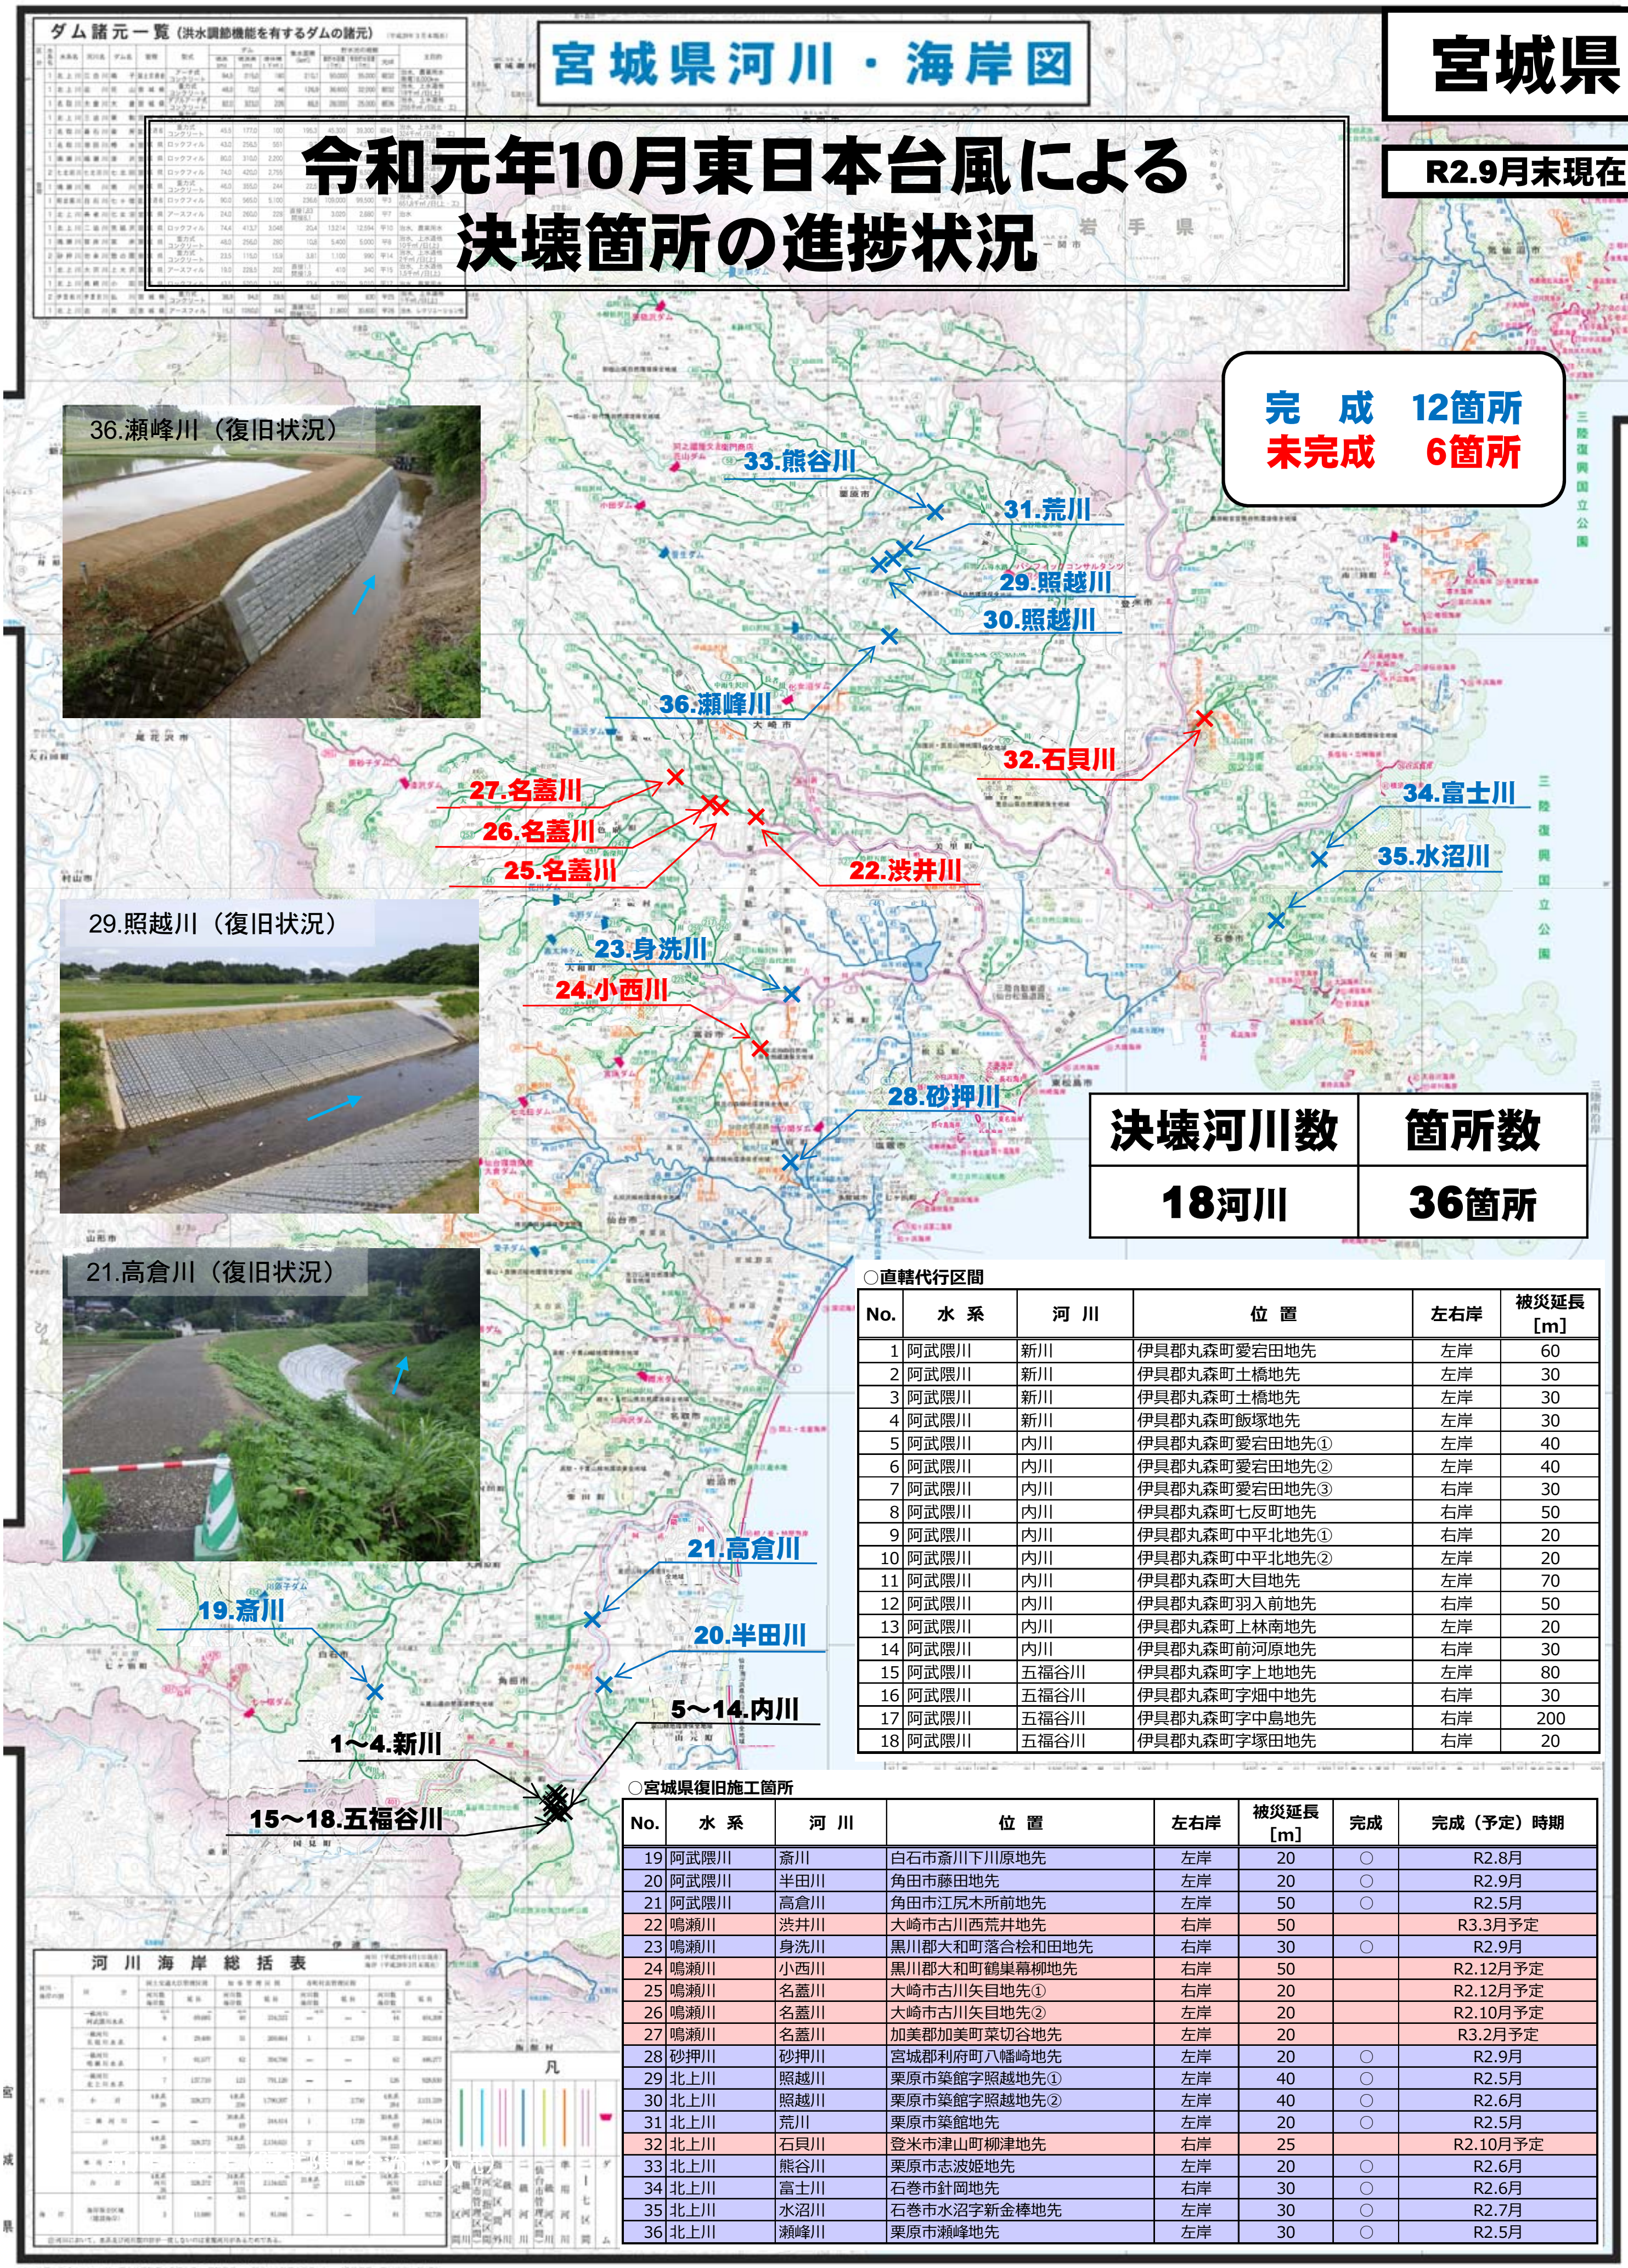
宮城県河川・海岸図
ダム諸元一覧（洪水調節機能を有するダムの諸元）
岩手県
三陸復興国立公園
33.熊谷川
31.荒川
29.照越川
30.照越川
36.瀬峰川
32.石貝川
27.名蓋川
26.名蓋川
25.名蓋川
22.渋井川
34.富士川
35.水沼川
23.身洗川
24.小西川
28.砂押川
21.高倉川
19.斎川
20.半田川
5～14.内川
1～4.新川
15～18.五福谷川
河川海岸総括表
凡
1:200,000

36.瀬峰川（復旧状況）

29.照越川（復旧状況）

21.高倉川（復旧状況）

○直轄代行区間

No.	水系	河川	位置	左右岸	被災延長[m]
1	阿武隈川	新川	伊具郡丸森町愛宕田地先	左岸	60
2	阿武隈川	新川	伊具郡丸森町土橋地先	左岸	30
3	阿武隈川	新川	伊具郡丸森町土橋地先	左岸	30
4	阿武隈川	新川	伊具郡丸森町飯塚地先	左岸	30
5	阿武隈川	内川	伊具郡丸森町愛宕田地先①	左岸	40
6	阿武隈川	内川	伊具郡丸森町愛宕田地先②	左岸	40
7	阿武隈川	内川	伊具郡丸森町愛宕田地先③	右岸	30
8	阿武隈川	内川	伊具郡丸森町七反町地先	右岸	50
9	阿武隈川	内川	伊具郡丸森町中平北地先①	右岸	20
10	阿武隈川	内川	伊具郡丸森町中平北地先②	左岸	20
11	阿武隈川	内川	伊具郡丸森町大目地先	左岸	70
12	阿武隈川	内川	伊具郡丸森町羽入前地先	右岸	50
13	阿武隈川	内川	伊具郡丸森町上林南地先	左岸	20
14	阿武隈川	内川	伊具郡丸森町前河原地先	右岸	30
15	阿武隈川	五福谷川	伊具郡丸森町字上地地先	左岸	80
16	阿武隈川	五福谷川	伊具郡丸森町字畑中地先	右岸	30
17	阿武隈川	五福谷川	伊具郡丸森町字中島地先	右岸	200
18	阿武隈川	五福谷川	伊具郡丸森町字塚田地先	右岸	20

○宮城県復旧施工箇所

No.	水系	河川	位置	左右岸	被災延長[m]	完成	完成（予定）時期
19	阿武隈川	斎川	白石市斎川下川原地先	左岸	20	○	R2.8月
20	阿武隈川	半田川	角田市藤田地先	左岸	20	○	R2.9月
21	阿武隈川	高倉川	角田市江尻木所前地先	左岸	50	○	R2.5月
22	鳴瀬川	渋井川	大崎市古川西荒井地先	右岸	50		R3.3月予定
23	鳴瀬川	身洗川	黒川郡大和町落合桧和田地先	右岸	30	○	R2.9月
24	鳴瀬川	小西川	黒川郡大和町鶴巣幕柳地先	右岸	50		R2.12月予定
25	鳴瀬川	名蓋川	大崎市古川矢目地先①	右岸	20		R2.12月予定
26	鳴瀬川	名蓋川	大崎市古川矢目地先②	左岸	20		R2.10月予定
27	鳴瀬川	名蓋川	加美郡加美町菜切谷地先	左岸	20		R3.2月予定
28	砂押川	砂押川	宮城郡利府町八幡崎地先	左岸	20	○	R2.9月
29	北上川	照越川	栗原市築館字照越地先①	左岸	40	○	R2.5月
30	北上川	照越川	栗原市築館字照越地先②	左岸	40	○	R2.6月
31	北上川	荒川	栗原市築館地先	左岸	20	○	R2.5月
32	北上川	石貝川	登米市津山町柳津地先	右岸	25		R2.10月予定
33	北上川	熊谷川	栗原市志波姫地先	左岸	20	○	R2.6月
34	北上川	富士川	石巻市針岡地先	右岸	30	○	R2.6月
35	北上川	水沼川	石巻市水沼字新金棒地先	左岸	30	○	R2.7月
36	北上川	瀬峰川	栗原市瀬峰地先	左岸	30	○	R2.5月
