

設計業務等委託契約における 設計変更ガイドライン

(平成26年11月以降)
平成29年10月以降

宮城県 土木部

目 次

1	ガイドライン策定の背景と目的	1
2	設計変更の基本事項	2
	(1) 設計変更の対象とならないケース	
	(2) 設計変更の対象となるケース	
	(3) 変更の指示・設計変更にあたっての留意事項	
3	設計変更の具体例	5
	(1) 設計図書に誤りゆう又は脱漏がある場合の例	
	(2) 設計図書の表示が明確でない場合の例	
	(3) 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する場合の例	
	(4) 発注者が必要であると認め、設計図書の内容を変更する場合の例	
	(5) 業務中止の場合の例	
	(6) 受注者の請求による履行期間の延長の場合の例	
	(7) 発注者の請求による履行期間の短縮の場合の例	
4	設計変更手続きフロー	10
	(1) 設計変更の手続き (全般)	
	(2) 契約書第 18 条 (条件変更等) 関係の手続き	
	(3) 契約書第 19 条 (設計図書等の変更) 関係の手続き	
	(4) 契約書第 20 条 (業務の中止) 関係の手続き	
5	その他関連事項	15
	(1) 「設計図書の点検」の範囲	
	(2) 「設計図書の点検」の範囲をこえるもの	
	(3) 既存設計等の誤りに関する取扱い	
	(4) 指定・任意の正しい運用	
6	参考資料	17
	(1) 設計等業務委託契約書抜粋	
	(2) 共通仕様書抜粋	

1 ガイドライン策定の背景と目的

宮城県土木部は、県民の生活や経済活動の基盤となる道路、河川、港湾、下水道、公園などの様々な社会資本の整備を進めている。

地形・地質・環境等の自然条件や地元・関係機関との協議等を考慮の上、安全性・経済性を追求し、最適な構造物を建設するためには、測量・調査・設計の業務を適切に行われることが不可欠であり、重要な業務（以下、「設計業務等」）となっている。

設計業務等は、発注者が業務の基本的な方針を明確に示し、受注者はその方針に基づき、自らの技術力や応用力を発揮して取り組み、発注者と受注者が協働することにより高品質な成果品を作成することができる。良好な成果品を作成するためには、発注設計書における適正な条件明示のみならず、履行条件の変化に伴う適切な設計変更を行うことが重要となる。

本ガイドラインは、委託契約書等を踏まえ、宮城県土木部が発注する設計業務等（公共建築を除く）において、設計変更を行う際の発注者及び受注者双方の留意点や設計変更を行う事例を明示することで、契約変更事務の円滑化及び適正化を図ることを目的にしている。

なお、本ガイドラインは、関係法令や諸基準等の改定などを踏まえ、変更していくこととしている。

2 設計変更の基本事項

(1) 設計変更の対象とならないケース

以下の場合、原則として設計変更はできない。(ただし、災害等緊急時はこの限りではない【契約書第26条(臨機の措置)】)

- ① 設計図書に条件明示のない事項において、発注者との「協議」を行う前に、又は発注者からの「指示」等の通知がなく、受注者が独自に判断して業務を実施した場合
- ② 発注者と「協議」をしているが、回答がない時点で業務を実施した場合
- ③ 「承諾」で実施した場合
- ④ 設計業務等委託契約書及び共通仕様書(建設関連業務)に定められている所定の手続きを経していない場合(契約書第 18 条～25 条、共通仕様書各条文(設計業務_第 1121 条～1124 条、測量業務_第 122 条～125 条、地質・土質調査業務_第 122 条～125 条)
- ⑤ 正式な書面によらない事項(口頭のみ指示・協議等)の場合
(補足)ただし、緊急を要する場合その他の理由により発注者(調査職員)が口頭による指示等を行った場合はこの限りではない。この場合、発注者は口答指示をした業務内容について書面に記載し、7日以内に交付しなければならない。

(2) 設計変更の対象となるケース

以下に該当する場合は、所定の手続きを踏むことで、設計変更が可能である。

◆設計業務等委託契約書第17条(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)に該当

- ① 受注者が実施した業務の内容について、発注者が修補を請求した場合において、当該不適合が発注者の指示によるとき、その他発注者の責めに帰すべき事由による場合
(補足)発注者は、自らの指示により不適合が生じたと判断される場合には、必要に応じ、履行期間又は業務委託料を変更するとともに、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

◆設計業務等委託契約書第18条(条件変更等)に該当

- ① 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合
- ② 設計図書に誤びゅう又は脱漏がある場合
- ③ 設計図書の表示が明確でない場合
- ④ 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する場合
- ⑤ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合

◆設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に該当

- ① 発注者から設計図書等の変更に係る指示の変更内容を通知した場合

◆設計業務等委託契約書第20条(業務の中止)に該当

- ① 受注者の責めに帰すことができない自然的又は人為的事象により、作業現場の状態が著しく変動し、受注者が業務を一時的に継続できないと認められる場合
- ② 発注者が、必要に応じて業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止する場合
(補足)発注者は必要に応じて履行期間又は業務委託料を変更する。また、受注者から業務の続行に備えるための増加費用の負担について発注者に協議が行われた場合や受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担を行う。

◆設計業務等委託契約書第21条(業務に係る受注者の提

- ① 受注者から技術的提案がなされ、発注者が認めた場合
(補足)設計図書等において、受注者から技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項の提案がなされ、発注者が当該業務の履行において必要と認め、業務の変更・追加を通知した場合。

◆設計業務等委託契約書第22条(受注者の請求による履行期間の延長)に該当

- ① 受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了できない場合
(補足)発注者は、必要に応じ履行期間を延長しなければならない。その理由が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、必要に応じ業務委託料を変更するとともに、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

◆設計業務等委託契約書第23条(発注者の請求による履行期間の短縮等)に該当

- ① 発注者が特別な理由により履行期間を短縮する必要がある場合
(補足)発注者は、必要に応じ業務委託料を変更するとともに、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

◆その他

- ① 受注者が行うべき「設計図書の点検」の範囲を超える作業を実施する場合
(補足)共通仕様書(設計業務 第1105条, 測量業務 第107条, 地質・土質調査業務 第106条)の「設計図書の支給及び点検」は、既存成果の応力計算や図面の修正まで求めるものではない。

(3) 変更の指示・設計変更にあたっての留意事項

◆発注者及び受注者に共通する留意事項

設計業務等の委託契約は、発注者及び受注者が対等な立場でそれぞれの役割分担を適切に行った上で履行されるものであり、設計変更内容についても両者が合意し契約を締結することが不可欠である。

- ① 業務の履行に必要な設計条件等について、確認を行う。
- ② 業務工程の共有や速やかかつ適切な回答に努める。
- ③ 設計変更を行う必要が生じた場合など、必要な指示、協議等は、書面で行う(契約書第2条第1項)
- ④ 緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者ともに指示、協議等を口頭で行うことができるが、7日以内に書面で交付しなければならない(契約書第2条第2項)。
- ⑤ 設計変更後の業務委託料や履行期間は、受注者と協議の上、決定する(契約書第24条、第25条)。

◆発注者の留意事項

設計業務等の履行は、設計図書に従い行われるため、発注者は、受注者が業務の目的に沿った適切な履行ができるよう、次の事項に留意しなければならない。

- ① 業務の履行に必要な条件(必要に応じて維持管理に係る条件を含めるものとする。)を明示した仕様書を適切に作成する。
- ② 業務履行中に変更の必要が生じた場合には、受注者に対して書面により適切な指示を速やかに行わなければならない。

◆受注者の留意事項

受注者は、業務の目的を達せられるよう、次の事項に留意しなければならない。

- ① 数量・仕様等の設計図書の変更が必要な場合は、その旨、発注者と協議を行い、発注者の書面による指示に従い業務を実施する(独自の判断で実施しない)。


3 設計変更の具体例

(1) 設計図書に誤りや脱漏がある場合の例(契約書第 18 条第 1 項(2))

受注者は設計図書が誤っていると思われる点を発見した場合、発注者に確認すべきであり、それが誤っている場合には設計図書を訂正する必要がある。

【具体例】

- ① 条件明示する必要があるにも係わらず、設計条件に関する条件明示がない場合
- ② 条件明示する必要があるにも係わらず、現地条件に関する条件明示がない場合
- ③ 貸与資料を確認したところ、設計数量に誤りがあった場合

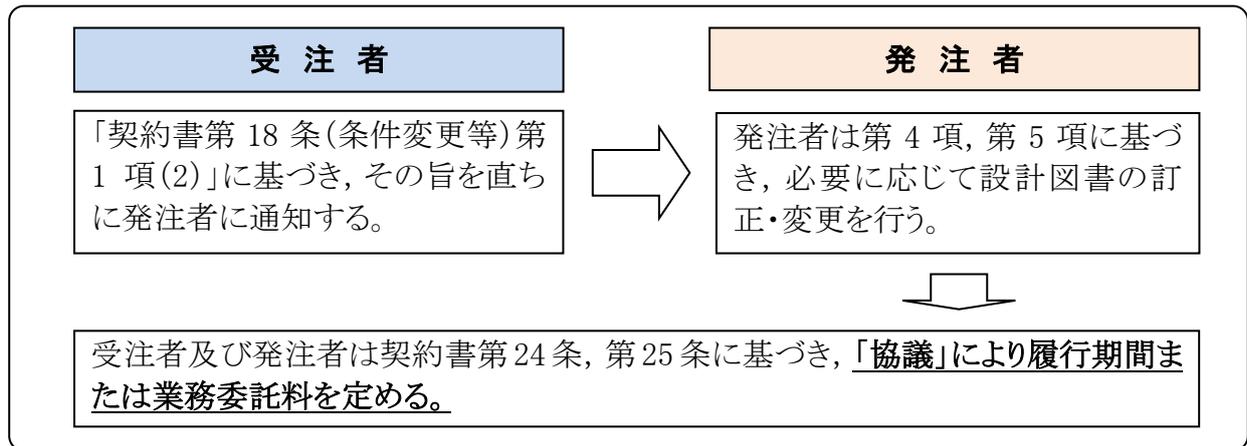


(2) 設計図書の表示が明確でない場合の例(契約書第 18 条第 1 項(3))

設計図書の表示が明確でない場合とは、表示が不十分、不正確、不明確で実際の業務の遂行にあたって、どのように設計して良いか判断がつかない場合などのことである。

【具体例】

- ① 検討数量が一式計上となっており、検討項目や設計条件、数量が不明確な場合
- ② 打合せ協議は明示されているが、回数等が不明確な場合
- ③ 同時進行の調査結果を用いて検討することは明記されているが、貸与期間が明記されていない。
- ④ 既設計で実施されているはずの座標値が、設計図に未記入だった場合
- ⑤ 関連する他の業務との業務範囲が明確でない場合

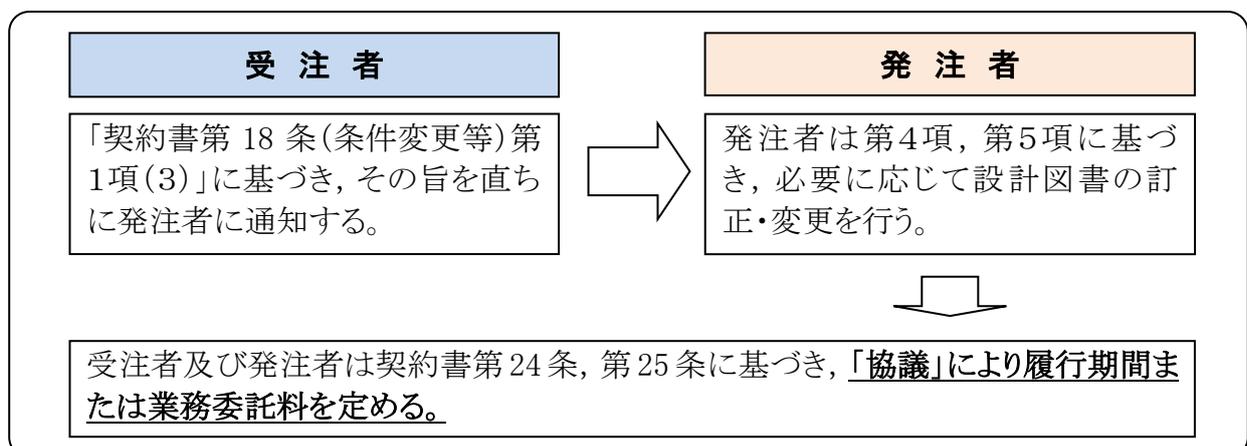


**(3) 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する場合の例
(契約書第 18 条第 1 項(4))**

自然的な履行条件の例としては、設計する構造物の範囲の地形、水深等、また、人為的な履行条件の例としては、現地踏査を実施する場合の立入条件、適用基準等があげられる。


【具体例】

- ① 地形条件(川幅、地表形状など)が現地と一致しない場合
- ② 水深・地下水位などが現地と一致しない場合
- ③ 地質調査における支持層の深さが、実際と一致しない場合
- ④ 業務履行中に業務対象範囲が災害で被災し、契約時の業務内容での履行が困難となった場合
- ⑤ 現地調査のための立ち入り条件が、実際と一致しない場合
- ⑥ 関係機関との行政手続きが完了せず、業務の続行が困難となった場合
- ⑦ 関連する他の業務等の進捗が遅れ、業務の続行が困難となった場合
- ⑧ 関係機関協議により、設計が変更となった場合
- ⑨ その他、新たな制約等が発生した場合

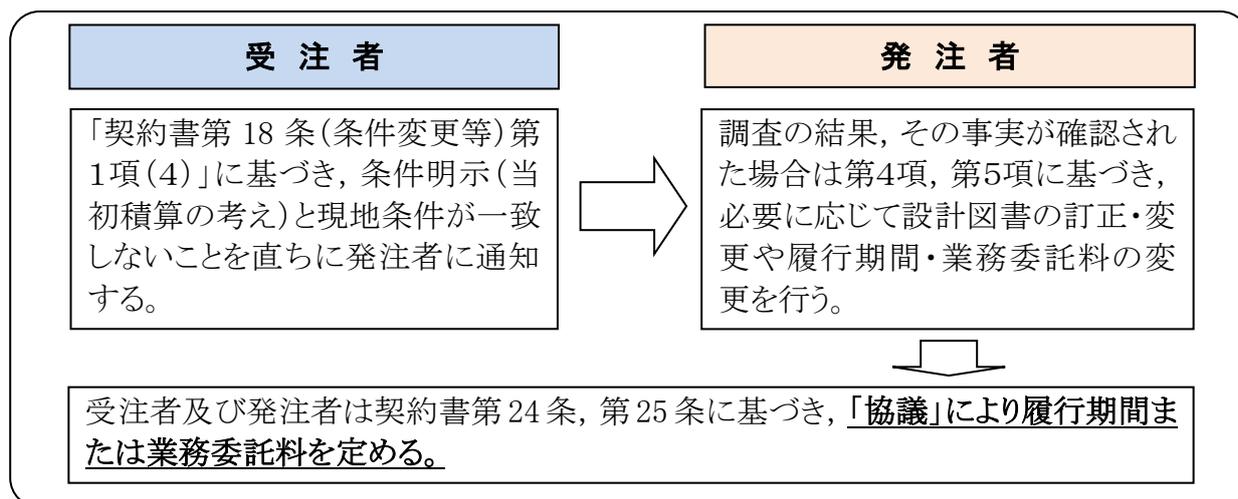

(4) 発注者が必要であると認め、設計図書の内容を変更する場合の例(契約書第 19 条)

- ① 設計図書に明示された条件について、検討範囲や数量を変更する場合
- ② 設計図書に明示された検討業務等について、業務内容や業務遂行条件が大幅に変更になる場合(契約後に判明した条件変更等により、やむを得ず検討業務の入れ替えを行う場合など)
- ③ 設計図書に明示されていない検討業務や要求する成果等を追加する場合

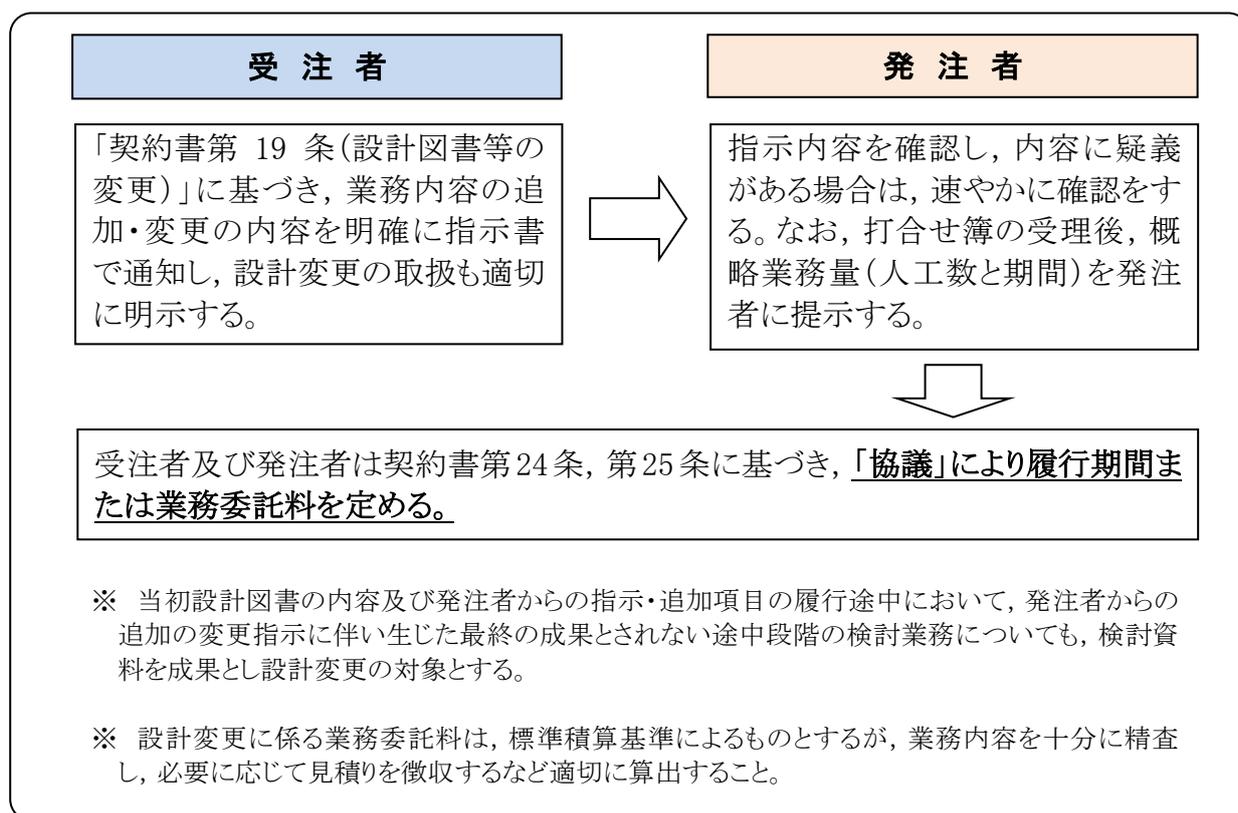

(5) 業務中止の場合の例(契約書第 20 条第 1 項)


受注者の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められる場合の手続

【具体例】

- ① 第三者の土地への立入りが承諾されないために業務が行えない場合
- ② 埋蔵文化財の調査及び処理を行う必要が生じた場合
- ③ 反対運動等の妨害活動があった場合
- ④ 豪雨、地震、火災等により地形等の物理的な変動が生じた、または受注者側若しくは発注者側が非常体制を取らざるを得ない状況が発生し、業務の続行が不適当または不可能となった場合
- ⑤ 環境問題や地元要望等の発生により、業務の続行が不適当または不可能となった場合
- ⑥ 妨害活動を行う者による作業現場の占拠及び著しい威嚇行為があった場合
- ⑦ 第三者及びその財産、受注者、使用人等ならびに調査職員の安全確保のため必要と認めた場合

※ 単に暴風等の受注者に帰責事由のない自然的又は人為的な事象が生じただけでは不十分であり、現に業務ができないと認められる状態にまで達していることが必要である。

※ 発注者の技術基準の改正や関連協議に伴い業務内容の見直しが行われる場合もあり、契約書第 20 条第 2 項の規定により発注者が必要と認めるときは一時中止を行うことができる。

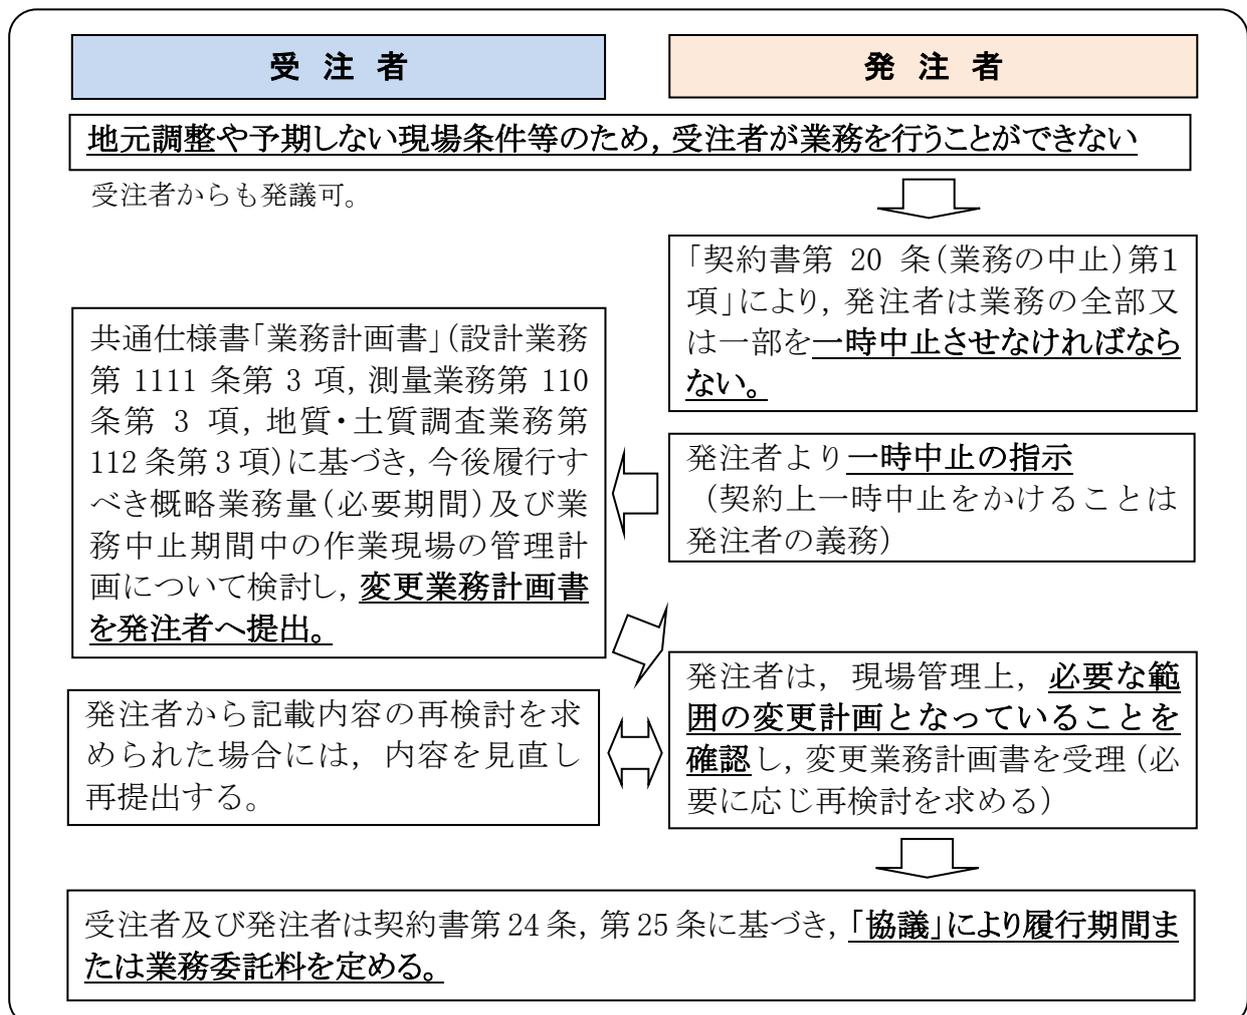


(6) 受注者の請求による履行期間の延長の場合の例(契約書第 22 条)

受注者の責めに帰すことができない事由により、履行期間内に業務を完了できない場合があげられる。

【具体例】

- ① 関係機関との協議が未了または協議遅延により方針の決定が遅れたことにより履行期間に影響を与えた場合
- ② 第三者の土地への立入り許可に時間を要した場合
- ③ 他関連業務の遅れなどにより履行期間に影響を与えた場合
- ④ 既往成果(設計や調査データ等)に不備があり、発注者による見直しにより業務開始までに時間をした場合
- ⑤ 天災等により業務の履行に支障が生じた場合

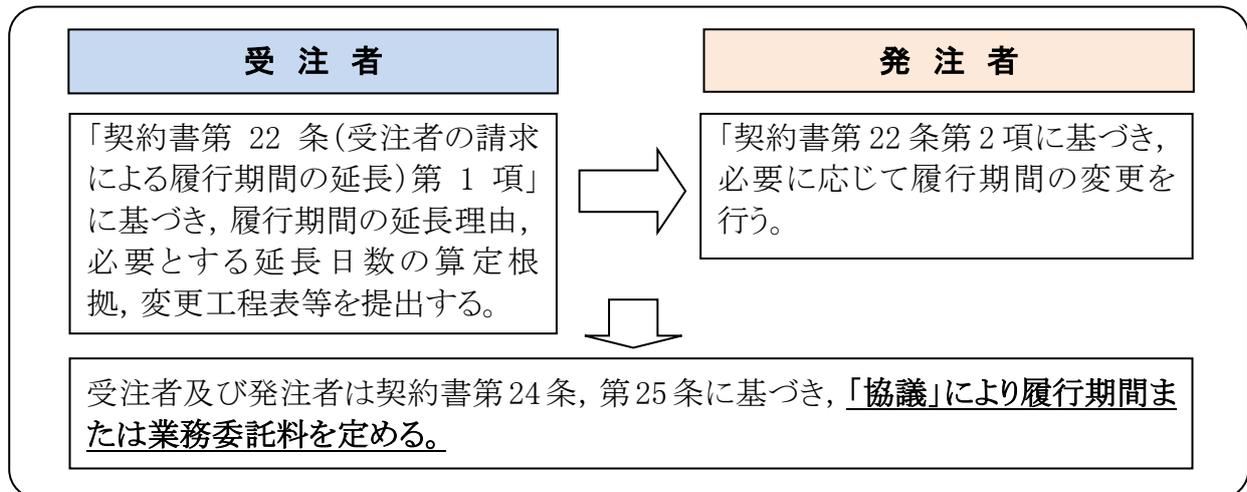


(7) 発注者の請求による履行期間の短縮の場合の例(契約書第 23 条)

発注者は、特別な理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。


【具体例】

- ① 何らかの理由により一部業務の取りやめが必要となり、必要最低限の履行期間に見直す必要がある場合
- ② 早期に工事を発注する必要が生じ、当初履行期限よりも前倒しで成果品が必要となった場合

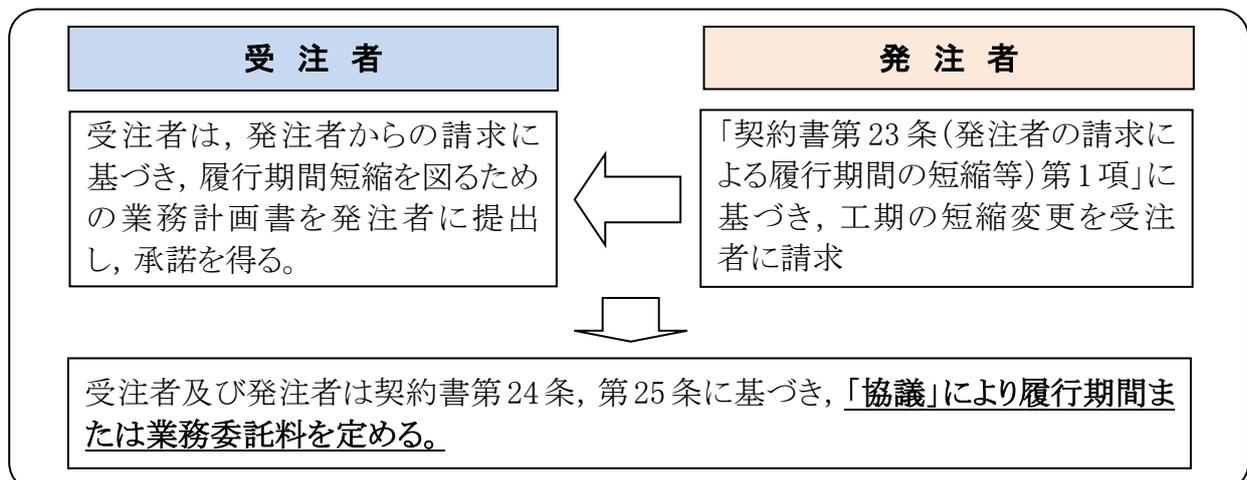



4 設計変更手続きフロー

(1) 設計変更の手続き(全般)

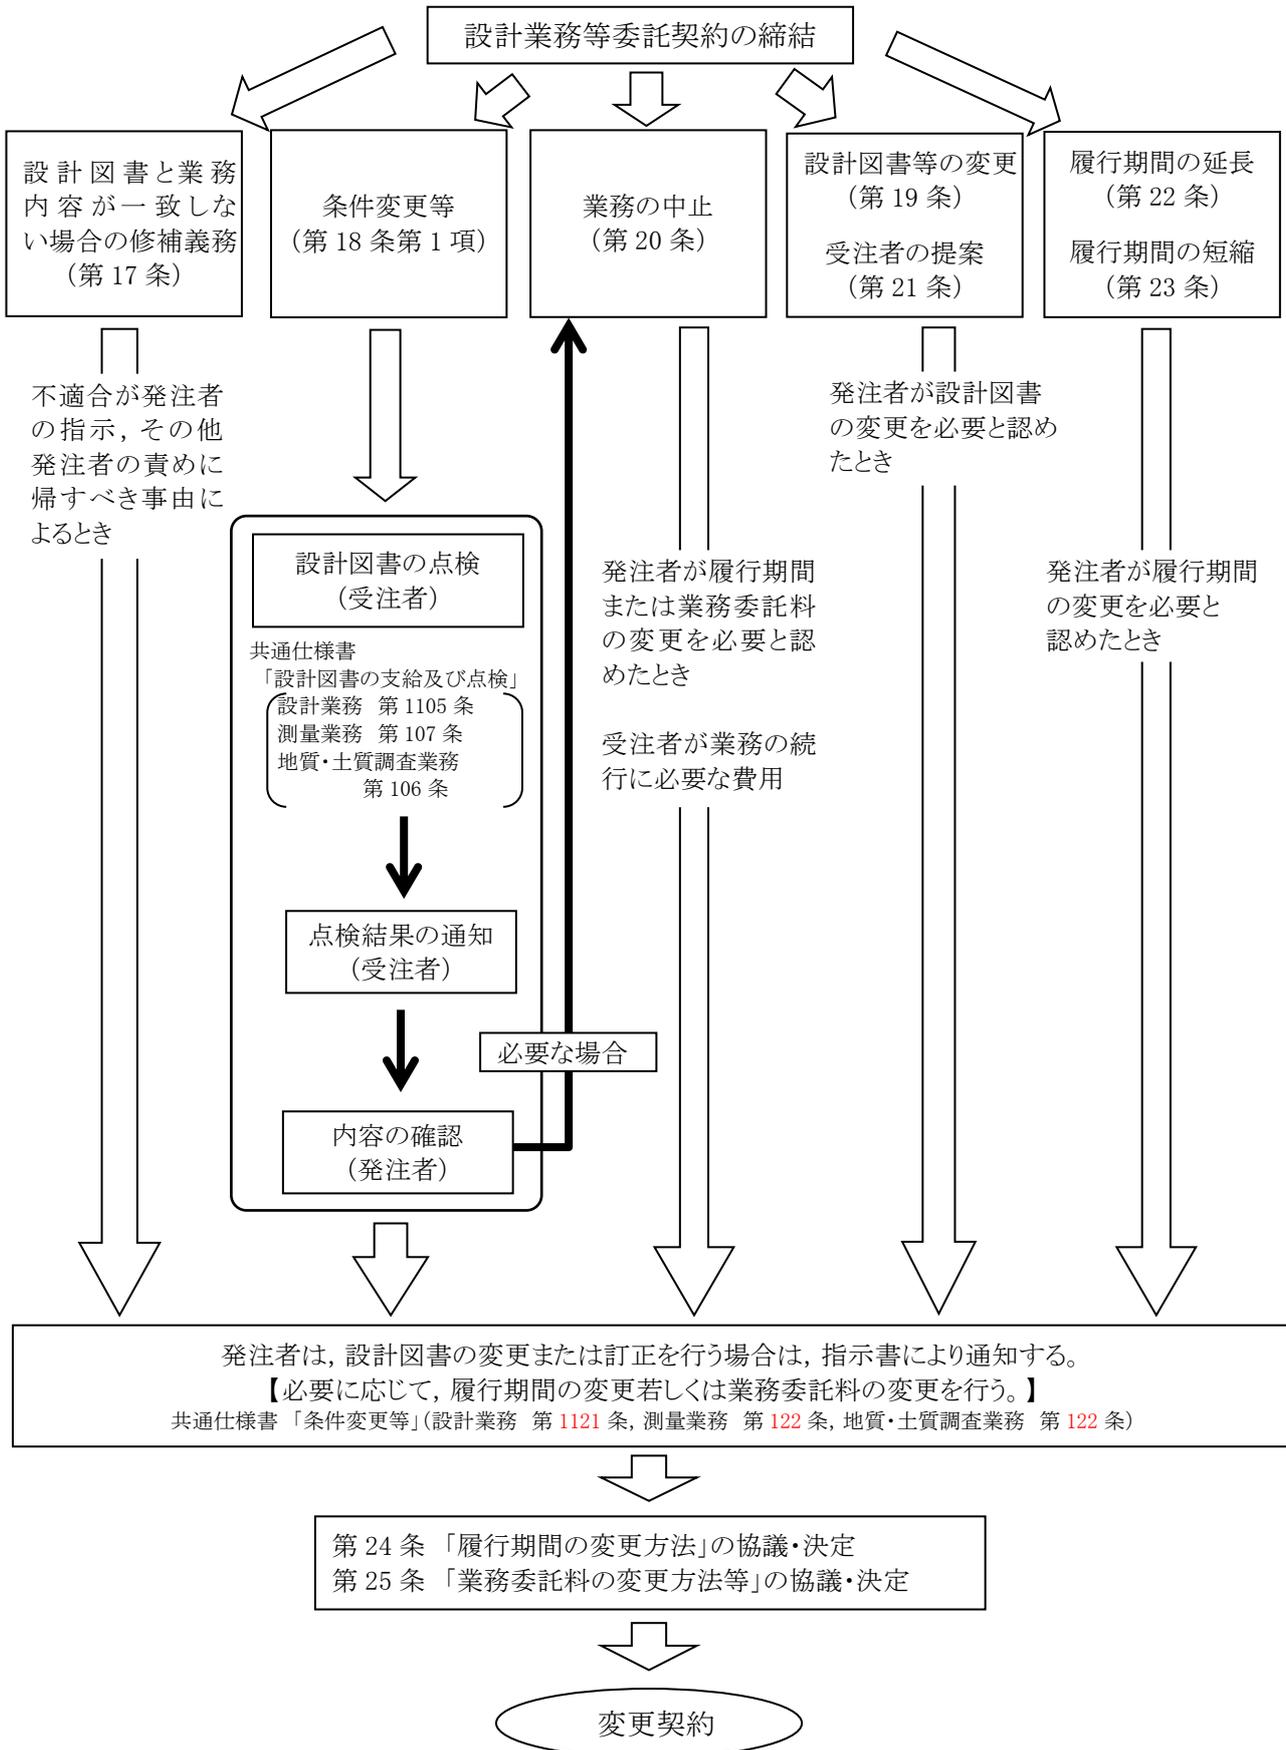


(2) 契約書第18条(条件変更等)関係の手続き

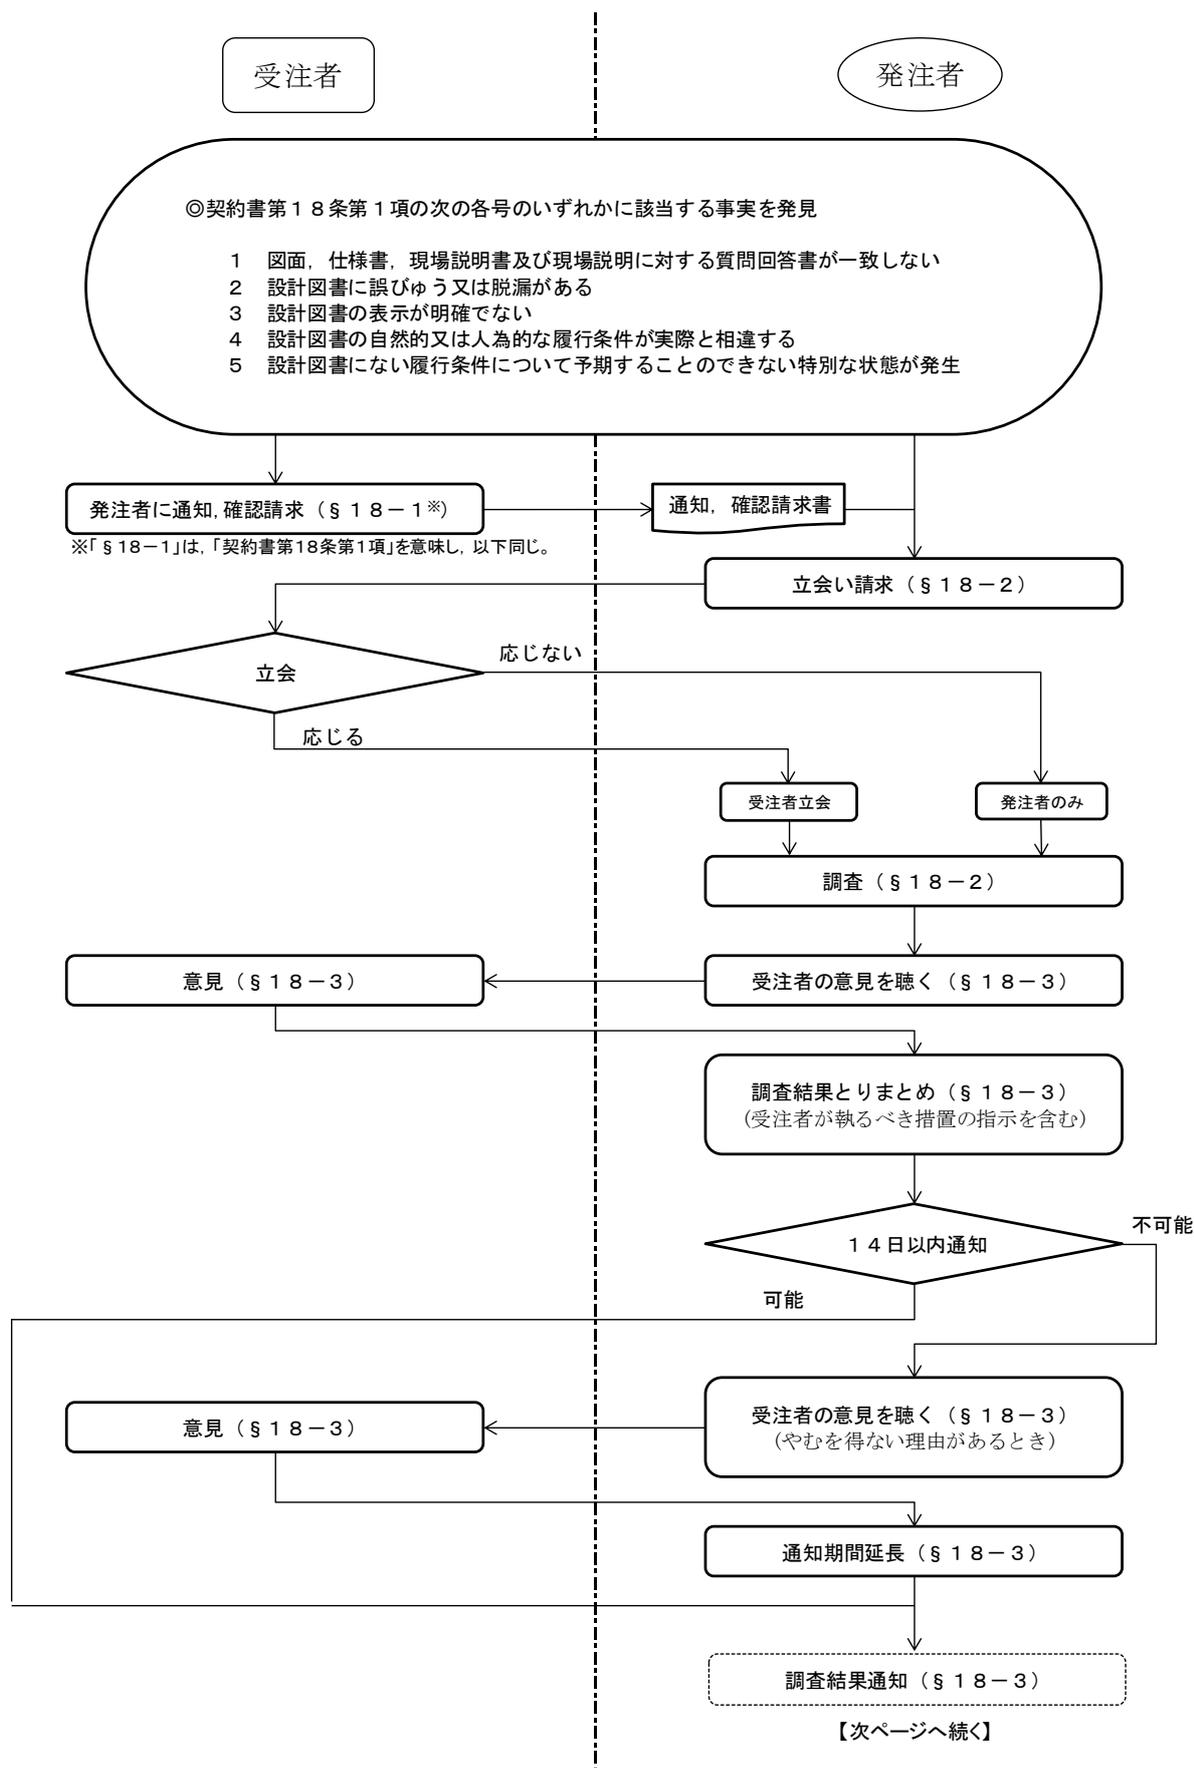


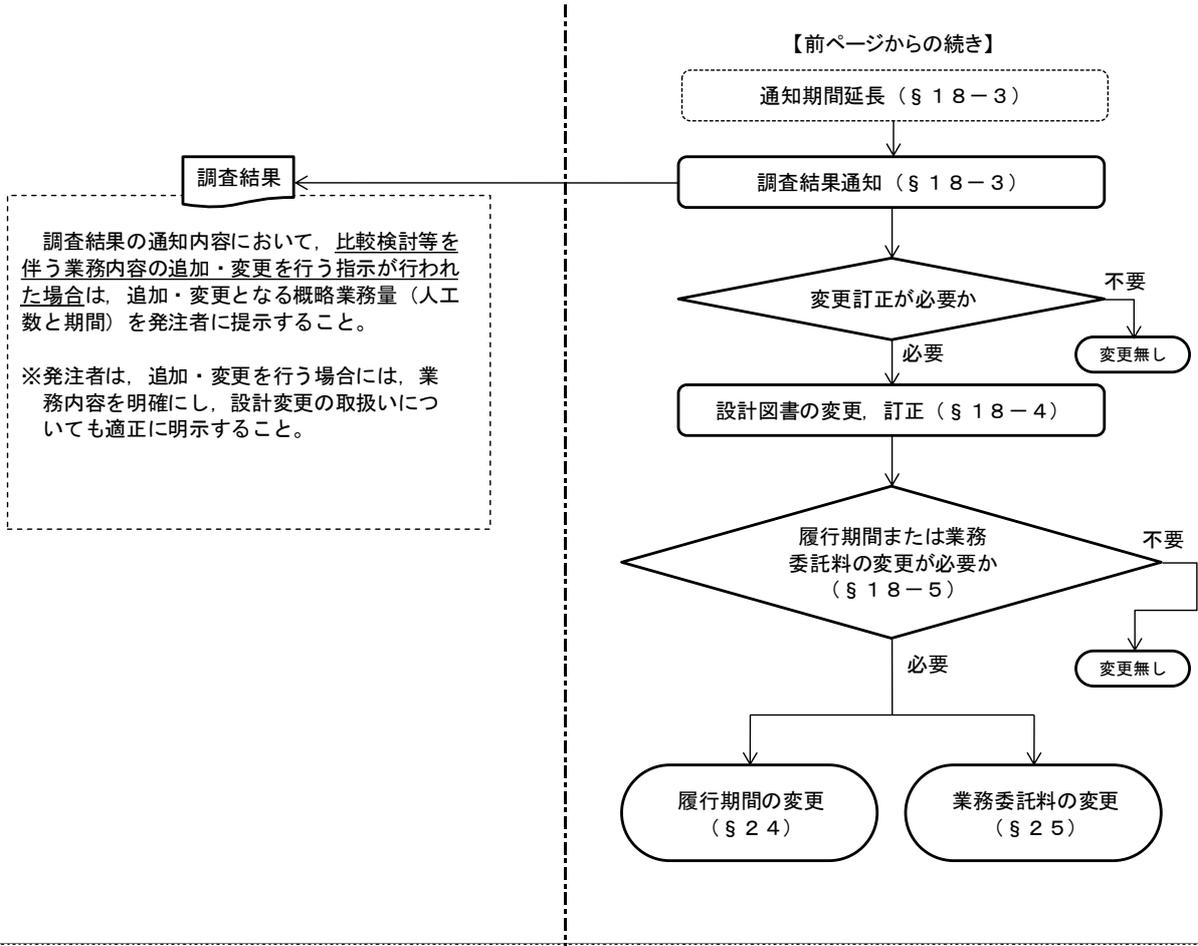


【設計図書の訂正又は変更（ § 18-4 ）により受注者に損害があった場合】

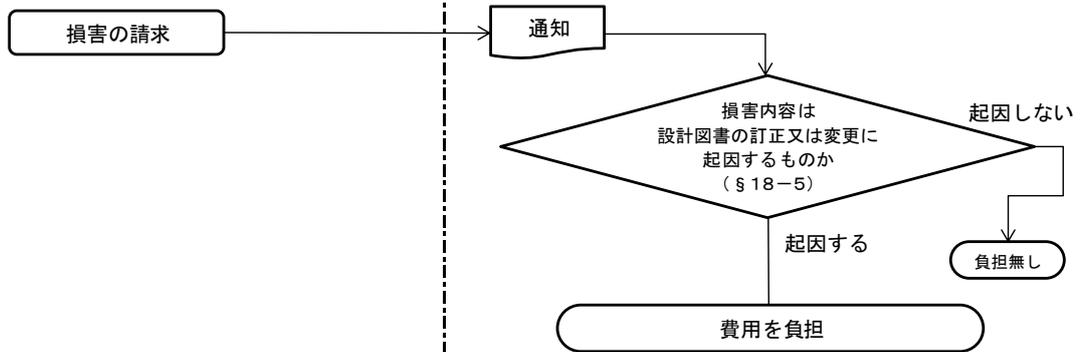

(3) 契約書第19条(設計図書等の変更)関係の手続き

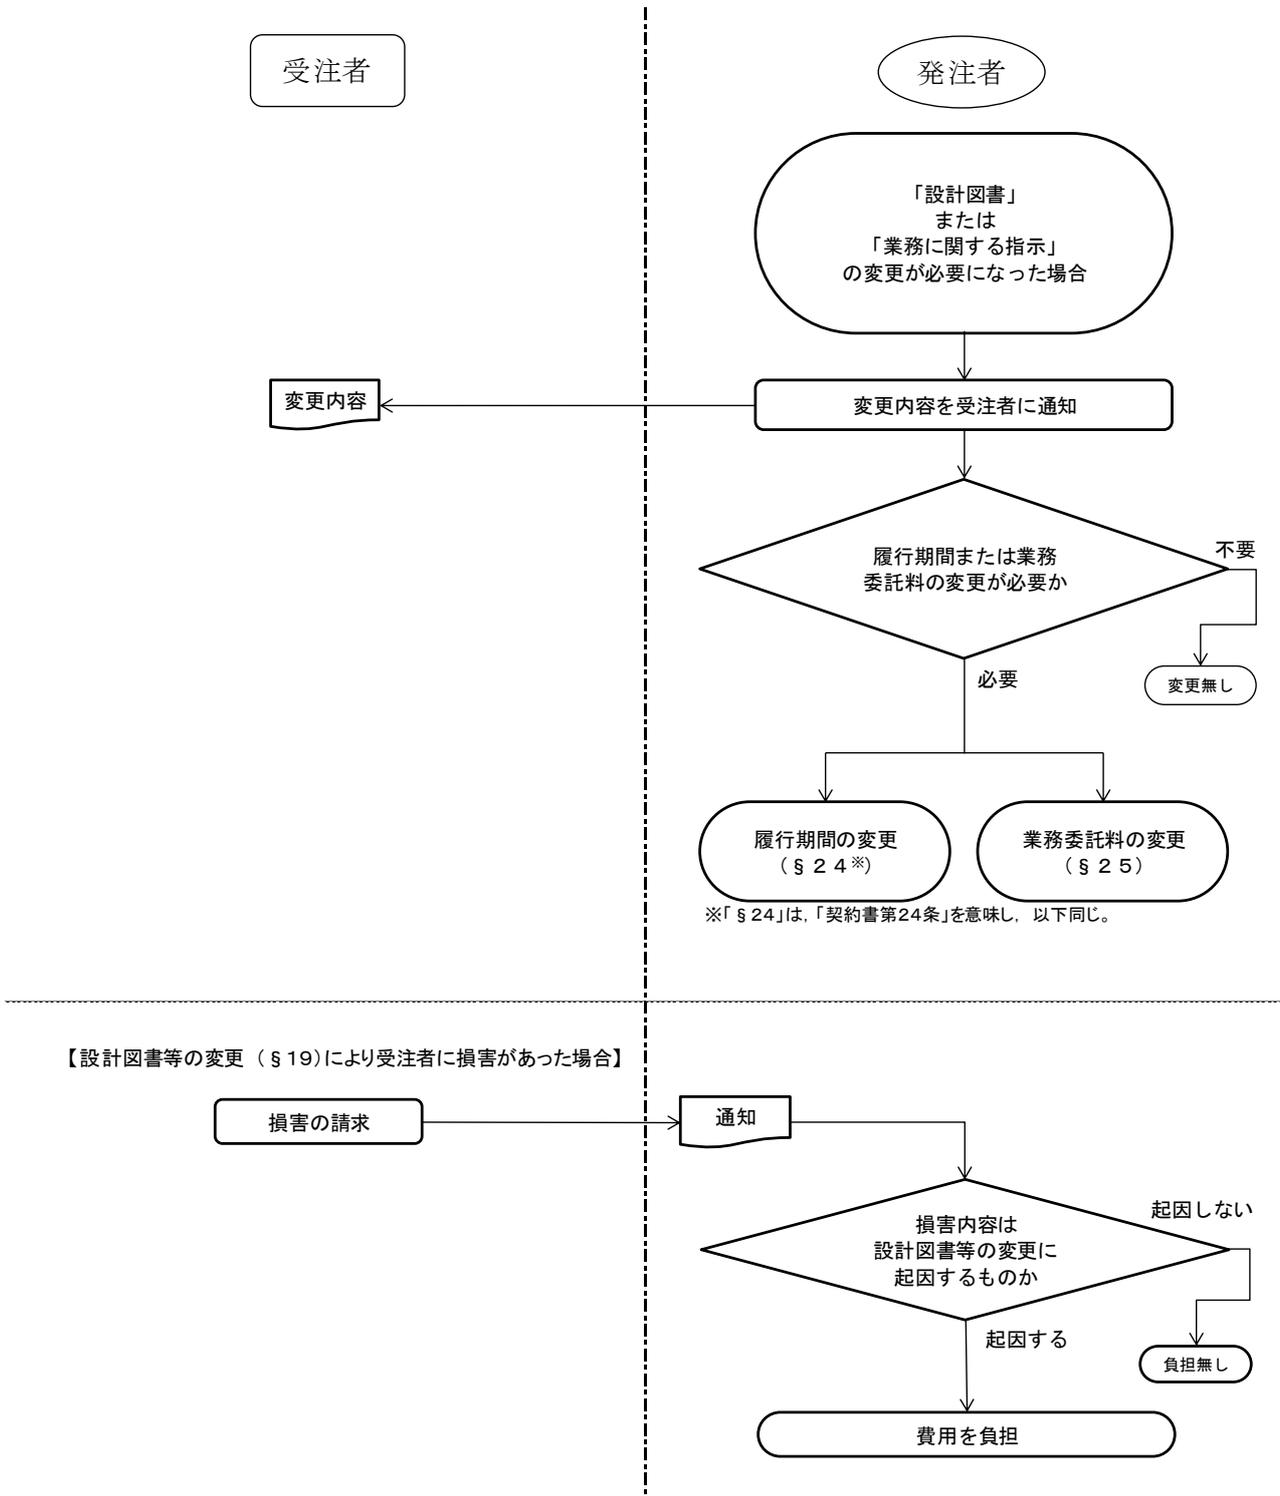

(4) 契約書第20条(業務の中止)関係の手続き

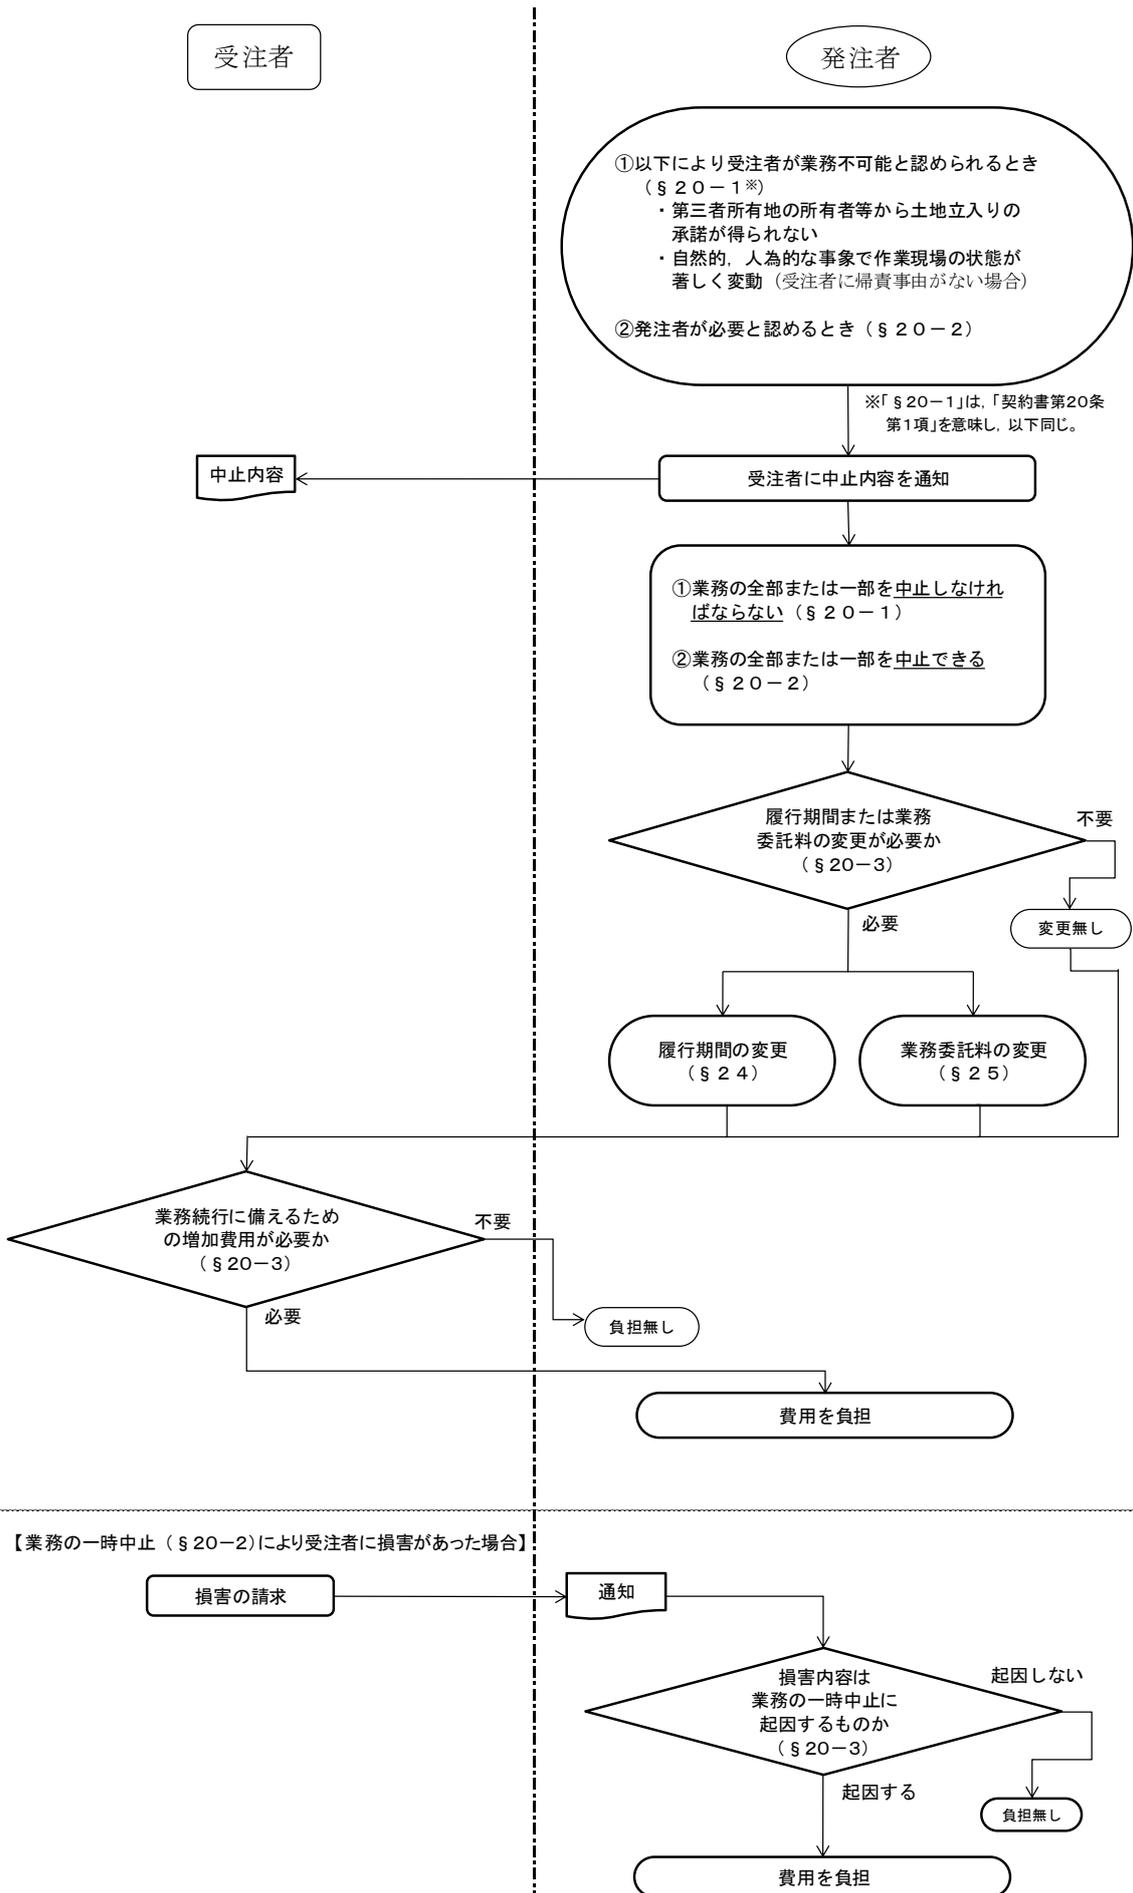

5 その他関連事項

(1) 「設計図書の点検」の範囲

受注者が行なうべき「設計図書の点検」の範囲は、以下が想定される。

◆設計図書の内容に係る整合性がとられているかどうかの確認

- ① 数量計算書と仕様書の内容の整合確認。
- ② 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書の内容の整合確認

◆設計図書記載の履行条件と実際の作業現場の履行条件の一致・不一致の確認

- ① 適用すべき諸基準と整合した業務内容となっているかどうか
- ② 設計図書と現地が整合しているか
- ③ 既存業務の成果、適用すべき諸基準の取違いの不備はないか
- ④ 既存業務の調査結果等が適切か、調査不足は生じていないか
- ⑤ 業務条件確定のための関係機関協議は実施済みか、もしくは実施済み内容が明示されているか

(2) 「設計図書の点検」の範囲をこえるもの

「設計図書の点検」の範囲をこえるものとしては、以下が想定され、このような場合は、発注者とその費用を負担する。

なお、受注者は照査の範囲を超える事象と判断した場合、その対応について発注者と協議する必要がある。

- ① 応力計算を伴う既存成果の照査
- ② 関係機関協議結果と既存成果の照査
- ③ 設計計算と図面(配筋詳細など)の照査

(3) 既存設計等の誤りに関する取扱い

設計図書の点検において、既存業務の成果品に誤り等があることが発見された場合、受注者は速やかにその事実を発注者に報告しなければならない。

上記報告を受けた場合に発注者は、既存業務の受注者に対して成果品の欠陥及びその原因について調査を指示し、事実関係の確認を行うものとする。

その結果、誤りが先発受注者の責めにある場合は、契約図書に基づく『瑕疵担保』請求を求めるものとし、速やかに修正させ、修正後の成果品を後発受注者へ提示することとする。

なお、誤りの原因が発注者の責めによる場合は、その費用は発注者が負担するものとする。
また、その場合の修正を、先発・後発どちらの受注者に行わせるかは、修正の内容及び効率的な業務の推進等を考慮のうえ、適切に判断するものとし、責任の所在を明確にしないまま、費用負担も行わずに、安易に後発業務の受注者に修正を行わせることは、厳に慎まなければならない。

(4) 指定・任意の正しい運用

指定・任意については、設計業務等委託契約書第1条第4項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。

◆基本事項

- ① 「指定」とは、設計図書のとおり作業を行うもの。
- ② 「任意」とは、業務を完了するために必要な一切の手段を受注者の責任において選択し作業を行うもの。
- ③ 発注者は、指定・任意にかかわらず、当初明示した条件が変更となった場合には、設計変更を行う。

◆留意事項

- ① 発注にあたっては、履行条件明示をできるだけ明確に行い、設計変更に対応できるようにすることが必要である。
- ② 発注者(調査職員)は、任意の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要である。

【任意における下記のような対応は不適切】

- ・ 調査業務等において、条件明示に具体的な手法を指定していないのに、〇〇で積算しているので、「〇〇以外での調査は不可」との対応。(現地作業に係るもの)
- ・ 新たな手法(解析・分析方法や構造計算プログラム)等の活用について受注者から提案があった場合に、「積算上の手法で実施」するよう対応。(机上作業に係るもの)

◆指定と任意の考え方

	指 定	任 意
設計図書 (履行方法等の条件)	履行方法等について具体的に指定	履行方法等について具体的には指定しない。
履行方法の変更	発注者の指示または承諾が必要	受注者の任意で変更可能 (業務計画書の修正, 提出等は必要)
履行方法の変更がある場合の設計変更	設計変更の対象とする	設計変更の対象としない
当初明示した条件の変更に対応した設計変更	設計変更の対象とする	設計変更の対象としない

6 参考資料

(1) 設計等業務委託契約書抜粋

第1条(総則)

- 1 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書(以下「契約書等」という。))を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
- 4 受注者は、契約書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議を行った場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

第2条(指示等及び協議の書面主義)

- 1 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
- 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

第9条(調査職員)

- 2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
 - (1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
 - (2) 契約書等に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
 - (3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
 - (4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査

第17条(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)

- 1 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要に応じ、履行期間又は業務委託料を変更するとともに、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

第18条(条件変更等)

- 1 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
 - (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
 - (2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
 - (3) 設計図書の表示が明確でないこと。

- (4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
- (5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
- 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
- 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
- 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
- 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更し、及び受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

第 19 条(設計図書等の変更)

- 1 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し、及び受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

第 20 条(業務の中止)

- 1 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
- 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
- 3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し、及び受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

第 21 条(業務に係る受注者の提案)

- 1 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
- 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。

- 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

第 22 条(受注者の請求による履行期間の延長)

- 1 受注者は、その責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
- 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

第 23 条(発注者の請求による履行期間の短縮等)

- 1 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
- 2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
- 3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、及び受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

第 24 条(履行期間の変更方法)

- 1 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
- 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

第 25 条(業務委託料の変更方法等)

- 1 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
- 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
- 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

第 26 条(臨機の措置)

- 1 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

- 2 前項の場合においては、受注者は、その執った措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
- 3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
- 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。

(2) 共通仕様書抜粋【設計業務】

第1編共通編

第1章総則

第1105条 設計図書の支給及び点検

※測量業務 第107条, 地質・土質調査業務 第106条

1. 受注者からの要求があった場合で、調査職員が必要と認めるときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2. 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、調査職員に書面により報告し、その指示を受けなければならない。
3. 調査職員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面または詳細図面等を追加支給するものとする。

第1121条 条件変更等

※測量業務 第122条, 地質・土質調査業務 第122条

1. 契約書第18条第1項第5号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書第29条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
2. 調査職員が、受注者に対して契約書第18条、第19条及び第21条の規定に基づく設計図書の変更または訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。

第1122条 契約変更

※測量業務 第123条, 地質・土質調査業務 第123条

1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うものとする。
 - (1) 業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合
 - (2) 履行期間の変更を行う場合
 - (3) 調査職員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合
 - (4) 契約書第30条の規定に基づき委託料の変更で代える設計図書の変更を行った場合
2. 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
 - (1) 第1121条(測量業務 第122号, 地質・土質調査 第122条)の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項
 - (2) 設計業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
 - (3) その他発注者または調査職員と受注者との協議で決定された事項

第 1123 条 履行期間の変更

※測量業務 第 124 条, 地質・土質調査業務 第 124 条

1. 発注者は、受注者に対して設計業務等の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2. 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び設計業務等の一時中止を指示した事項であっても残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
3. 受注者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
4. 契約書第23条に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。

第 1124 条 一時中止

※測量業務 第 125 条, 地質・土質調査業務 第 125 条

1. 契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部または一部を一時中止させるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象(以下「天災等」という。)による設計業務等の中断については、第1133条(測量業務 第134条, 地質・土質調査 第134条)臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
 - (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合
 - (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不相当と認めた場合
 - (3) 環境問題等の発生により設計業務等の続行が不相当または不可能となった場合
 - (4) 天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合
 - (5) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに調査職員の安全確保のため必要があると認めた場合
 - (6) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
2. 発注者は、受注者が契約図書に違反し、または調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部または一部の一時中止をさせることができるものとする。
3. 前2項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、調査職員の指示に従わなければならない。

第1133条 臨機の措置

※測量業務 第134条, 地質・土質調査 第134条

1. 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに調査職員に報告しなければならない。
2. 調査職員は、天災等に伴い成果物の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
