

宮城県内の災害復旧・復興の概要

◆ 復旧・復興の概要

- 東日本大震災に係る津波による災害に対処し、早期営農再開を図るため、国は、東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年五月二日法律第四十三号)を施行し、農林水産省が直轄で7地区(海岸代行業業を含む)10事業を行うことになりました。
- 宮城県は県内の被災市町及び土地改良区からの要請を踏まえて計2449件の災害査定を受け、1,160億円の復旧事業費が決定しました。
- さらに、宮城県は被災市町からの要請を踏まえ、東日本大震災復興交付金(農山漁村地域復興基盤総合整備事業)(以下「復興交付金事業」という)を活用し、まちづくりと調整しつつ、公共用地の創設や防災集団移転跡地の再編など土地利用の整序化とともに、大区画ほ場整備を中心とした農地の抜本的な再編整備を実施する予定です。(現時点では、津波による被害が著しい未整備の農地を中心として、約4,000haで調査・法手続実施中。)

(参考1) 宮城県内の国直轄事業の概要

地区名	受益面積 (ha)	総事業費 (百万円)	備考
直轄災害復旧事業			
迫川上流	2,162	209	施設
河南	4,950	535	施設
直轄特定災害復旧事業			
定川	635	3,250	施設
名取川	3,226	12,760	施設
亙理山元	4,509	11,204	施設
仙台東	2,362	19,671	施設
〃	1,638	11,650	農用地
〃	1,393	677	除塩
直轄災害復旧関連事業			
仙台東	1,982	18,700	関連区画
特定災害復旧事業			
亙理・山元農地海岸	-	14,558	農地海岸
合計		93,215	

(参考2) 宮城県内の農地・農業用施設に関する災害査定結果の概要

区分	査定決定	
	件数	金額 (百万円)
県営	1,725	106,406
団体営	724	9,599
計	2,449	116,005

◆ 復興の工程と進捗状況


- 宮城県が平成25年2月8日に発表した災害復旧・復興のロードマップでは、基本的に平成25年度までに、復旧可能な農地の整備、農業用施設の復旧を終える予定ですが、他機関との調整が必要な区画や施設については、平成26年度から平成27年度に実施します。また、農地海岸や復興交付金事業など、まちづくりと関係する箇所についても5年間での完成を目指していきます。
- 農地の復旧対策が必要な面積は13,000haであり、平成25年9月時点で11,105haが復旧工事に着手できました。なお、平成25年9月時点では累計8,136haが完了しています。
- また、震災による津波で被害を受けた農業用施設(排水機場)は47施設で、現時点で、そのうち37施設で着手しています。なお、応急復旧により、従前と比較し、約9割の排水能力を回復しています。

(参考3) 災害復旧・復興のロードマップ

工種	平成23年度(※1)	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考
農地(除塩含む)						
面積: 13,000ha(※2)	5,780ha	4,800ha	1,270ha	990ha	160ha	土地: 法務省計画 排水機場: 国土交通省計画
進捗率(%)	44%	81%	91%	99%	100%	事業浸水面積は 14,300ha
農業用施設						
排水機場: 47施設(※3)	4施設	26施設	16施設	1施設		
進捗率(%)	5%	63%	97%	100%		
農地海岸						
農地海岸: 94海岸(※4)	5箇所	31箇所	29箇所	23箇所	6箇所	
進捗率(%)	5%	38%	69%	94%	100%	
農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興交付金事業)による農地整備(土地利用の整序化含む)						
面積: 約4,300ha(※5)						
・土地改良						
・法手続						
・工事						
・農地						
面積: 約4,300ha	0ha	0ha	800ha	1,570ha	1,930ha	
進捗率(%)	0%	0%	19%	55%	100%	

※1 平成23年度は実績で表記。
 ※2 農地復旧面積には、国が仙台市において直轄特定災害復旧事業で実施するもの及び自力復旧、他省庁事業による復旧、復興事業等による転用などの面積を含む。
 ※3 受益面積が10ha以上の県が復旧する排水機場(国が事業主体として復旧する15機場を除く。)
 ※4 県が復旧する農地海岸(国が特定災害復旧等海岸工事で復旧する亙理・山元農地海岸地区の3地区を除く。)
 ※5 農地復旧面積の13,000haのうち、津波被災が著しい未整備の農地を中心として復興交付金を活用して県が実施するものであり、農地整備面積には現在調査中の地域も含まれ、変更の可能性がある。また、このほか、国が仙台市において直轄農用地災害復旧関連区画整理事業で約2,000haを実施予定。

(参考4) 主な事業の進捗状況

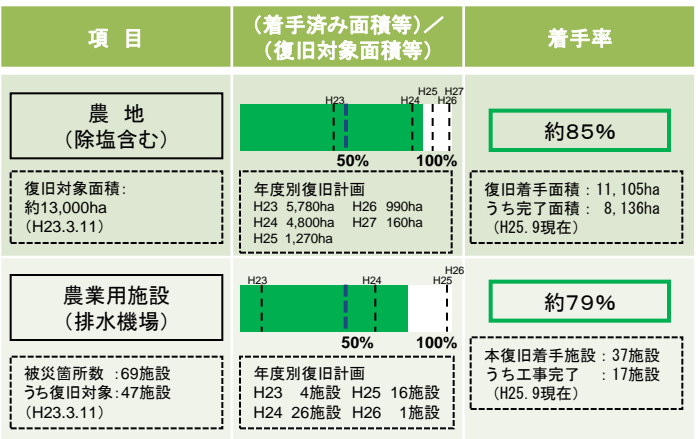

※その他宮城県の復興の進捗状況は、下記のHPアドレスに掲載されています。
<http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/shintyoku.html>
